




РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - REPUBLIKA E MAqedonisë së VERIUT
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
NDËRMARRJA PUBLIKE PËR RRUGË SHITËTORE

Бр.-Нр. 01-6355/1
07-06-2024 20 / год.-viti
СКОПЈЕ - SHKUP



ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

за 2023 година

Скопје, мај 2024

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" број 38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и "Службен весник на Република Северна Македонија" бр.275/19, 89/22 и 274/22), ЈП за државни патишта доставува годишен Извештај за своето работење за претходната година до Владата на Република Северна Македонија

СОДРЖИНА:

I.	ВОВЕД.....	4
II.	ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ НА ЈПДП.....	6
III.	ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЈПДП.....	19
IV.	ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА.....	25
V.	ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ	26
VI.	ИНВЕСТИЦИИ	52
VII.	ЈАВНИ НАБАВКИ.....	81

I. ВОВЕД

Јавното Претпријатие за државни патишта (во натамошниот текст: ЈПДП) е основано на 03.01.2013 со Одлука за основање број 41-10147/1 од 28.12.2012 донесена од Владата на Република Македонија, објавена во Службен Весник на РМ бр.1 од 02.01.2013 година. Претпријатието е запишано во Централен Регистар на РМ со ЕМБС 6839673 и е правен следбеник на Агенцијата за државни патишта Скопје.

Основна цел и дејност на ЈП за државни патишта е планирање, изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на патиштата и управување со државните патишта. Со тоа ЈП за државни патишта останува двигател на патната инфраструктура во Република Северна Македонија.

Надлежности на ЈПДП се:

1. Управување со државните патишта;
2. Постојано следење и контролирање на состојбите на државните патишта;
3. Преземање мерки за рационално користење на средствата наменети за државните патишта;
4. Вршење инвестициски работи од областа на државните патишта;
5. Наплата на надоместоците за користење на јавните патишта;
6. Задолжувања кај домашни и странски финансиски институции;
7. Организирање на изработка на студии и проекти за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување, заштита и наплата на патарина со право нив да ги отстапува на физички и правни лица во согласност со закон;

8. Давање на вршење работи за изградба, реконструкција, рехабилитација и одржување на државните патишта на правни лица во согласност со Закон;
9. Предлагање одлука за започнување на постапка за давање концесија и/или други видови на јавно – приватно партнерство;
10. Издавање одобренија, одобрувања и мислења во согласност со Законот за јавните патишта;
11. Организирање активности што се поврзани со вршење на броење на сообраќај, заштита на државните патишта, катастар на државните патишта и формирање на неопходни бази на податоци;
12. Применување и користење на систем за управување со одржувањето на коловозите (PMS) и систем на управување со одржувањето на мостовите (BMS);
13. Поддршка за изградба, реконструкција и рехабилитација на патишта кои не се државни патишта, врз основа на обврски произлезени од закон.

Извештајот за работењето го опфаќа целокупното работење на Јавното претпријатие за државни патишта за 2023 година, работењето на органите на управување на ЈПДП, работењето на внатрешната ревизија, остварените финансиски резултати за 2023 година, инвестициите во проекти во патната инфраструктура во 2023 година и реализацијата на годишната програма за 2023 година, како и Јавните набавки остварени во 2023 година, во согласност со надлежностите на Јавното претпријатие за државни патишта утврдени во Законот за јавни патишта и Статутот на ЈП за државни патишта.

Согласно Законот за јавни патишта, Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2023 година, е донесена од Управниот Одбор на ЈПДП и за неа е добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија.

II. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ НА ЈПДП:

Органи на управување на Јавното претпријатие за државни патишта се:

- Управен одбор,
- Надзорен одбор за контрола на материјално – финансиско работење,
- Директор

1. РАБОТА НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Во текот на 2023 година беа одржани 24 седница на Управен одбор.

- Донесување на Годишниот План за јавни набавки за 2023 година на Јавното претпријатие за државни патишта.
- Донесување на Програмата за одржување и заштита на државните патишта за 2023 година со ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта.
- Донесување на Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за државни патишта за 2023 година.
- Донесување на Одлука за висината на благајничкиот максимум за 2023 година.
- Донесување на Спогодба за продолжување на важноста на Колективниот договор на ЈПДП со Синдикатот на ЈПДП.
- Донесување на Правилник за реализирање на службени патувања во ЈПДП.

- Донесување на Одлука за избор на Претседател на Управен одбор на ЈПДП.
- Донесување на Одлука за избор на заменик Претседател на Управен одбор на ЈПДП.
- Донесување на Правилник за изменување на Правилникот за внатрешна организација на ЈПДП.
- Донесување на Одлука за давање согласност на Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈПДП.
- Усвојување на Извештајот за извршениот попис на основни средства и ситен инвентар на ЈПДП за 2022 година.
- Донесување на Одлука за отпис – расходување на основни средства за 2022 година.
- Донесување на Одлука за отпис – расходување на ситен инвентар за 2022 година.
- Усвојување на Извештајот за попис на состојбата на парични средства, побарувања, обврски и материјално работење на ЈП за државни патишта со состојба на ден 31.12.2022 година.
- Донесување на Одлука за донација на ЈП за стопанисување со државни шуми Национални шуми – Скопје, согласно заклучокот бр.6 од одржана 74 седница на Влада на РСМ на ден 25.8.2022 година (за проектот изградба на автопатот Кичево – Охрид).
- Донесување на Одлука по Барање од општина Арачиново бр.10-1921/1 од 27.2.2023 година.
- Донесување на Одлука по Приговор од инкасант Маја Ацковска бр.02-482/1 од 17.1.2023 година.

- Усвојување на Годишна сметка на Јавното претпријатие за државни патишта за 2022 година.
- Донесување на Одлука за употреба на средства остварени со работењето на ЈПДП за 2022 година.
- Разгледување на нов предлог текст на Правилник за дополнување на Правилникот за систематизација на работни места на ЈПДП и донесување на Одлука за давање согласност на истиот.
- Донесување на Одлука за усвојување и донесување на Правилник за плата и надоместоци од плата на вработените во Проектна единица за спроведување на проектот за изградба на инфраструктурниот Коридор 8 (делница Тетово – Гостивар – Букојчани и проектот за автопатот Требеништа – Струга – Кафасан) и Коридорот 10д (делница на автопат Прилеп – Битола) во РСМ.
- Донесување на Одлука за усвојување и донесување на Правилник за работа на Проектна единица за спроведување на проектот за изградба на инфраструктурниот Коридор 8 (делница Тетово – Гостивар – Букојчани и проектот за автопатот Требеништа – Струга – Кафасан) и Коридорот 10д (делница на автопат Прилеп – Битола) во РСМ.
- Донесување на Одлука за усвојување на Предлогот на Годишната Програма за финансирање на патна инфраструктура за 2023 година.
- Разгледување на Барање од заменик Директорот на ЈПДП бр.02-2975/1 од 29.3.2023 година и донесување на Решение за службено патување во странство.
- Донесување на Одлука за донација на ЈП за стопанисување со државни шуми Национални шуми – Скопје, согласно заклучокот бр.6 од одржана 74 седница на Влада на РСМ на ден 25.8.2022 година (за проектот изградба на автопатот Кичево – Охрид).

- Усвојување на Извештајот за финансиско работење на ЈПДП за четвртиот квартал за 2022 година.
- Усвојување на Извештајот за финансиско работење на ЈПДП за второ полугодие за 2022 година.
- Донесување на План за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2023 година на ЈПДП.
- Донесување на Одлука за усвојување на коригиран Финансиски план на ЈПДП за 2023 година бр.05-3740/1 од 20.4.2023 година.
- Донесување на Одлука за распределба на средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици за 2023 година.
- Донесување на Одлука за разрешување и именување на помошник записничар на Управен одбор.
- Донесување на Одлука по Барање од општина Липково бр.10-2792/1 од 23.3.2023 година.
- Донесување на Одлука по Барање од општина Чешка бр.10-2859/1 од 27.4.2023 година.
- Донесување на Одлука по Барање од општина Јегуновце бр.10-2940/1 од 28.4.2023 година.
- Донесување на Одлука за донација на ЈП за стопанисување со државни шуми Национални шуми – Скопје, согласно заклучокот бр.6 од одржана 74 седница на Влада на РСМ на ден 25.8.2022 година (за проектот изградба на експресен пат Ранковце – Крива Паланка).
- Донесување на Одлука за избор на Претседател на Управен одбор на ЈПДП.

- Донесување на План за изменување на Годишниот план за јавни набавки за 2023 година на ЈПДП.
- Усвојување на Извештајот од финансиското работење на претпријатието во првиот квартал од 2023 година.
- Усвојување на Извештајот за работењето на ЈПДП за 2022 година.
- Донесување на Одлука по Барање бр.02-4353/1 од 10.5.2023 година, од општина Кавадарци.
- Донесување на Одлука по Жалба бр.02-5325/2 од 15.6.2023 година, по јавен оглас бр.1/2023 за вработување на работно место Координатор на единица за техничка изведба на проектот од кандидатот Халими Неметула.
- Донесување на Одлука по Жалба бр.02-5318/2 од 15.6.2023 година, по јавен оглас бр.1/2023 за вработување на работно место Помошник на главниот и одговорен координатор на проектот од кандидатот Халими Неметула.
- Склучување на анекс кон менаџерски договор помеѓу Управен одбор и Директорот на ЈПДП.
- Склучување на анекс кон менаџерски договор помеѓу Управен одбор и заменик на Директорот на ЈПДП.
- Донесување на Одлука за исплата на регрес за годишен одмор за 2023 година.
- Донесување на Одлука за висината на надоместокот на членовите на Управен одбор.
- Донесување на Одлука за висината на надоместокот на членовите на Надзорен одбор за контрола на материјално финансво работење.
- Донесување на Програма за изменување и дополнување на Програмата за одржување и заштита на државните патишта за 2023 година.

- Донесување на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на ЈПДП.
- Донесување на предлог текстот на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места во ЈПДП и донесување на Одлука за давање согласност на истиот.
- Донесување на План за изменување и дополнување на годишниот план за јавни набавки за 2023 година на Јавно претпријатие за државни патишта.
- Донесување на Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за државни патишта за 2023 година.
- Склучување на Колективен договор за изменување и дополнување на колективниот договор на ЈПДП.
- Усвојување на Правилник за изменување на Правилникот за плата и наградување на вработените на ЈПДП.
- Донесување на План за изменување на Годишниот план за јавни набавки за 2023 година на Јавно претпријатие за државни патишта.
- Донесување на Одлука за донација на ЈП за стопанисување со државни шуми Национални шуми – Скопје, согласно заклучокот на Влада на РСМ на ден 25.8.2022 година (за проект изградба на експресен пат А2, делница Ранковце – К.Паланка, секција Длабочица – Крива Паланка).
- Усвојување на Извештајот од финансиското работење на претпријатието во вториот квартал од 2023 година.
- Усвојување на Извештајот од финансиското работење на претпријатието во првото полугодие за 2023 година.

- Донесување на Одлука за усвојување на Финансиски план на ЈПДП за 2024 година бр.05-7932/1 од 17.8.2023 година.
- Донесување на Одлука за отпочнување постапка за задолжување со дополнителни средства со државна гаранција за финансирање на Проектот за надградба и развој на патиштата.
- Донесување на Одлука по Барање бр.10-8267/1 од 29.8.2023 година, од општина Маврово и Ростуше.
- Донесување на Одлука по Жалба против Одлука за неизбор на кандидат по јавен оглас бр.02-9093/1 од 19.9.2023 година, од подносител Бурим Лужа заверен со бр.02-9199/1 од 21.9.2023 година.
- Донесување на Одлука за донација на ЈП за стопанисување со државни шуми Национални шуми – Скопје, согласно заклучокот на Влада на РСМ на ден 25.8.2022 година (за проект изградба на автопат Кичево – Охрид).
- Донесување на Правилник за создавање на систем за заштита на личните податоци во ЈПДП.
- Донесување на Правилник за технички и организациски мерки за обезбедување безбедност на обработката на личните податоци во ЈПДП.
- Донесување на Методологија за спроведување на процена на влијание на заштитата на личните податоци.
- Донесување на Одлука за избор на Претседател на Управен одбор на ЈПДП.
- Донесување на Одлука за донација на ЈП за стопанисување со државни шуми Национални шуми – Скопје, согласно заклучокот на Влада на РСМ на ден 25.8.2022 година (за пробивање на патот С2-патот 8 дополнителна граница во секција 2, за изградба на коридорот 8 делница на автопатот Гостивар – Букојчани).

- Донесување на Одлука за донација на ЈП за стопанисување со државни шуми Национални шуми – Скопје, согласно заклучокот на Влада на РСМ на ден 25.8.2022 година (за изградба на пристапни патишта за пробивање на патот С2-Патот-7 и С2-Патот-8 во секција 2 коридорот 8 автопат Гостивар - Букојчани).
- Донесување на Одлука по Барање за отстранување повреда на право од работен однос бр.02-10041/1 од 17.10.2023 година, поднесено од Маријан Оливери.
- Донесување на Одлука по Жалба бр.02-10040/1 од 17.10.2023 година, поднесена од Маријан Оливети против решение за престанок на работен однос.
- Донесување на Програма за изменување и дополнување на Програмата за одржување и заштита на државните патишта за 2023 година.
- Донесување на Одлука за донација на ЈП за стопанисување со државни шуми Национални шуми – Скопје, согласно заклучокот на Влада на РСМ на ден 25.8.2022 година (за изградба и реализација на Секција 1 делница Тетово – Гостивар и Секција 2 делница Гостивар – Букојчани, коридор 8).
- Донесување на Одлука за избор на Претседател на Управен одбор на ЈПДП.
- Донесување на Одлука за разрешување и именување на помошник записничар на Управен одбор.
- Усвојување на Извештајот од финансиското работење на претпријатието во третиот квартал од 2023 година.
- Донесување на Одлука за исплата на бонус во 2023 година.
- Донесување на Одлука за донација на ЈП за стопанисување со државни шуми Национални шуми – Скопје, согласно заклучокот на Влада на РСМ на ден 25.8.2022 година (за проект изградба на автопат Кичево – Охрид).

- Усвојување на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за финансирање на патната инфраструктура за 2023 година.
- Донесување на Правилник за изменување на Правилникот за плата и наградување на вработените на ЈПДП.
- Донесување на Годишна програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2024 година.

2. РАБОТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ

Во текот на 2023 година беа одржани 19 седници на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиско работење на ЈПДП.

На седниците Надзорниот одбор ги разгледа и даде мислење и одобренија по однос на следните поважни акти и одлуки во врска со работењето на ЈПДП:

- Давање Одобрение на Годишниот план за јавни набавки за 2023 година на Јавното претпријатие за државни патишта.
- Давање одобрение на Програмата за одржување и заштита на државните патишта за 2023 година со ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта.
- Давање Одобрение на Одлуката за висината на благајничкиот максимум за 2023 година.
- Давање мислење за Годишна сметка на Јавното претпријатие за државни патишта за 2022 година.
- Давање Одобрение на Одлуката за усвојување на Предлогот на Годишната Програма за финансирање на патна инфраструктура за 2023 година, донесена од Управен одбор на ЈПДП на ден 20.3.2023 година.
- Давање мислење за Извештајот од финансиското работење на претпријатието во четвртиот квартал од 2022 година.
- Давање мислење за Извештајот од финансиското работење на претпријатието во второто полугодие од 2022 година.

- Давање Мислење на корегирани Финансиски план за 2023 година бр.05-3740/1 од 20.4.2023 година.
- Давање одобрение на Одлуката за распределба на средствата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици за 2023 година, донесена од Управен одбор со бр.02-3890/13 од 26.4.2023 година.
- Давање мислење за Извештајот од финансиското работење на претпријатието во првиот квартал од 2023 година.
- Давање мислење за Извештајот за работењето на ЈПДП за 2022 година.
- Давање одобрение на Планот за изменување на Годишниот план за јавни набавки за 2023 година на ЈПДП.
- Давање одобрение на Одлуката за исплата на регрес за годишен одмор за 2023 година, донесена од Управен одбор.
- Давање одобрение на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за одржување и заштита на државните патишта за 2023 година со ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта.
- Давање Одобрение на Планот за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2023 година на ЈПДП.
- Давање мислење на Извештајот за финансиското работење на претпријатието во вториот квартал од 2023 година.
- Давање мислење на Извештајот за финансиското работење на претпријатието во првото полугодие од 2023 година.
- Разгледување и давање мислење на Финансиски план за 2024 година, бр.05-7932/1 од 17.8.2023 година.
- Давање Одобрение на Планот за изменување на Годишниот план за јавни набавки за 2023 година, донесен од страна на Управниот одбор.

- Давање Одобрение на Одлука за отпочнување постапка за задолжување со дополнителни финансиски средства со државна гаранција за финансирање на Проектот за надградба и развој на патиштата.
- Давање одобрение на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за одржување и заштита на државните патишта за 2023 година со ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта.
- Давање мислење на Извештајот за финансиското работење на претпријатието во третиот квартал од 2023 година.
- Разгледување и давање Одобрение на Одлуката за исплата бонус во 2023 година, бр.02-12388/4 од 15.12.2023 година, донесена од Управен одбор на ден 15.12.2023 година.
- Давање Одобрение на Одлуката за усвојување на Предлогот за изменување и дополнување на Програмата за финансирање на патна инфраструктура за 2023 година, донесена од Управен одбор на ЈПДП на ден 25.12.2023 година.
- Давање мислење на Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2024 година.

3. ДИРЕКТОР НА ЈПДП

Со Јавното претпријатие за државни патишта раководи Директор, кој има заменик што го заменува и го води тековното работење на јавното претпријатие во негово отсуство.

Работата на Директорот на ЈПДП во текот на 2023 година беше насочена кон реализацијата на Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државни патишта, и грижата за законитоста во работењето и примена на прописите, статутот и другите акти на претпријатието. Директорот работеше спроведувајќи ги одлуките и заклучоците на Управниот одбор на Јавното претпријатие, организираше и раководеше со процесот на работењето на ЈПДП, ја реализираше Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2023 година. Исто така, склучуваше договори за реализација на програмите и други договори за потребите од тековното работење на Јавното претпријатие. Редовно ги вршеше сите останати надлежности утврдени со Статутот на Јавното претпријатие, во насока на обезбедување законитост во работењето и реализација на главните цели и задачи на Јавното претпријатие за државни патишта.

III. ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЈПДП

Во рамките на Јавното претпријатие за државни патишта утврдени се:

- 10 посебни работни места и тоа: 5 Помошници директори и 5 самостојни советници на директорот,
- 3 самостојни одделенија, како организациони единици кои не се во рамки на Сектор, туку се под директна надлежност на Директорот на Јавното претпријатие и тоа: Одделение за внатрешна ревизија, Одделение за информатички и комуникациски технологии и Одделение за организирање и поддршка на работата на Директорот
- 7 Сектори, како организациони единици под директна надлежност на Помошник директор и 18 Одделенија во рамките на секторите и тоа:

1. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ

1.1 Одделение за финансиско планирање, маркетинг и продажба

1.2 Одделение за меѓународни плаќања и следење на договори со меѓународни финансиски институции

1.3 Одделение за сметководство и плаќање

2. СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ, ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ОПШТИ РАБОТИ

2.1 Одделение за правни работи, застапување, подготовка и следење на експропријација

2.2 Одделение за човечки ресурси и општи работи

3. СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

3.1 Одделение за административно-техничка поддршка за јавни набавки

3.2 Одделение за спроведување на постапките за јавни набавки


4. СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИИ СО СРЕДСТВА ОД РМ

4.1 Одделение за инвестиции и градба на патишта со средства од РМ

4.2 Одделение за техничка подготовка и планирање со средства од РМ

5. СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИИ СО СРЕДСТВА ОД МФИ и ЕУ ФОНДОВИ

- 5.1 Одделение за инвестиции и градба на патишта со средства од МФИ и ЕУ фондови
- 5.2 Одделение за подготовка на тендери за проекти финансирани со средства од МФИ и ЕУ фондови
- 5.3 Одделение за заштита на животна средина и социјални аспекти
- 6. СЕКТОР ЗА ОДРЖУВАЊЕ, ЗАШТИТА НА ПАТИШТА И НАПЛАТА НА ПАТАРИНА
 - 6.1 Одделение за одржување на патишта и електроенергетски објекти
 - 6.2 Одделение за заштита на патишта
 - 6.3 Одделение за наплата на патарина и контрола
 - 6.4 Одделение за контрола на сообраќај
- 7. СЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПАТИШТА И УПРАВУВАЊЕ СО ПАТИШТАТА
 - 7.1 Одделение за РАМС – систем за управување со патиштата
 - 7.2 Одделение за безбедност на патиштата

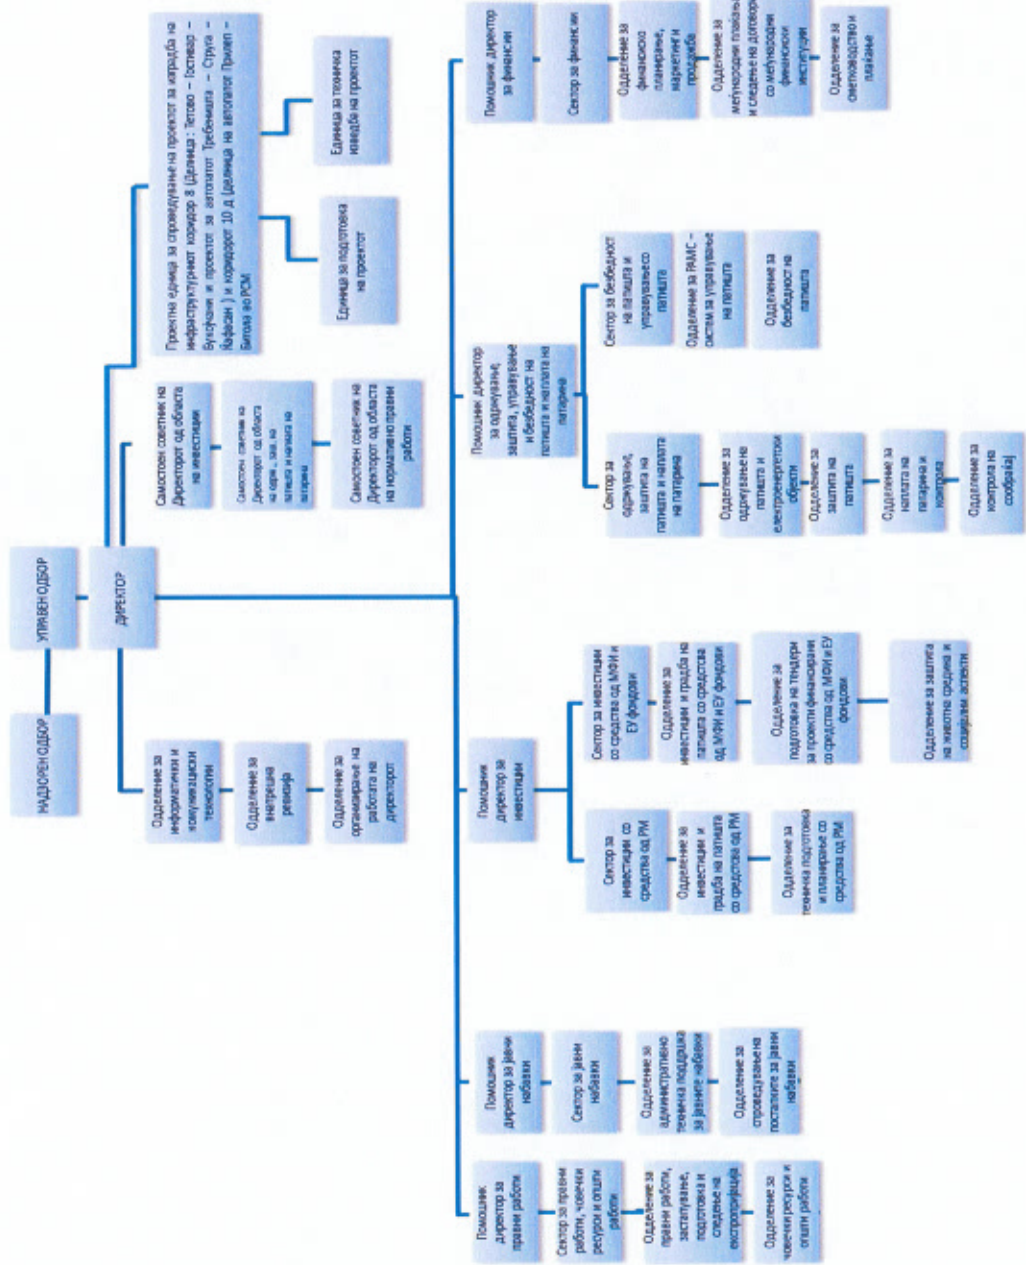

Заради ефикасно функционирање и извршување на работите во врска со планирањето, проектирањето и изградбата и употребата на дел од Коридорот 8, Делницата: Тетово – Гостивар – Букојчани, проектот за автопатот Требеништа – Струга – Кафасан и планирањето, проектирањето и изградбата и употребата на Коридорот 10 д, делница на автопатот Прилеп – Битола како проекти од национален интерес во Јавното претпријатие, во Јавното претпријатие за државни патишта формирана е Проектна единица за спроведување на проектот за изградба на инфраструктурниот Коридор 8 (делница Тетово – Гостивар – Букојчани и проектот за автопатот Требеништа – Струга – Кафасан) и Коридорот 10д (делница на автопатот Прилеп – Битола) во Република Северна Македонија, која е под директна надлежност на Директорот на јавното претпријатие.

Организационата структура на Проектната единица за спроведување на проектот за изградба на инфраструктурниот Коридор 8 (делница Тетово – Гостивар – Букојчани и проектот за автопатот Требеништа – Струга – Кафасан) и Коридорот 10д (делница на автопатот Прилеп – Битола) во Република Северна Македонија е утврдена како:

1. ПРОЕКТНА ЕДИНИЦА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ ЗА ИЗГРАДБА НА ИНФРАСТРУКТУРНИОТ КОРИДОР 8 (ДЕЛНИЦА: ТЕТОВО – ГОСТИВАР – БУКОЈЧАНИ И ПРОЕКТОТ ЗА АВТОПАТОТ ТРЕБЕНИШТА – СТРУГА – КАФАСАН) И КОРИДОРОТ 10 д (ДЕЛНИЦА НА АВТОПАТОТ ПРИЛЕП– БИТОЛА) ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1.1. ЕДИНИЦА ЗА ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТОТ

1.2. ЕДИНИЦА ЗА ТЕХНИЧКА ИЗВЕДБА НА ПРОЕКТОТ

Вкупниот број на вработени во Претпријатието на 31 декември 2023 година изнесува 409, од кои 360 вработени на неопределено време и 149 преку Агенција за привремени вработувања до 31.12.2023. Во текот на 2023 година, во Јавното претпријатие за државни патишта работен однос засноваа вкупно 24 лица од кои 3 лица на неопределено време, и тоа 2 лица по пат на превземање од други институции и 1 лице по пат на јавен оглас, додека пак 21 лице се вработени на определено време

во Проектната единица за спроведување на проектот за изградба на инфраструктурниот Коридор 8 (делница Тетово – Гостивар – Букојчани и проектот за автопатот Требеништа – Струга – Кафасан) и Коридорот 10д (делница на автопатот Прилеп – Битола) во Република Северна Македонија, до 22.01.2028 година.

Просечната исплатена бруто плата во 2023 година изнесува 68.181 денар, а просечната нето плата 44.816 денари. Месечните примањата на членовите на Управен и Надзорен одбор на ЈПДП изнесуваат: Претседател 18.000 денари, заменик претседател 17.000 денари, членови 15.000 денари. Како надоместок за материјални трошоци односно трошоци за користење на мобилен телефон и патни трошоци на Претседателот, Заменикот претседател и членовите на УО и НО им се плаќа месечен надомест од 2.000 денари.

Во Јавното претпријатие за државни патишта во 2023 година вкупниот број на влезни/интерни/излезни документи изнесува 44.034 од кои: 19.869 се влезни документи, 7.367 се интерни документи и 16.798 се излезни документи.

❖ *Табеларен приказ на бројот на влезни/интерни/излезни документи во ЈПДП за 2023 година по сектори:*

Сектор		Влезни документи	Интерни документи	Излезни документи	Вкупно
1	Организација и развој	0	2	0	2
2	Управување и раководење	311	1195	326	1832
3	Канцелариско архивски општи и правни работи	4924	1544	1166	7634
4	Човечки ресурси	201	2568	295	3064
5	Финансиско и материјално работење	4238	41	288	4567

6	Одбрана и безбедност	0	1	0	1
7	АОП	0	1	0	1
8	Јавни набавки	368	1141	1210	2719
9	Инвестиции	4618	216	1253	6087
10	Одржување и заштита на патишта, наплата на патарина и контрола, безбедност и управување на патишта	4320	583	11695	16598
11	Внатрешна ревизија	0	12	4	16
12	ИПА	126	12	117	255
13	ИКТ	3	45	8	56
14	Проектна Единица	760	6	436	1202
Вкупно		19869	7367	16798	44034

IV. ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Во Годишниот план за извршување на внатрешна ревизија за 2023 година планирани се 3 ревизии и тоа:

- Системска ревизија на ИПА II - Ревизија на операции во рамките на ИПА 2,
- Ревизија на Исплата по основ на договори и
- Ревизија по барање на Директорот

Планираните ревизии согласно Годишниот План за 2023 година за извршување на внатрешна ревизија се реализирани, односно Ревизија по барање на Директорот во тековната година не е побарано.

V. ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Финансиските извештаи на ЈП за државни патишта се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Правилникот за сметководство во Сл.весник на РМ бр. 159/2009 (применливи од 1 јануари 2010 година), Сл.весник на РМ бр. 164/2010 од 20.12.2010 година и Сл.весник на РМ бр. 107/2011 од 10.08.2011 година.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2023 и 2022 година. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

Согласно Законот за трговски друштва и Правилникот за водење сметководство, Јавното претпријатие за државни патишта е должно да води сметководствена евиденција на капиталот, средствата, побарувањата, обврските, приходите, трошоците и да го утврди финансискиот резултат од работењето по Годишната сметка.

Финансиските средства кои ЈПДП ги користи за изградба, реконструкција, одржување и заштита на јавните патишта, согласно Законот за јавни патишта се обезбедуваат од:

1. Дел од акцизата од деривати од нафта;
2. Надоместок за употреба на јавните патишта за моторни и приклучни возила (патна такса);
3. Надоместок за употреба на јавен пат, негов дел или објект на патот (патарина);
4. Надоместок за:

- а) поставување натписи и рекламни табли во заштитниот појас на државните патишта,
 - б) приклучување на пристапен пат на државен пат,
 - в) поставување инсталации во трупот на патот, во патниот и заштитниот појас на државен пат,
 - г) изградба и користење на комерцијални објекти на кои е дозволен пристап на државен пат надвор од населено место,
 - д) прекумерно користење на државен пат,
 - ѓ) вонреден превоз на државен пат и
 - е) штета сторена на патот и објектите на патот;
- 5. Средства од Буџетот на Република Северна Македонија;
 - 6. Заеми и кредити и
 - 7. Други приходи

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека Претпријатието ќе продолжи да работи во догледна иднина. Претпријатието нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Билансот на состојба ја покажува состојбата на средствата и изворите на претпријатието на 31.12.2023 година. Билансот на состојба е статички и кумулативен преглед, кој го набљудува претпријатието во даден момент и ја прикажува состојбата на средствата, изворите и капиталот кои произлегуваат од сите активности во претпријатието од неговото основање до денот на составување на билансот. Вредностите на ставките во Билансот на состојба се искажани според нивниот износ при набавка на средството, корегирани за промените што настанале.

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номиналната вредност. Паричните средства се состојат од денарска и девизна жиро сметка, готовина во благајна.

Побарувањата за дадени аванси се признаваат во висина на нивната номинална вредност и се состојат од дадени аванси на изведувачи.

Авансите за основни средства претставуваат средства дадени на добавувачи за набавка на основни средства и се искажуваат во висина на нивната номинална вредност.

Недвижности, постројки и опрема се евидентираат по нивната набавна вредност.

Амортизацијата на основните средства се пресметува врз основа на право-пропорционална метода во текот на проценетиот век на употреба на основните средства. Амортизација на инвестициите во тек не се пресметува се додека средствата во изградба не се активираат.

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни кредити земени од Меѓународни финансиски институции (Светска банка, ЕИБ, ЕБОР и Ексим банка)

и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Претпријатието има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, надоместувањето се признава како посебно средство, но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето.

во илјади денари

1. Биланс на состојба	ОСТВАРЕНО претходна година	ОСТВАРЕНО тековна година	Оств. тек. / оств. претх. (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
АКТИВА				
Парични средства	2,038,790	2,886,003	1.42	1.96
Побарувања	54,403	47,179	0.87	0.03
Залихи	2,083	2,274	1.09	0.00
Краткорочни финансиски средства	0	0	0.00	0.00
Други тековни средства (АВР)	81,864	58,323	0.71	0.04
Тековна актива	2,177,140	2,993,780	1.38	2.03
Материјални средства и вложувања во недвижности	119,337,991	144,334,234	1.21	97.96
Долгорочни финансиски вложувања	0	0	0.00	0.00
Нематеријални средства	7,376	6,123	0.83	0.00
Долгорочни финансиски средства	6,988	0	0.00	0.00

Нетековна актива	119,352,355	144,340,356	1.21	97.97
Вкупна актива	121,529,495	147,334,136	1.21	100.00
Вонбилансна актива	0	0	0.00	0.00
Краткорочни обврски	7,731,447	10,010,927	1.29	6.79
Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	2,193,456	16,792,101	7.66	11.40
Тековни обврски	9,924,903	26,803,028	2.70	18.19
Долгорочни обврски	46,615,742	49,614,822	1.06	33.68
Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	157,441	178,450	1.13	0.12
Нетековни обврски	46,773,183	49,793,272	1.06	33.80
Вкупно обврски	56,698,086	76,596,300	1.35	51.99
Капитал	5,000	5,000	1.00	0.00
Акумулирана добивка	50,108,233	51,581,909	1.03	35.01
Резерви	1,473,676	3,448,047	2.34	2.34
Ревалоризациони резерви	9,796,453	9,796,453	1.00	6.65
Добивка/ Загуба за деловната година	3,448,047	5,906,427	1.71	4.01
Вкупен капитал	64,831,409	70,737,836	1.09	48.01
Вкупно обврски и капитал	121,529,495	147,334,136	1.21	100.00
Вонбилансна пасива	0	0	0.00	0.00

Вкупната актива/пасива во Билансот на состојба во 2023 година изнесува 147.334.136.184 денари. Во однос на претходната 2022, кога изнесувала 121.529.495.188 денари, бележи зголемување од 21%. Во активата најголемо зголемување, согласно структурната и споредбената анализа, има во материјалните средства и вложувања во недвижности т.е инвестициите во тек. Додека во пасивата, зголемувањето е најголемо кај долгорочните обврски т.е. обврските по заеми и кредити, а исто така зголемување има и кај краткорочните обврски но незначително, согласно структурната анализа, во однос на претходната година.

2. БИЛАНС НА УСПЕХ

Билансот на успех ги покажува вкупно остварените приходи и расходи од работењето на ЈПДП за 2023 година и финансискиот резултат за истата година.

Во табелата што следи дадени се споредбени податоци од тековната година со претходната 2022 година и со планираните резултати за 2023 години.

зо илјади денари

2. Биланс на успех	ОСТВ. претходна година	ПЛАН. тековна година	ОСТВ. тековна година	Тек. /претх. (%)	План. /тек. (%)	Структ. тек. год. (%)
Приходи од продажба	5,117,468	6,100,000	5,754,254	1.12	0.94	53.38
Останати оперативни приходи	4,946,980	5,093,000	5,025,463	1.02	0.99	46.62
Вкупно оперативни приходи	10,064,448	11,193,000	10,779,717	1.07	0.96	100.00
Потрошени суровини, материјали и енергија	212,646	373,150	161,575	0.76	0.43	3.15
Трошоци за вработените	390,736	450,000	457,803	1.17	1.02	8.93
Амортизација на материјални средства	1,987,876	2,600,000	2,105,095	1.06	0.81	41.08
Вредносно усогласување на тековни средства	0	0	0	0.00	/	0.00
Останати оперативни расходи	1,979,058	1,950,000	2,399,339	1.21	1.23	46.83
Вкупно оперативни расходи	4,570,316	5,373,150	5,123,813	1.12	0.95	100.00
Добивка од оперативно работење	5,494,132	5,819,850	5,655,904	1.03	0.97	0.00

Приходи од финансирање	3,000,563	682,000	2,064,839	0.69	3.03	0.00
Расходи од финансирање	4,821,224	4,270,000	1,505,545	0.31	0.35	0.00
Добивка пред оданочување	3,673,471	2,231,850	6,215,198	1.69	2.78	0.00
Данок на добивка	225,424	223,185	308,771	1.37	0.00	0.00
Нето добивка / загуба	3,448,047	2,008,665	5,906,427	1.71	2.94	0.00

Во првиот дел од Билансот на успех се содржани оперативните приходи, кои изнесуваат 10.779.716.798 денари, и оперативните или општите трошоци, кои изнесуваат 5.123.812.795 денари. Нивната разлика ја дава оперативната добивка или добивка од работењето, која за тековната година изнесува 5.655.904.003 денари. Оперативната добивка во 2023 година е поголема од претходната 2022 година за 3%, а 3% поголема е и од планираната оперативна добивка за 2023 година.

Во вториот дел ставките во најголема мера се од екстерна природа и на нив претпријатието речиси и не може да влијае. Како показател за успешноста на работењето во анализите претставува оперативната добивка, за разлика од нето добивката над која што најголемо влијание имаат курсните разлики. Добивката пред оданочување за 2023 година изнесува 6.215.197.740 денари, и истата е поголема за 69% од претходната извештајна година. Нето добивката во 2022 година изнесува 3.448.047.142 денари. Данокот на добивка за извештајната година изнесува 308.770.568 денари.

3. СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ

Приходите се признаваат доколку е веројатно дека идните економски користи ќе бидат прилив за Претпријатието и доколку овие користи може веродостојно да се измерат. Приходите на Претпријатието се економски користи кои настануваат во текот на разгледуваниот период, кои произлегуваат од редовните активности на истото. Приходите на Претпријатието произлегуваат од надоместоците утврдени со Законот за јавни патишта. Приходите од камати се признаваат за временскиот период за кој истите се одесуваат.


во илјади денари

3. Специфицирани приходи	ОСТВ. претходна година	ПЛАН. Тековна година	ОСТВ. тековна година	Тек. / оств. претх. (%)	Оств. / план. (%)	Структ. анал. тек. год. (%)
Приходи од дејноста						
Приходи регистрација	1,818,312	2,300,000	1,919,970	1.06	0.83	14.95
Приходи патарина	3,254,964	3,800,000	3,795,830	1.17	1.00	29.55
Приходи од вонреден превоз	39,655	40,000	34,540	0.87	0.86	0.27
Приход од рекламни табли, инсталации, пристапен пат, прекоп и друго	4,536	3,000	3,914	0.86	1.30	0.03
Приходи од акциза	4,679,921	5,000,000	4,908,085	1.05	0.98	38.21
Останати приходи од работењето	267,059	50,000	117,378	0.44	2.35	0.91
Вкупни оперативни приходи	10,064,448	11,193,000	10,779,717	1.07	0.96	83.92
Останати приходи						
Позитивни курсни разлики	2,975,538	650,000	2,063,008	0.69	3.17	16.06


Приходи од камати	25,026	32,000	1,831	0.07	0.06	0.01
Вкупно останати приходи	3,000,563	682,000	2,064,839	0.69	3.03	16.08
Вкупно приходи	13,065,011	11,875,000	12,844,556	0.98	1.08	100.00

Во 2023 година ЈП за државни патишта оствари приходи во вкупен износ од 12.844.555.965 денари. Вкупните остварени приходи на претпријатието се намалени за 2% споредбено со претходната година.

❖ *Графички приказ бр.1: Остварени приходи во однос на планираните приходи за 2023 година*

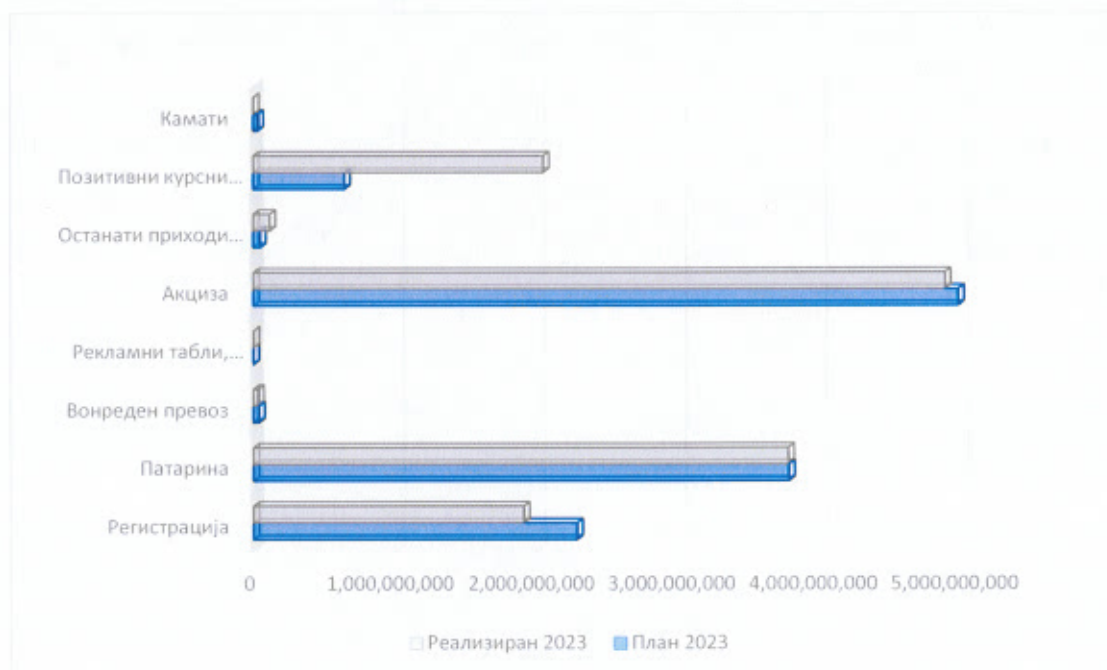

- ❖ *Графички приказ бр.2: Приходите остварени во 2023 година споредбено со 2022 година*



Оперативните приходи за 2023 година изнесуваат 10.779.716.798 денари, и истите се во рамките на планираното. Оперативните приходи во претходната 2022 година изнесуваат 10.064.447.524 денари и истите во 2023 година бележат зголемување од 7%. Најголемо зголемување согласно структурната анализа и споредбената анализа во дадена во табелата бр.3 претпријатието бележи кај приходите од акцизата од деривати од нафта и кај приходите од патарина.

Согласно Законот за јавни патишта, тука во оперативните приходи спаѓаат: надоместокот за употреба на јавен пат, негов дел или објект на патот (патарина), надоместокот за употреба на јавните патишта за моторни и приклучки возила (патна такса) што се плаќа при регистрација на возилата, и други приходи кои произлегуваат од работењето.

Висината на надоместокот за употреба на јавните патишта за моторни и приклучни возила (патна такса) што се плаќа при регистрација на возилата, еднаш годишно, се определува во зависност од влијанието на возилото врз оштетувањето

на патот. Во 2023 година од овој надоместок, оставрен е приход во износ од 1.919.970.025 денари. Остварениот износ е во рамките на планираното и истиот е поголем за 6% во однос на претходната година. Од приходот од надоместокот за употреба на јавните патишта за моторни и приклучни возила – патна такса, е намален за исплатите на имателите на моторни и приклучни возила со кои се врши меѓународен сообраќај. Согласно Одлуката за висината и начинот на плаќање на надоместокот за употреба на јавните патишта за моторните и приклучните возила (патна такса), се утврдува правото за враќање на дел од уплатениот износ сразмерно на времето што моторните и приклучните возила го поминале надвор од државата.

Висината на надоместокот за употреба на јавен пат, негов дел или објект на патот (патарина) е определена во зависност од должината на делницата на која се наплаќа надоместокот и од категоријата на возилата. Во 2023 година овој приход изнесува 3.795.829.832 денари и истиот е за 17% поголем во споредба со претходната година.


Во други приходи од работењето влегуваат разни надоместоци што се плаќаат на магистралните и регионалните патишта, како што се надоместокот за поставување на натписи и рекламни табли во заштитниот појас на државен пат, приклучување на пристапен пат на државен пат, поставување на инсталации во трупот на патот и патниот појас на државен пат, изградба и користење на комерцијални објекти на кој е дозволен пристап на јавен пат надвор од населено место, за прекумерно користење на државен пат, за вонреден превоз и за штета на државен пат и на објектите на патот.

Делот од акцизата од дериватите од нафта, изнесува 4.908.084.764 денари. Согласно Законот за јавните патишта овие средства се трансферираат од Буџетот на Република Северна Македонија на сметка на Јавното претпријатие најмалку четири пати годишно, во интервали од најмалку три календарски месеци.

Останатите приходи за 2023 година изнесуваат 2.064.839.167 денари. Во останати приходи влегуваат позитивните курсни разлики и приходите од камати.

Приходите од камати се признаваат за временскиот период за кој истите се однесуваат. Овие приходи се помали од претходната година и истите во најголема мера се од екстерна природа, и поради тоа претпријатието тешко може да ги испланира и да влијае на нивната реализација.

❖ *Графички приказ бр.3: Учеството на поединечните приходи во вкупно остварените приходи за 2023 година.*

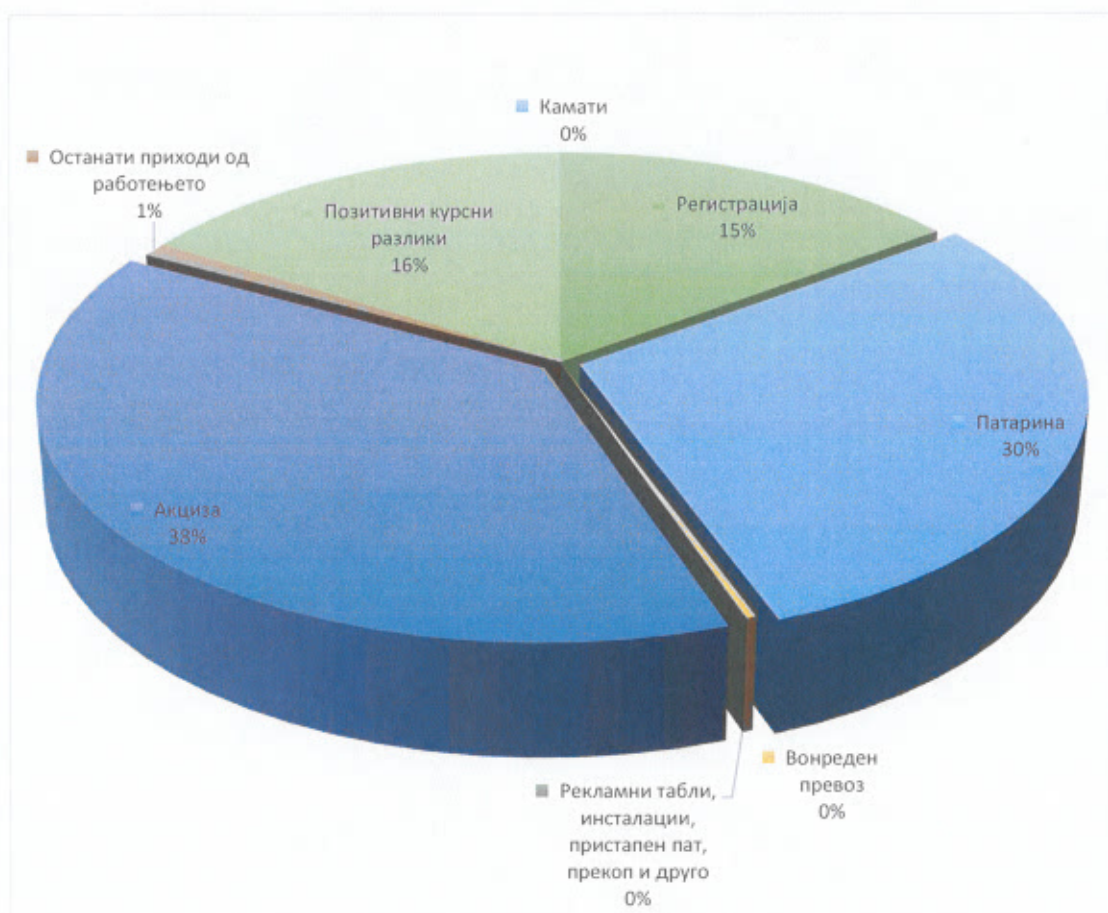

4. СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ

Расходите се признаваат во билансот на успех кога се јавува намалување на идните економски користи поврзано со намалување на дадено средство или зголемување на дадена обврска кое може веродостојно да се измери. Расходите се признаваат врз основа на нивната директна поврзаност помеѓу направените трошоци и заработувањето на конкретните приходи.


во илјади денари

4. Специфицирани расходи	ОСТВ. Прет. година	ПЛАН. Тек. година	ОСТВ. Тек. година	Тек. / претх. год (%)	Оств. / план. (%)	Структ. анал. тек. год. (%)
Расходи од дејноста						
Трошоци за потрошен материјал, ситен инвентар и гориво	29,510	73,150	58,391	1.98	0.80	0.88
Трошоци за енергија	183,136	300,000	102,231	0.56	0.34	1.54
Плата, надоместоци за плата и останати трошоци за вработените	390,736	450,000	457,803	1.17	1.02	6.91
Амортизација	1,987,876	2,600,000	2,105,095	1.06	0.81	31.75
Трошоци за одржување на објекти и патишта	1,303,775	1,270,000	1,520,559	1.17	1.20	22.94
Комунални и други услуги	166,493	150,000	181,689	1.09	1.21	2.74
Провизија за здруженија за технички преглед	79,979	70,000	82,442	1.03	1.18	1.24
Трансфери до ЕЛС	300,000	300,000	291,674	0.97	0.97	4.40
Банкарски трошоци	35,051	35,000	64,058	1.83	1.83	0.97
Други трошоци од работењето	93,760	125,000	259,871	2.77	2.08	3.92
Вкупно оперативни расходи	4,570,316	5,373,150	5,123,813	1.12	0.95	77.29
Останати раходи						


Камата по кредити	272,146	270,000	544,625	2.00	2.02	8.22
Негативни курски разлика	4,549,078	4,000,000	960,920	0.21	0.24	14.49
Вкупно останати расходи	4,821,224	4,270,000	1,505,545	0.31	0.35	22.71
Вкупно расходи	9,391,540	9,643,150	6,629,358	0.71	0.69	100.00

Во 2023 година ЈП за државни патишта оствари расходи во вкупен износ од 6.629.358.225 денари. Намалувањето на вкупните расходи во 2023 година во однос на претходната година се должи на негативните курсни разлики.

- ❖ *Графички приказ бр.4: Остварени расходи во однос на планирани расходи за 2023 година*

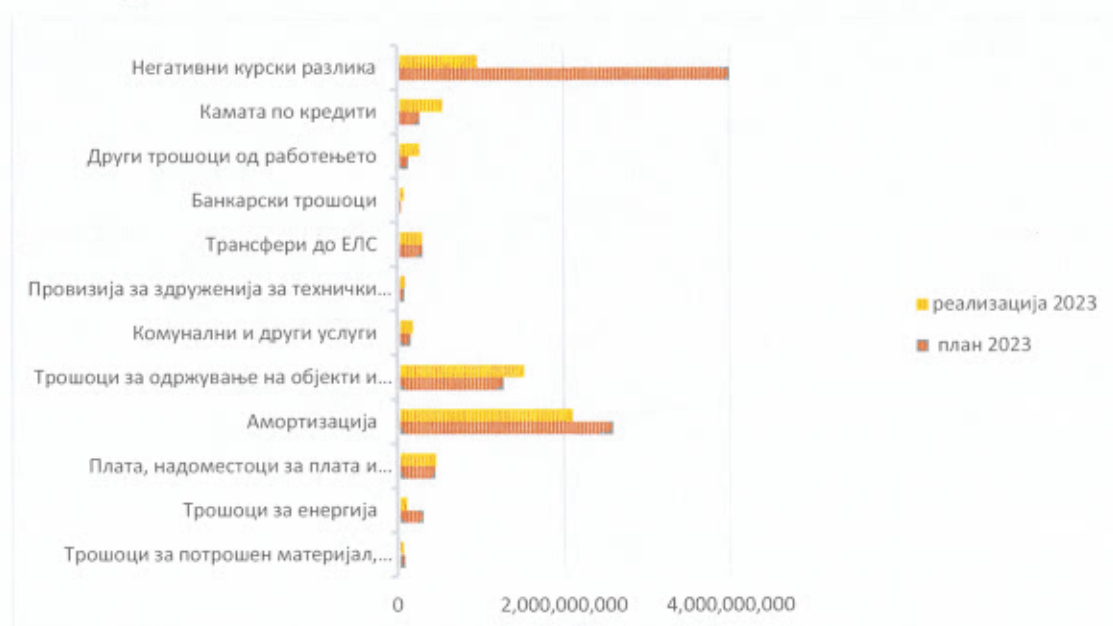

- ❖ *Графички приказ бр.5: Остварени расходи за 2023 година во однос на истите расходите за 2022 година*

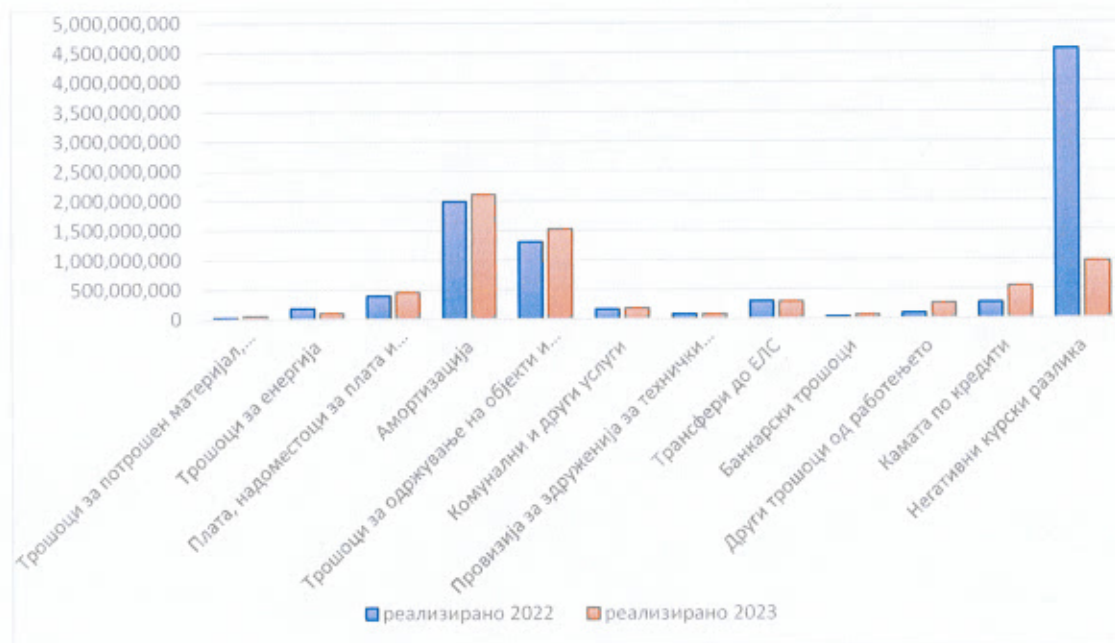


Оперативните расходи за 2023 година изнесуваат 5.123.812.795 денари. Оперативните расходи во претходната година изнесуваат 4.570.315.841 денар и истите во 2022 година бележат зголемување за 12%.

Согласно структураната анализа и процентуалното зголемување, поголемо зголемување на оперативните трошоци се забележува кај трошоците за одржување на објекти и патишта. Тоа се должи на зголемени исплати за одржување на државните патишта кон Македонија пат. Исто така, зголемување во однос на претходната година се забележува и во ставката плата и останати трошоци за вработени. Тоа се должи на зголемената ангажираност на вработените (инкасантите) на наплатните станици заради зголемената фреквенција на возила на автопатиштата, што се гледа и од повисокиот приход остварен од патарина.

Останатите расходи за 2023 година изнесуваат 1.505.545.430 денари. Во останати расходи влегуваат негативните курсни разлики и каматите по кредити. Вкупно останатите расходи бележат значително намалување во однос на

претходната година поради намалени негативни курсни разлики. Имено, Претпријатието ја води својата сметководствена евиденција и известува во денари. Трансакциите во странска валута се евидентираат по важечкиот курс на странската валута на денот на трансакцијата. Извршена е пресметка на сите обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата. Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи или расходи од финансирање. Најголем број од трансакциите на Претпријатието се во ЕУР и УСД. Средниот курс на Еврото на 31.12.2022 година изнесува 61,4950 МКД, додека во 2021 изнесува 61,4932 МКД, а средниот курс на Доларот бележи намалување во однос на курсот на крајот од претходната година и тоа 55,6516 МКД во 2023 и 57,6535 МКД во 2022 година.

❖ *Графички приказ бр.6: Учество на поединечните расходи во вкупните остварените расходи за 2023 година*

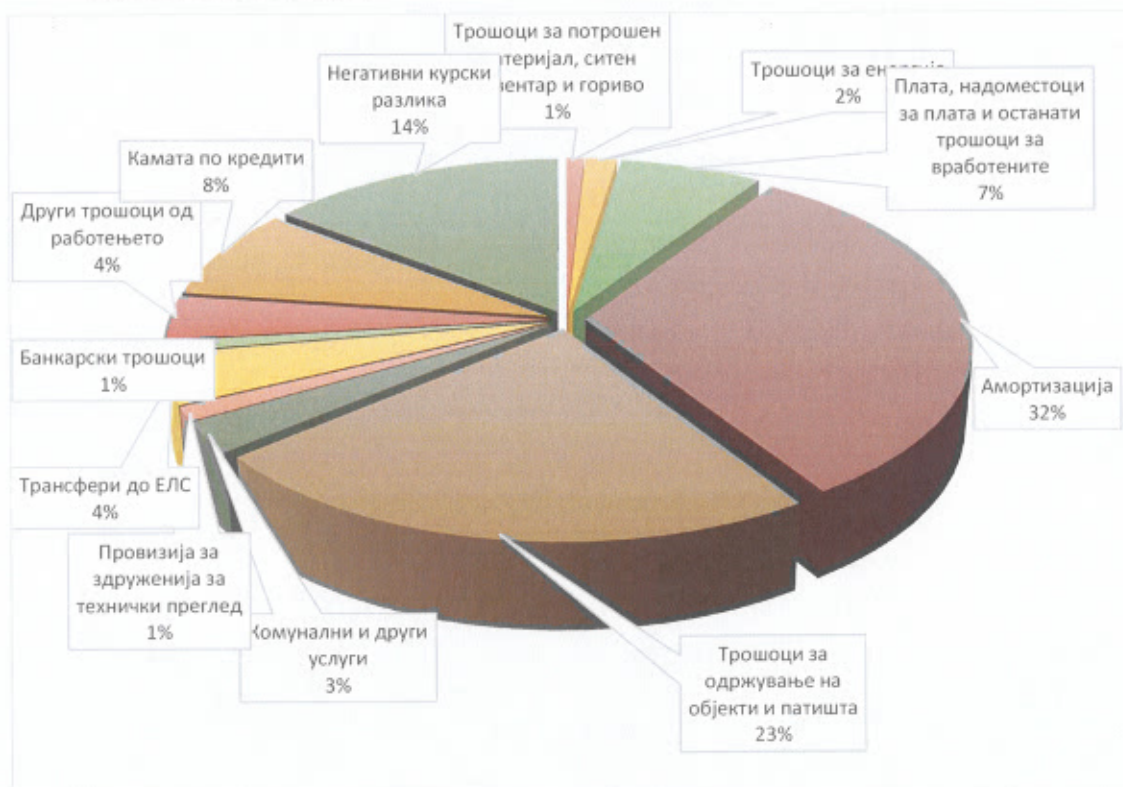

5. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА

Во овој дел од финансиското известување се претставени состојбата на поединечните материјалните и нематеријалните средства на претпријатието, споредбата на нивната состојба со претходната година, како и амортизацијата на секое поединечно средство со амортизацијата од претходната година.

во илјади денари

5.1. Материјални средства	Градежни објекти	Патишта	Опрема	Аванси за наб. на матер. ср-ва	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2023	35,664	128,770,647	296,592	572,076	55,048,838	184,723,816
Зголемување		11,414,428	22,195	3,264,564	20,960,509	35,661,697
Намалување	-		- 13,197	- 569,049	- 7,997,214	- 8,579,460
Салдо на 31 Декември 2023	35,664	140,185,075	305,591	3,267,592	68,012,133	211,806,054
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2023	9,680	65,137,880	238,266	-	-	65,385,826
Амортизација	185	2,082,774	16,227			2,099,185
Намалување			- 13,191			- 13,191
Салдо на 31 Декември 2023	9,865	67,220,654	241,302		-	67,471,820
Нето сметков. вредност на 31 Декември 2023	25,799	72,964,421	64,289	3,267,592	68,012,133	144,334,234
Нето сметков. вредност на 1 Јануари 2023	25,984	63,632,766	58,327	572,076	55,048,838	119,337,991
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2022	18,653	126,826,191	281,079	1,864,041	46,915,242	175,905,206
Зголемување	17,011	1,944,456	16,497	176,826	8,349,488	10,504,278
Намалување	-		- 985	- 1,468,791	- 215,893	- 1,685,668
Салдо на 31 Декември 2022	35,664	128,770,647	296,592	572,076	55,048,838	184,723,816

Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2022	9,495	63,176,459	215,194		-	63,401,148
Амортизација	185	1,961,421	24,056		-	1,985,662
Намалување	-		- 985		-	- 985
Салдо на 31 Декември 2022	9,680	65,137,880	238,266		-	65,385,826
Нето сметк. вред. на 31.12.2022	25,984	63,632,766	58,327	572,076	55,048,838	119,337,991
Нето сметк. вред. на 01.01.2022	9,158	63,649,732	65,885	1,864,041	46,915,242	112,504,058

во илјади денари

5.2 Нематеријални средства	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2023	1,634		51,953	916	-	54,503
Зголемување			4,656	-		4,656
Намалување						-
Салдо на 31 Декември 2023	1,634		56,610	916		59,160
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2023	1,634		44,577	916		47,127
Амортизација			5,909,916	-		5,909,916
Намалување						
Салдо на 31 Декември 2023	1,634	-	5,954,493	916	-	5,957,043
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2023	-	-	- 5,897,883	0	-	- 5,897,883
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2023	-	-	7,376	0	-	7,376
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2022	1,634		43,522	916		46,072
Зголемување			8,431			8,431
Намалување						

Салдо на 31 Декември 2022	1,634	-	51,953	916	-	54,503
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2022	1,634		42,363	916.16		44,913
Амортизација			2,213			2,213
Намалување						-
Салдо на 31 Декември 2022	1,634	-	44,577	916	-	47,127
Нето сметк. вред. на 31.12.2022	-	-	7,376	-	-	7,376
Нето сметк. вред. на 01.01.2022	-	-	1,159	-	-	1,159

6. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ

Во овој дел од извештајот прикажани се долгорочните кредити на јавното претпријатие, износот на основицата на секој кредит, каматната стапка, времетраењето на кредитот, вкупно исплатениот износ и износот што преостанува да се исплати.

6. Преглед на кредити	ИЗНОС на основица	Каматна стапка	Износ на 6 месечен ануитет	Вкупно исплатено	Преостанат долг	Времетраење (од - до, Вк. години)
ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ						
Патишта II ЕИБ - Луксембург	€ 60,000,000	3.62	1,752,265	€ 58,247,735	€1,752,265	15.11.2006 - 15.05.2024
ТТФСЕ II - Светска Банка	€ 14,670,375	Либор	610,240	€ 14,060,135	€610,240	15.12.2012 - 15.06.2024
Регионални и локални патишта - Светска Банка	€ 69,124,920	Либор	2,390,417	€ 47,542,592	€21,582,328	15.09.2013 - 15.05.2028
Проект за рехабилитација на магионални и регионални патишта - Светска Банка	€ 50,437,699	Либор	1,482,868	€ 10,380,078	€40,057,621	15.10.2020 - 15.04.2037
Проект за подобрување и развој на патишта - Светска Банка	€ 73,000,000	Либор	1,486,821	€ 1,317,539	€57,996,587	15.11.2023 - 15.05.2043
Регионални и локални патишта ЕБОР	€ 50,000,000	Либор+1	2,419,225	€ 50,000,000	€0	15.12.2012 - 15.06.2023
Коридор X патарини ЕБОР	€ 15,880,000	Либор+1	996,000	€ 10,899,998	€4,980,002	20.10.2015 - 20.04.2026
Програма за национални патишта ЕБОР	€ 181,000,000	Либор+1	9,045,016	€ 38,326,551	€117,585,221	20.02.2018 - 20.02.2030

Патна делница Штип - Радовиш ЕБОР	€ 64,000,000	Либор+1	3,007,709	€ 18,884,366	€45,115,634	15.03.2020 - 15.09.2030
Патна делница Кр. Паланка - Деве Баир ЕБОР	€ 10,000,000	Либор+1	385,247	€ 1,195,059	€7,704,941	15.04.2022 - 15.10.2033
Коридор VIII - патарини ЕБОР	€ 13,000,000	Либор+1	388,750	€ 777,500	€8,552,500	10.06.2023 - 10.12.2034
Вкупно долгорочни кредити ЕУР	€ 601,112,994		€ 23,964,558	€ 251,631,553	305,937,340	
Кичево - Охрид	\$505,044,967	2	\$18,833,456	\$109,542,401	\$395,502,566	21.07.2019 - 21.01.2034
Миладиновци - Штип	\$213,699,632	2	\$7,123,321	\$64,109,889	\$149,589,743	21.07.2019 - 21.01.2034
Вкупно долгорочни кредити УСД	\$718,744,599		\$25,956,777	\$173,652,291	\$545,092,308	
Министерство за финансии	7,300,745,286 ден		304,296,090 ден	961,265,246 ден	6,339,480,043 ден	01.01.2022 - 01.10.2038
Вкупно долгорочни кредити ДЕНАРИ	7,300,745,286 ден		304,296,090 ден	961,265,246 ден	6,339,480,043 ден	

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Промените во капиталот заклучно со 31 декември 2012 година се состојат од ревалоризациони резерви кои се пресметуваа за недвижностите, постројките и опремата заклучно со 31 декември 2012 година и остварена добивка. На 01.01.2013 година со трансформацијата на „Агенцијата“ во „Јавно претријатие за државни патишта“ се изврши корекција на капиталот, односно основната главнина со состојба на 31 декември 2018 година изнесува 5.000.000 денари и се состои од паричен влог. Средствата се земени од салдото на сметката на Агенцијата за државни патишта во рамките на трезорската сметка и се дел од салдото на денот на отворањето на сметката на ЈП за државни патишта. Овој капитал е упишан во Централниот регистар на РМ.

во илијади денари

7. Извештај за промените на капиталот	Државен капитал	Ревал. резерва	Реинвест. добивка	Акум. добивка (загуба)	Доб. од тековна година	Вкупно капитал
Состојба на 1 Јануари 2022	5,000	9,796,453	4,595,660	45,512,573	1,473,676	61,383,362
Добивка/загуба за тековната година				-	3,448,047	3,448,047
Резерви (реинвестирана добивка)			1,473,676	4,595,660	(1,473,676)	4,595,660
Враќање на реинвестирана во акумулирана			(4,595,660)			(4,595,660)
Состојба на 31 Декември 2022	5,000	9,796,453	1,473,677	50,108,233	3,448,047	64,831,409
Состојба на 01 Јануари 2023	5,000	9,796,453	1,473,677	50,108,233	3,448,047	64,831,409
Добивка/загуба за тековната година				-	5,906,427	5,906,427

Резерви (реинвестирана добивка)			3,448,047	1,473,676	(3,448,047)	1,473,676
Враќање на реинвестирана во акумулирана			(1,473,676)			(1,473,676)
Корекции						-
Состојба на 31 Декември 2023	5,000	9,796,453	3,448,047	51,581,909	5,906,427	70,737,836

Од дадената табела може да се види дека вкупниот капитал во 2023 година изнесува 70.737.836.459 денари, и истиот е зголемен за 5.906.427.172 денари во однос на претходната година, односно зголемен е за износот на добивката за тековната година.

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Извештајот за паричните текови ни ја дава целосната претстава за тековите на готовите пари во претпријатието, односно на едно место ни прикажува по кои основи претпријатието остварило готовински приливи во текот на 2023 година, а по кои основи се направени готовински одливи во истата година.

Извештајот за паричен тек е изготвен врз основа на директниот метод за пресметка на нето зголемувањето/намалувањето на паричните средства.

во илијади денари

8. Извештај за паричните текови	2023	2022	промена 2023/2022
Парични примања од надоместоци	10,647,395	9,726,485	1.09
Парични примања од останати оперативни активности	46,850	135,432	0.35
Исплати на добавувачи за трошоци за основна дејност	-1,186,269	-1,144,639	1.04
Исплати за плати и надоместоци на плати	-457,803	-390,347	1.17
Исплати за останати оперативни расходи	-1,191,284	-997,622	1.19
Платен данок од добивка	-206,583	-51,129	4.04
Примени камати	1,831	25,026	0.07
Парични средства од оперативни активности	7,654,139	7,303,206	1.05
Дадени/наплатени заеми на други	6,988	14,022	0.50
Набавки на нематеријални средства	-4,656	-8,431	0.55
Набавки на недвижности, постројки и опрема	-7,066,281	-11,875,840	0.60
Дадени/оправдани аванси за основни средства, нето	-2,695,516	1,291,965	(2.09)
Парични средства од инвестиции	-9,759,465	-10,578,284	0.92
Платени камати на кредити	-544,625	-272,146	2.00
Примени (отплатени) долгорочни кредити, нето	9,173,746	8,283,837	1.11
Отплатени кредити	-5,676,581	-4,891,386	1.16

Парични средства од финансиски активности	2,952,539	3,120,305	0.95
Нето зголемување / намалување на паричните текови	847,213	-154,773	(5.47)
Парични средства на почетокот на периодот	2,038,790	2,193,563	0.93
Парични средства на крајот на периодот	2,886,003	2,038,790	1.42

Во 2023 година од паричниот тек може да се види дека претпријатието има зголемување на паричните текови во износ од 847.213.109 денари. Претпријатието од оперативни активности прикажува готовински приливи и истите изнесуваат 7.654.138.521 денар, и истите се поголеми од претходната година. Додека, готовински одливи претпријатието најмногу покажува во инвестициските (вложувачки) активности. Паричните средства претпријатието на крајот на годината изнесуваат 2.886.002.986 денари.

9. ПРЕГЛЕД НА ГОДИШНИ ПОДАТОЦИ

Во овој дел од извештајот, во табела ќе бидат прикажани ставките од билансите и извештаите за 2023 година кои се битни за претпријатието и нивната споредба во однос на намалувањето/зголемувањето со претходната година.

во илјади денари

9. Преглед на годишни податоци	Реализација 2022	Реализација 2023	Промена 2023/2022
Тековна актива	2,177,140	2,993,780	1.38
Тековни обврски	9,924,903	26,803,028	2.70
Вкупно приходи од дејноста	10,064,448	10,779,717	1.07
Вкупно приходи	13,065,011	12,844,556	0.98
Вкупно расходи од дејноста	4,570,316	5,123,813	1.12
Вкупно расходи	9,391,540	6,629,358	0.71
Трошоци за плата	390,736	457,803	1.17
Вкупно трошоци за кредити	272,146	544,625	2.00
Резерви	11,270,129	13,244,500	1.18
Капитал (влог, акум. добивка)	50,108,233	51,581,909	1.03
Добивка / Загуба	3,448,047	5,906,427	1.71
Вкупно материјални средства	119,337,991	144,334,234	1.21
Вкупно нематеријални средства	7,376	6,123	0.83
Долгорочни финансиски средства	6,988	0	0.00
Вкупно средства	121,529,495	144,334,234	1.19

VI. ИНВЕСТИЦИИ

Инвестициите се преод на заштедите во капитални фондови. Во суштина, инвестициите се разликата меѓу вкупниот доход и потрошувачката во еден одреден временски период, кои се трансформираат во фиксни и обртни капитални добра. Инвестициите се вбројуваат меѓу најзначајните фактори на економскиот развој. Инвестициите т.е. капиталот се создава од домашните заштеди (акумулацијата) и позајмен капитал од странство, во форма на кредити и странски директни инвестиции. ЈПДП, капиталните средсва ги обезбедува од домашни заштеди и странски кредити.


Во табелата што следи се прикажани инвестиции од сопствени средства и инвестициите со странски кредити остварени во 2023 година и нивната споредба со претходната година.

Годишна Програма	Реализација 2022 година	Програма 2023	Реализација 2023 година	Споредба 2023/2022	Оств. /план. 2023	Струк. Анал. реал. 2023
ИНВЕСТИЦИИ	8,598,648,407	29,908,800,000	23,937,270,920	2.78	0.80	1.00
Инвестиции од сопствени средства	2,600,138,169	3,400,800,000	3,482,250,752	1.34	1.02	0.15
Градба и рехабилитација на државни патишта	824,675,862	873,100,000	1,502,622,254	1.82	1.72	0.06
Свлечишта и рехабилитација на мостови и тунели	266,551,241	279,500,000	90,036,533	0.34	0.32	0.00
Осветлување и Сигнализација и опрема на патишта	4,239,457	379,500,000	28,639,890	6.76	0.08	0.00
Сопствено учество во инвестиции од	327,034,710	407,200,000	416,567,484	1.27	1.02	0.02

странски кредити						
Инвестиционно одржување	588,077,968	720,000,000	617,432,284	1.05	0.86	0.03
Експропријација	176,046,115	200,000,000	209,496,589	1.19	1.05	0.01
Проектирање	45,351,530	129,500,000	48,101,638	1.06	0.37	0.00
Надзор над градежни работи	362,098,283	344,000,000	541,594,426	1.50	1.57	0.02
Опрема и Софтвер	6,063,003	68,000,000	27,759,654	4.58	0.41	0.00
Инвестиции од странски кредити	5,998,510,238	11,508,000,000	7,732,835,703	1.29	0.67	0.32
Инвестиции со кредит од Светска банка	653,051,678	1,081,000,000	1,134,707,069	1.74	1.05	0.05
Унапредување и развој на патиштата	653,051,678	1,081,000,000	1,134,707,069	1.74	1.05	0.05
Инвестиции со кредит од ЕБОР	2,440,319,849	4,427,000,000	2,586,371,511	1.06	0.58	0.11
Проект за електронски систем за наплата на патарина	4,025,127	40,000,000	34,399,283	8.55	0.86	0.00
Проект за градба на национални патишта	1,697,240,036	2,437,000,000	2,382,334,816	1.40	0.98	0.10
Штип - Радовиш, изградба на експресен пат	293,014,061	0	0	0.00	/	0.00
Крива Паланка - Деве Баир	160,995,457	214,000,000	124,115,937	0.77	0.58	0.01
Крива Паланка - Деве Баир ГРАНТ	0	36,000,000	36,053,352	/	1.00	0.00
Проект за патарина на Коридор 8	285,045,168	300,000,000	9,468,123	/	0.03	0.00
Букојчани - Кичево	0	400,000,000	0	/	0.00	0.00
Скопје - Блаце	0	1,000,000,000	0	/	0.00	0.00

Инвестиции со кредит од Ексим Банка	2,905,138,711	6,000,000,000	4,011,757,123	1.38	0.67	0.17
Кичево - Охрид, изградба на автопат	2,905,138,711	6,000,000,000	4,011,757,123	1.38	0.67	0.17
Инвестиции од Буџетски средства	0	15,000,000,000	12,722,184,465	/	0.85	0.53

❖ *Графички приказ бр.7: Инвестиции според изворите на финансирање*

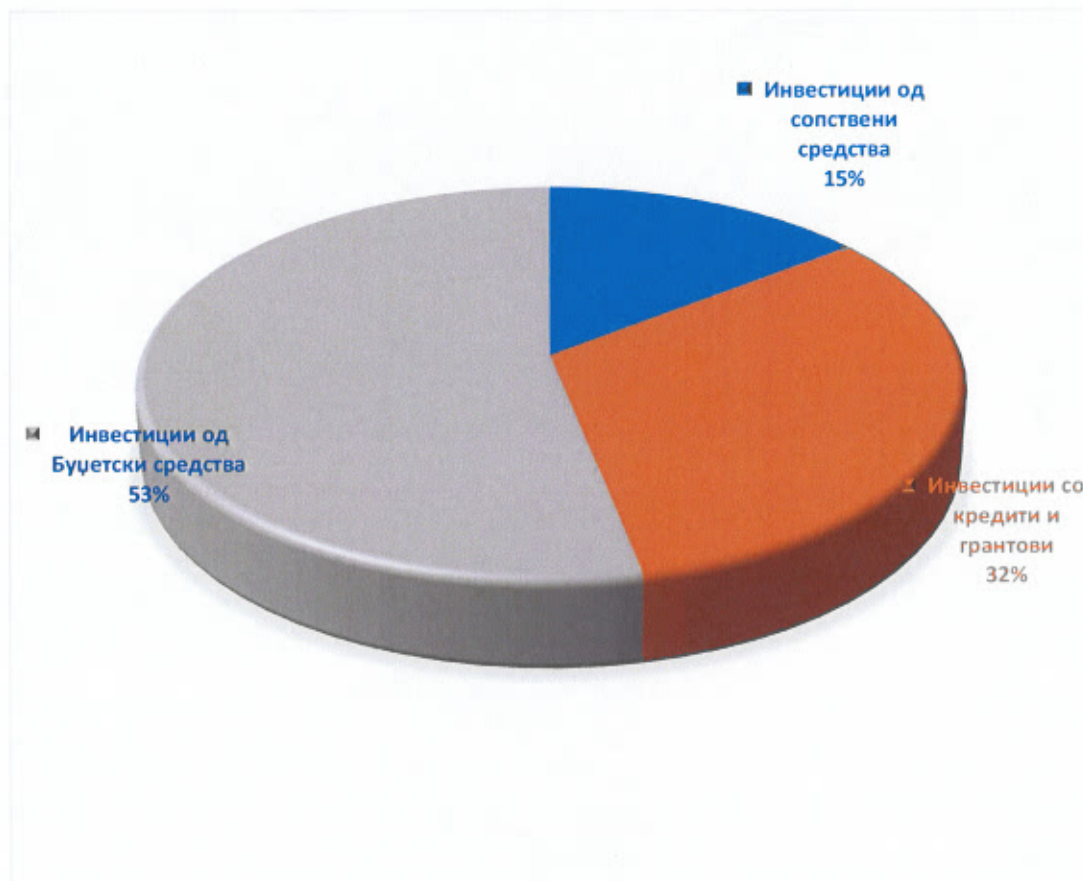

1. ИНВЕСТИЦИИ СО СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА

1.1. Градба, рехабилитација и реконструкција на државни патишта, свлечишта, мостови и тунели, осветлување и сигнализација на патиштата

- Сончев град, во должина од 4,4 км. Градежните работи комплетно се завршени. ЈП за државни патишта има аплицирано до Министерство за транспорт и врски за измена и дополна на инфраструктурен и основен проект. Измена и дополна на инфраструктурен проект е одобрен во март 2023 година. Почната е постапка за измени во тек на градба мај 2023 година, но истата е одбиена август 2023 година поради истекот на важноста на одобрението за градба. Во тек е постапка за продолжување на одобрението за градба. По продолжување на одобрението за градба од Министерство за транспорт и врски, ЈП за државни патишта ќе аплицира да изврши технички преглед и да се стави во употреба патот.
- Доизградба на регионален пат крак 1 од Р-418 (фаза 2), на потег фабрика „Вевчанка – Здравствен дом Вевчани, општина Вевчани во должина од 1 км. Патот е завршен во декември 2020 година. Преземени се активности за подготовка на документацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.
- Изградба на регионален пат Старо Коњарево - Ново Коњарево (општина Ново Село - струмичко), во должина од 3,4 км. Патот е завршен во јуни 2020 година. Преземени се активности за подготовка на документацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.
- Реконструкција на државен пат Р2133, делница Матејче – Липково, во должина од 3,3км . Патот е завршен во април 2021 година. Преземени се активности за подготовка на документацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.

- Реконструкција на државен пат Р2133, делница Ропалце – Матејче, во должина од 2,78 км. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.
- Изградба на Автопат А4, делница ГП “Блаце” - Скопје (клучка “Стенковец”) Подделница 1 - проширување на постоен пат А4 од ГП “Блаце” до с. Блаце до ниво на автопат и изградба на дел од автопат со клучка за поврзување со локален пат до с. “Блаце”, во должина од 2,00 км. Градежните работи се започнати во јули 2020 година и се очекува да завршат на крај од јуни во 2024 година.
- Докомплетирање на изградба на Автопат А4, делница ГП “Блаце” - Скопје (клучка “Стенковец”) Подделница 1 - проширување на постен пат А4 од ГП “Блаце” до с. Блаце до ниво на автопат и изградба на дел од автопат со клучка за поврзување со локален пат до с. “Блаце”. Градежните работи се започнати февруари 2023 и се очекува да завршат на крај од јуни во 2024 година.
- Изградба на мост на државен пат Р2136 на река Пчиња кај Коњаре. Мостот е завршен октомври 2020 година. Добиено е Одобрение за употреба во септември 2023 година.
- Изградба на регионален пат Р2246 делница, Извор (спој со А2) – Гарски мост, во должина од 19,00км. Градежните работи се започнати во 2021 година и се очекува да завршат во 2024 година.
- Реконструкција на државен пат Р1109, делница: Обиколница на Богданци, секција 1, км 0+0,000 – км 2+675, во должина од 2,68 км. Градежните работи се започнати во октомври 2022 година, а завршени се во декември 2023 година.
- Реконструкција на делница, Струмица - Дабиле, во должина од 3,04 км. Градежните работи се започнати март 2023 година и се очекува да завршат во септември 2024 година.

- Рехабилитација и поправка на државен пат Р1301 делница, Охрид – Свети Наум, во должина од 24.30 км. Градежните работи се започнати август 2023 година и се очекува да завршат во февруари 2025 година.
- Поправка и рехабилитација на државен пат А1 делница, Демир Капија – Неготино (двата коловоза), во должина од 14,80 км. Градежните работи се започнати во април 2023 година и се очекува да завршат во јуни 2024 година.
- Поправка и рехабилитација на државен пат А1/А2 делница, Скопје - Куманово (десен коловоз-возна лента), во должина од 11,30 км. Градежните работи се започнати во декември 2023 година и се очекува да завршат во септември 2024 година.
- Поправка и рехабилитација на државен пат А2 делница, Скопје – Тетово (двата коловоза), во должина од 13,05 км. Градежните работи се започнати во мај 2023 година и се очекува да завршат во август 2024 година.
- Поправка и рехабилитација на државен пат А4, делница Миладиновци - Свети Николе санација на постојни косини. Градежните работи се започнати во јуни 2023 година, а се завршени во декември 2023 година.
- Поправка и рехабилитација на државен пат Р1306 делница, Кривогаштани-Крушево во должина од 4,50 км и поправка и рехабилитација на државен пат Р2335 делница, Ропотово-Лажани во должина од 4,70 км. Градежните работи се започнати во ноември 2023 година и се очекува да завршат во август 2024 година.
- Поставување на заштитна звучна ограда на одредени автопатски делници по должина на Коридорите 8 и 10 (покрај градот Куманово и покрај населено место Сарај) во должина од 1.166 м на Коридор 10. Градежните работи се започнати во февруари 2023 година и се очекува да завршат во мај 2024 година
- Поставување на сообраќајна сигнализација и опрема на државен пат А3, делница Буково – Охрид, подделница Буково – влез во Охрид. Договорот

опфака корекција и проширување на банкени, на еста со поголема стрмност се изработува конструкција со габиони, демонтажа и монтажа на постојна сообраќајна сигнализација и поставување на елстична одбојна ограда и др. Градежните работи се започнати во март 2023 и завршени се во мај 2024 година.

- Реализација на договорите за Одржување на ЕЕ уреди, осветлување, светлосна сигнализација и систем за осветлување, Одржување на уреди за непрекинато и резервно напојување, одржување, надградба и броење на сообраќај во времетраење од две години, одржување на GPS уреди за бројачи на возила во времетраење од две години, одржување на фискални апарати, одржување и надградба на постоечкиот електронски систем за наплата на патарина и консултативни стручни анализи и мислење, одржување на лифтови во времетраење од две години, одржување на ПП апарати и испитување на громобранска инсталација и заштитно заземјување, одржување на систем за ПП заштита и дојава на пожар и алармен систем, одржување на клима уреди и системи за климатизација, одржување на опрема за видео надзор, одржување на автоматски стоп рампи, одржување на оптички кабел на автопат А4, Штип – Миладиновци, изнајмување на механизација за потребите на контролен центар Неготино во времетраење од три години, одржување на опрема на систем за електронска наплата на патарина на Коридор 10, превентивно и адаптивно одржување на систем за РАМС во времетраење од две години, одржување на тунелски системи и опрема, одржување на згради и објекти. Потпишани се договори со Изведувачи.

1.2. Инвестициско одржување

Согласно Договорот за одржување склучен со ЈП Македонијат, во позицијата 1.1. Надградување и поправка на коловози во 2023 реализирани се работи на следните патни правци:

1. P2239 врска со А2 - Арачиново
2. P2239 Чучер - Танушевци
3. P1102 врска А2 - Ченто
4. P2244 врска со P1207 Драгоманце - Арбанашко
5. P2237 Куманово - Старо Нагоричане
6. P2133 Матејче - Ропалце - Никуштак
7. P1203 Транзит Тетово
8. P1206 Транзит Тетово
9. P1206 Пирок - Гостивар
10. P1202 Дебар - ГП Блато
11. P1102 Башино село - Велес
12. P2137 Неготино - Дуброво - Војшанци
13. P1102 Демир капија - Давидово
14. P1102 спој со А1 - Прдејци
15. P1312 Костурница - Штипска рампа - Превалец
16. P1312 спој P2336 - Извор
17. P1108 Горничет - См. Вода
18. P1107 Рожден-Св.Петре
19. P29371Спој А3-Кривени
20. P29289 спој со P2240-Вишни
21. P2243 спој со P1201 - Селце - Буринец
22. P1304 Превалец-Виница
23. А4 с.Дабиле-с.Босилово
24. P1310 Берово - Владимирово

25. P1205 транзит Пробиштип
26. P1404 спој со А4-Робово-Муртино
27. P1302 спој со P1302-Разловци

1.3. Инфраструктурни проекти

Во фаза на изработка се следниве Проекти:

- Изработка на Инфраструктурен и Основен проект за државен пат А2, делница Букојчани – Кичево. Завршена е проектната документација во 2023 година.
- Изработка на проектна документација за Струмица – Валандово – Спој со А1.
- Изработка на проектна документација за експресен пат делница Битола – Мецитлија, со обиколница на Битола. Завршена е проектната документација во 2023 година.
- Изработка на проектна документација за државен пат А3, Обиколница на Ресен.
- Докомплетирање на постоечка проектна документација и изработка на Инфраструктурен проект за реконструкција со проширување на регионален пат Р2236, делница Свети Николе – Неокази.
- Изработка и комплетирање на проектна документација за поврзување на идниот Автопат А4, делница Миладиновци – Свети Николе – Штип (клучка Средно Коњаре) со регионалниот пат Р2136.
- Измена и дополна на проект за инфраструктура за Изградба на регионален пат Р2138, врска со регионален пат Р2134, со населба Сончев Град“. Склучен договор во јули 2020 година. Завршена е проектната документација во 2023 година.
- Докомплетирање на проектна документација за потребите за изградба на автопат А4, делница ГП Блаце - Скопје (клучка Стенковец), подделница 1 - проширување на постоен пат А4 од ГП Блаце до с. Блаце до ниво на Автопат и изградба на дел од автопат со клучка за поврзување со локален пат до с.Блаце. Склучен договор во мај 2023 година. Завршена е проектната документација во 2023 година.

- Изработка на проектна документација за изградба на обиколница Тетово преку клучка Требош до Непроштено. Склучен договор во јули 2021 година.
- Докомпетирање на проектна документација за проширување и подобрување на геометриските елементи на државен пат на регионален пат Р2235 делница, Никифорово – Леуново- Бунец (спојсо Р1202). Склучен договор во октомври 2022 година.
- Изработка на проектна документација за рехабилитација на државен пат А2, обиколница на Крива Паланка. Склучен договор во октомври 2022 година. Завршена е проектната документација во 2023 година.
- Изработка на проектна документација за проширување и подобрување на безбедноста во сообраќајот на државен пат Р2234, делница Кондово – Радуша - Јегуновце и изградба на обиколница на Свиларе. Склучен договор во декември 2023 година.
- Изработка на техничка документација: Сообраќаен проект на државен пат Р1309 делница Злетово – Добрево – Пробиштип и државен пат Р2232 делница врска Р1309/2232-Ратавица – Добрево, Склучен Договор во месец август 2023 година.
- Изработка на проектна документација за Санација на мост на Р2250, делница: Киселица – Луке. Склучен договор во декември 2023 година.
- Изработка на проектна документација за санација на свлечиште на Регионалниот пат Р2245, делница: Киселица – Луке. Склучен договор во декември 2023 година.

1.4. Експропријација

Во 2023 година се вршени исплати по основ на спогодби за експропријација, судски порамнувања, судски решенија и решенија за времени застапници во постапките за експропријација за следните проекти:

- Изградба на Автопат А2 Кичево – Охрид во должина од 56,7 км. Автопатот А2, делница Кичево-Охрид е поделен на 5 подделници. Постапката за експропријација на земјиште за главната траса, за вкупно 17-седумнаесет одлагалишта, 5-пет клучки, Денивелиран патен јазол Требениште, на Патен јазол Подмоље, Патен јазол Аеродром Св.Апостол Павле, и за 13-тринаесет косини е спроведена... Поради настанати проблеми со косините на оваа автопатска делница се појави потреба од докомплетирање на техничка документација за косини и дополнителна експропријација. Проектирани се вкупно 67 нови косини долж целата автопатска делница и заклучно со 2022 година од страна на Министерството за транспорт и врски се одобрени сите 67 Проекти за инфраструктура за косини. Постапката за експропријација целосно е завршена за сите новопроектирани косини до крајот на 2023 година. Покрај Проектите за инфраструктура за косини, проектирани се и 8 (осум) Проекти за Девијации на локални патишта од кои за 7 (седум) проекти постапката за експропријација е целосно завршена. Во текот на 2023 година одобрени се и 4 (четири) проекти за инфраструктура за изградба на паралелно пристапни патишта од кои постапката за експропријација е започната за 3 (три) проекти. Исто така од страна на Министерството за транспорт и врски во текот на 2023 година се одобрени и 5 (пет) Проекти за инфраструктура за изградба на Одлагалишта за одлагање на вишок земјан материјал за кој постапката за експропријација е во завршна фаза. . Паралелно со постапката за експропријација се започнати постапки за трајна пренамена на шума и шумско земјиште во градежно и постапки за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно пред Министерство за земјоделство, шумарство и

водостопанство. Во тек се вонпарнични постапки за утврдување на надомест за експроприран имот пред Основен суд Кичево и Охрид и Апелационен суд Гостивар и Битола.

- Изградба на Автопат А4, делница Миладиновци-Свети Николе-Штип за одводнување и пристапни патишта (од км.26+396,47 до км.41+625,00), делница Свети Николе-Штип во КО Преот, КО Свети Николе град и КО свети Николе вон град и Ко Сопот заклучно со 2023 година постапката за експропријација е завршена .
- Проект Изградба на А1 Прилеп-Градско, делница од мост на река Раец преку ДПЈ Дреново до ДПЈ Градско (спој со А1) од км. 10+216 до км.25+477,60 во Општина Росоман и Општина Градско.До крај на 2023 година постапката за експропријација на косини е во тек пред УИПР Велес За КО Крушевица, КО Сирково, КО Камен Дол и КО Дебреште во Општина Росоман постапката за експропријација е во завршна фаза и во тек се ВПП постапки пред Основен суд Кавадарци за определување на надомест за експропријација.
- Изградба на А2 делница Ранковце-Крива Паланка на ниво на експресен пат поделен во 2 лота со 10 одлагалишта, лот 1 од км 0+000 до км 10+308 и лот 2 од км 10+308 до км25+850; Постапката за експропријација на земјиштето за експресниот пат и 10 те одлагалишта е спроведена. Во тековната 2023 завршени се судските постапки за определување на надоместок. Постапките за пренамена на катастарските парцели на шумско земјиште во градежно се завршени, а постапката за пренамена на земјоделско во градежно земјиште е во тек пред надлежни институции.
- Проект за инфраструктура за измена и дополна на проектот за изградба на Државен пат А2, делница Ранковце -Крива Паланка на ниво на експресен пат, секции клучка Крива Паланка и Длабочица (Страцин) за денивелиран патен јазол Ранковце. Во тековната 2023 година завршени се судските постапки за определување на надоместок пред Основен суд Крива Паланка и

Апелационен суд Скопје. Пред МЗШВ завршена е постапката за раскинување на постоечки договор за закуп. Пред Министерството за Економија завршена е постапката за четири катстарски парцели опфартени со концесии. Постапката за премнамена на земјоделско во градежно земјиште е во тек пред надлежни институции.

- Проект за инфраструктура за измена и дополна на проектот за изградба на Државен пат А2, делница Ранковце -Крива Паланка на ниво на експресен пат, делница Ранковце – Кр. Паланка, секција Длабочица – Кр. Паланка за косини од км.3+054.00 до км. 10+308,00. Во тековната 2023 година започната е постапка за експропријација на 220 катастарски парцели. Пред МФ УИПР Крива Паланка постапката за експропријација е завршена. Пред надлежен орган АКН во тек е постапка за уписи на наведените катастарски парцели на име на РСМ.
- Проект за инфраструктура за измена и дополна на проектот за изградба на Државен пат А2, делница Ранковце -Крива Паланка на ниво на експресен пат, делница Ранковце – Кр. Паланка, секција Длабочица – Страцин за косини од км.10+308.00 до км. 25+850,00. Во тековната 2023 година започната е постапка за експропријација на 170 катастарски парцели. Пред МФ УИПР Крива Паланка постапката за експропријација е завршена. Пред надлежен орган АКН во тек е постапка за уписи на наведените катастарски парцели на име на РСМ.

За наведените катастарски парцели, експроприрани за потребите за косини, пред Основен суд Кр. Паланка пред крајот на 2023 заведени се преку 200 судски предмети за определување на надомест. Заклучно со месец Декември 2023 завршена е постапката пред Основен Суд Крива Паланка за повеќе од 50 судски предмети, примени се педесет првостепени Решенија на Основен суд Крива Паланка кои се обжалени.


- Изградба на експресен пат А3 Штип-Кочани, прва секција од км 0,00 до км 14+300 и втора секција од км 14+300 до км 28+057,44. Заклучно со 2023 година за втората секција од км.14+300 до км.28+057,44 постапката за експропријација е завршена и се постапува по ВПП предмети. За втората секција од км.14+300 до км.28+057,44 е започната постапка за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште и истата се води пред МЗШВ.
- Изградба и реконструкција на делница Старо Коњарево – Ново Коњарево како дел од државен пат Р1402 (Р-605); Постапката за експропријација на земјиштето е започната во текот на 2017 година и заклучно со декември 2023 година експропријацијата е завршена 100%. Во тек е пренамена на земјоделско земјиште и целокупната документација е пред МЗШВ, веднаш по завршување на пренамената ќе се превземаат сите активности за подготовка на документацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.
- Изградба на државен пат А4, делница Штип - Радовиш. Постапката за експропријација заклучно со 2023 година е завршена, останати се вонпарнични постапки за предмети кои се водат во Основните судови Штип и Радовиш.
- Изградба на државен пат Р2246, делница Гарски мост-Ехловец (Извор) од км 8+223,22 до км 16+000,22. Заклучно со 2023 година постапката за експропријација не е завршена се постапува по два предлога за експропријација кои се уште се пред УИПР Дебар. Започната е постапка за добивање на согласност за трајна пренамена на шуми во градежно земјиште и истата е завршена со ЈП Национални шуми додека сеуште не е завршено со делот на катастарските парцели кои влегуваат во опфатот на ЈП национален парк Маврово.

- Проект за инфраструктура за проширување на магистралниот пат А2, делница Крива Паланка - Граничен премин Деве Баир, Поделница 3, Вијадукт 4, КО Узем, Општина Крива Паланка. Во тековната 2023 година започната е постапка за експропријација. Пред МФ УИПР Крива Паланка експроприрани се сите катастарски парцели. Пред надлежен орган АКН во тек е постапка за уписи на наведените катастарски парцели на име на РСМ.
- Проект за инфраструктура за проширување на магистралниот пат А2, делница Крива Паланка – Граничен премин Деве Баир, Поделница 3, Вијадукт 5, КО Узем, Општина Крива Паланка. Во тековната 2023 година започната е постапка за експропријација. Пред МФ УИПР Крива Паланка експроприрани се сите катастарски парцели. Пред надлежен орган АКН во тек е постапка за уписи на наведените катастарски парцели на име на РСМ. За наведените катастарски парцели експроприрани за потребите за Вијадукт 3 и 4, пред Основен суд Кр. Паланка пред крајот на 2023 заведени се 7 судски предмети за определување на надомест. Заклучно со месец Декември завршена е постапката пред Основен Суд Крива Паланка за 7 предмети, примени се 7 првостепени Решенија на Основен суд Крива Паланка кои се обжалени.
- Изградба на државен пат Р1109, Делница, Обиколница Богданци. Постапката за експропријација е завршена. Постапката за пренамена на земјоделско во градежно земјиште е во тек пред надлежни институции.
- Изградба на нов мост на река Луда Мара К.О. Ваташа- Кавадраци. Заклучно со 2023 година постапката за експропријација е завршена 100%.
- Изградба на мост на река Бабуна. Заклучно со 2023 година не е завршена со експропријација на две катастарски парцели кои беа со незапишани права во АКН. ,
- Автопат А1, делница Демир Капија-Смоквица - косини. Во текот на 2023 година завршена е постапката за пренамена на земјоделско во градежно земјиште на повеќе од 100 катастарски парцели.

- Проект Понов мост Богданци, регионален пат П-1109. Во текот на 2023 година експроприрани се 65 катастарски парцели. Во најголем дел исплатен е надомест на поранешните сопственици на катастарските парцели. За преостанатите катастарски парцели во тек е постапка за експропријација.
- Автопат А4, делница ГП Блаце–Скопје (клучка Стенковец), Подделница 1 – проширување на постојан пат А4 од ГП Блаце до село Блаце до ниво на автопат и изградба на дел од автопат со клучка за поврзување со локален пат до с.Блаце – општина Чучер Сандево – Постапката за експропријација е завршена, исто така завшена е и пренамената на земјоделско земјиште на градежно неизградено и пренамена на сите катастарски парцели со катастарска култура шума. Во тек се вонпарнични постапки за определување на надоместокот за експроприран имот. Во тек е постапка за трајна експропријација за дополна на Проектот за инфраструктура за патен правец А1: Автопат А4, делница ГП Блаце – Скопје (клучка Стенковец), подделница 1 – проширување на постоен пат А4 од ГП Блаце до с.Блаце до ниво на автопат и изградба на дел од Автопат со клучка поврзување со локален пат до с.Блаце за косини и одлагалишта од км.0+500.00 до км.2+000,00 во КО Блаце. Изработени се 23 предлози за експропријација од страна на Државно правобранителство Скопје и истите се доставени до УИПР Чаир за постапување.
- Проект за инфраструктура за изградба на Автопат А4, делница ГП „Блаце“ – Скопје (клучка Стенковец) Подделница 2, од км.2+213 до Скопје (клучка „Стенковец“) општина Чучер Сандево, изработен е геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени и доставено е барање за изработка на процени за земјиште, насади и посеви, шума и објекти од Биро за процени.
- Проект изградба на нова траса на обиколница на Тетово преку клучка Требош до Непроштено – Фаза 1 во Општина Тетово и дел од Општина Теарце и Јегуновце. Во текот на 2023 постапката за експропријација за КО Тетово ВГ,

КО Требош ВГ, КО Цепчиште ВГ, КО Порој ВГ, КО Непроштено и КО Непроштено ВГ е започната пред УИПР ПО Тетово, каде постигнати се повеќе од 80 спогодни, а за останатите донесени се решенија за експропријација.

- Реконструкција на државен пат А4 – Делница Струмица-Дабиле, Општина Струмица. Постапката за експропријација е во почетна фаза, доставено е барање за изработка на процени до Биро за процени.
- ❖ Графички приказ бр.8: Учество на поединечите во вкупните инвестиции од сопствени средства

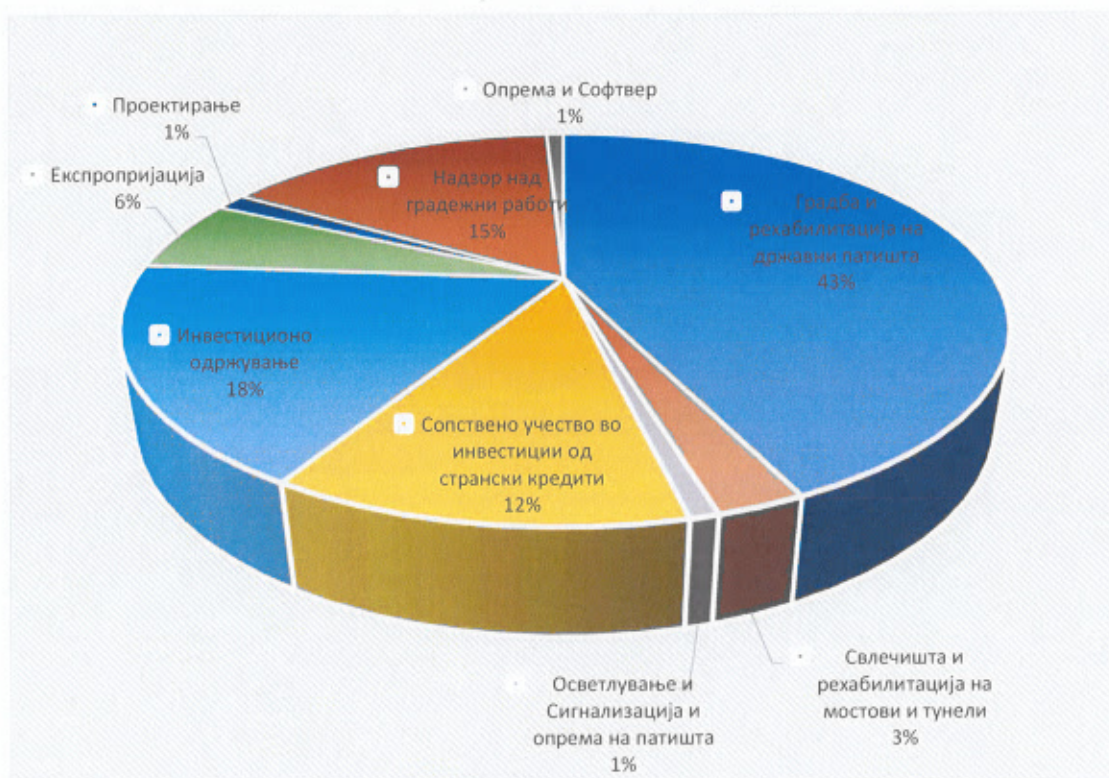

2. Инвестиции со странски кредити

2.1 Проекти финансирани со заем од Светска банка

Проект финансиран со средства од Светска Банка е **Изградбата на нов експресен пат – делница: Ранковце - Крива Паланка, со должина од 23 км.** Во фаза на реализација на проектот се појавија непредвидени работи, стабилизација на косини во усеци, појава на рударски тунели на самата траса, драстично покачување на цените на градежните материјали и сл., за кои има потреба од дополнителни финансиски средства, кои е проценето дека изнесуваат 45 милиони евра, со што вкупната вредност на проектот (вклучувајќи техничка помош) се зголемува и изнесува 118 милиони евра (104 милиони евра заем и 14 милиони грант средства).

За овој проект, во рамки на 8-от ВБИФ повик со подршка од Светска Банка, на 14.07.2023 обезбеден е инвестициски грант од страна на ЈПДП во износ од околу 14 милиони евра, кој е наменет за финансирање на непредвидените работи поврзани со стабилизација на косините во усеците на оваа патна делница.

На почеток на декември односно 05.12.2023 успешно се завршија преговорите за дополнителни 31 милиони евра заем.

Вкупната градежна инвестиција на изградба на експресен пат делница Ранковце - Крива Паланка ќе биде во износ од 107,5 милиони евра (93.5 милиони евра заем и 14 милиони грант средства). Градежните работи започнаа на 23.05.2018 година и до крајот на 2023 прогресот на градежните работи изнесува околу 80%.

Проблеми:

- Недостатоци во проектната документација
- Стабилизација на косини во усеци

2.2 Проекти финансирани од Европска банка за обнова и развој

Во 2014 година ЈПДП има склучено договор за **изведба и инсталација на електронски систем за наплата на патарина прва фаза**, со турската компанија Аселсан. Договорот е со вредност од 15.869.000,00 евра. Реализацијата на договорот е финансиран со заем од Европска Банка за обнова и развој.

Договорот е клуч на рака – во кој освен изведбата вклучена е и подготовка на проектна документација за секоја од предвидените наплатни станици на коридор X и оперативниот центар Петровец врз основа на која се изведени наплатните станици. Договорот предвидува и одржување на патарините во временски период од 36 месеци, по завршување на гарантниот период од 18 месеци, за секоја патарина поодделно. Со овој договор се реализирани сите предвидени наплатни станици: Романовце, Петровец и Оперативен центар Петровец, Градско, Сопот, Отовица, Демир Капија и Гевгелија. Во употреба се пуштени согласно следниов редослед: Јуни 2018 година НС Романовце, Јули 2018 година НС Сопот и НС Отовица, Февруари 2019 година НС Петровец и Оперативен Центар Петровец, Мај 2019 година НС Градско, Септември 2019 година НС Гевгелија и Ноември 2020 година НС Демир Капија. За сите горе наведени наплатни станици се добиени и употребни дозволи од страна на Министерството за Транспорт и Врски освен за наплатните станица Сопот и Демир Капија. За добивањето на употребни дозволи и за овие наплатни станици се следат препораките, се одклонуваат забелешките од страна на МТВ, за добивање употребни дозволи. Сите наплатни станици пред добивањето на употребни дозволи се пуштени во употреба со времени завршни извештаи од страна на Надзорниот орган, што е во согласност со важечкиот законот за градење а се однесува на градби финансирани од Меѓународни институции и сл.

Од овој договор за реализација останува месечното одржување на наплатните станици кое би завршило во 2025 година имајќи ја во предвид реализацијата на НС Демир Капија во 2020 година.

При изведбата на наплатните станици од коридор X извршени се неопходни измени, со цел безбедна и непречена функционалност на наплатните станици. За сите измени се изготвени проекти на изведена состојба по фази.

Со сите предвидени измени вредноста на договорот изнесува 15.772.777,91 евра без вклучен ДДВ. Вредноста е помала во однос на првичната цена во нај голема мера поради остранивање на предвидениот оптички кабел, иако се направени сите дополнителни и измени кои не ја надминуваат вредноста на предвидениот оптички кабел. Заклучо со 31.12.2022 год. со овој договор се реализирани 15.485.609,22 евра.

Кон средината на месец Декември 2020 година со Конзорциумот Аселсан – Жикол е склучен договор за **изградба и инсталација на електронски систем за наплата на патарина на Коридор VIII и автопатот Миладиновци – Штип, фаза 2.** Реализацијата на овој договор се финансира со заем од Европска Банка за обнова и развој. Вредноста на склучениот договор изнесува 12.489.356,17 евра.

Со овој договор е предвидена изведба на 2 (две) нови патарини на автопатот Миладиновци – Штип (НС Преод и НС Кадрифаков) и реконструкција на НС Миладиновци.

На коридорот VIII предвидена е реконструкција на 4 (четири) наплатните станици: Глумово, Желино, Тетово и Гостивар.

Со договорот е предвидена и инсталација на фотоволтаичен систем на патарините на коридор X (Романовце, Петровец, Оперативниот ценатар Петровец, Градско, Сопот, Отовица, Демир Капија и Гевгелија) и погоре споменатите патарини (Миладиновци, Глумово, Желино, Тетово и Гостивар).

Во месец Јуни 2022 год. согласно овој договор пуштени се во употреба наплатните станици Преод и Кадрифаково и извршено е поврзување на двата системи на коридор VIII и X во еден централен систем. Изведбата на НС Преод и НС Кадрифаково е проследена согласно проектна документација изготвена во периодот на 2016 година – 2017 година. Во текот на изведбата на овие наплатни станици извршени се непоходи измени, со цел безбедна и непречена функционалност на

наплатните станици. За сите измени се изготвени проекти на изведена состојба по фази.

Со реализацијата на наплатните станици Преод и Кадрифаково и единствен централен систем за двата коридор VIII и X реализирани се вкупно 6.651.735,52 евра.

Во договорот за фаза 2, изведба и инсталација на електронски систем за наплата на патарина на Коридор VIII и автопатот Миладиновци – Штип предвидено е и одржување на наплатните станици со вклучени резервни делови (одржување на системски дел – електронска наплата). Резервните делови се доставени во Јуни 2022 година складирани во Оперативниот центар Петровец, а одржувањето е активно од пуштањето на наплатните станици во употреба.

За реализација на реконструкцијата на наплатните станици Миладиновци, Глумово, Желино, Тетово и Гостивар, во периодот на 2023 година се изработуваше проектна документација.

За наплатните станици Глумово и Желино од страна на Министерството за транспорт и врски во почеток на месец август 2023 година се добиени одобренија за реконструкција, односно потврди за заверка на проектна документација. Кон крајот на месец септември 2023 година е започната реконструкцијата на наплатнат станица Глумово, а кон крајот на месец октомври 2023 година реконструкцијата на наплатнат станица Желино. Предвидениот рок за нивно завршување е 6 месеци за секоја наплатна станица поодделно.

Договорот за Заем од Европска Банка за обнова и развој за финансирање на **Проектот за магистрални патишта** склучен е на износ од 181.000.000 ЕУР.

Преку овој договор се финансира **изградбата на експресен пат А1, Градско – Прилеп, делница Фариш – Дреново**, во должина од 10,20 км. Градежните работи се започнати во јуни 2021 година и се очекува да завршат во јули 2024 година.

Рехабилитација со проширување на автопат А1, делница Петровец – Катланово (лев и десен коловоз), во должина од 5,37 км. Градежните работи се започнати во 2020 година, а рокот за завршување е јули 2021 година. Поради слабиот прогрес на работите Договорот е раскинат. Во фаза на изработка е нов тендер за докомплетирање на работите. Избран е нов Изведувач, а градежните работи се започнати во декември 2022 година и се очекува да завршат до крај на јуни во 2024 година.

Рехабилитација на регионален пат Р1202, делница Маврови Анови – Жировница, во должина од 18,30 км. Градежните работи се започнати во август 2020 година, а завршени се во јули 2023 година. .

Рехабилитација на регионален пат Р1102, делница Катланово – Велес во должина од 8,40 км. Градежните работи се започнати во август 2022 година, а се завршени во октомври 2023 година.

Рехабилитација на регионален пат Р1102, делница Велес – Градско во должина од 21,00 км. Градежните работи се започнати во август 2022 година и се очекува да завршат во февруари 2024 година.

Рехабилитација на државен пат А4, делница Скопје – Блаце, во должина од 10,00 км. Градежните работи се започнати во јули 2022 година и се очекува да завршат во јануару 2024 година.

Рехабилитација на државен пат А3, делница Битола – Мецитлија во должина од 12,00 км. Градежните работи се започнати во јули 2022 година, а се завршени во септември 2023 година.

Рехабилитација на државен пат А2, делница Подмоље – Струга – Кафасан во должина од 20,50 км. Градежните работи се започнати во јули 2022 година и се очекува да завршат во октомври 2023 година.

Кон крајот на 2016 година е избран најповолен понудувач за изградба на експресен пат Штип – Крупиште. Изградба на нов експресен пат на делница Штип –

Кочани, во должина од 28 км, 1 фаза е Штип – Крупиште во должина од 14,30 км и 2 фаза Крупиште – Кочани, во должина од 13,70 км. Делницата Штип – Крупиште е пуштена во употреба во 2020 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.

На втората делница од Крупиште до Кочани градежните работи се суштински завршени во декември 2022 година, а патот е времено пуштен во употреба крај на декември 2022 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.

Договорот за Заем од Европска Банка за обнова и развој за финансирање на Штип - Радовиш склучен е на износ од 64.000.000 ЕУР. Во текот на 2017 година водена е тендерска постапка за избор на најповолен понудувач за изградба на фаза 1 од делницата Штип-Радовиш (во должина од 23,56 км.) која ќе се гради по нова траса. Градежните работи се завршени во 2021 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.

Фаза 2: Реконструкција на две поделници, од Три Чешми до Штип - Југ и од Бучим до Радовиш вкупна должина од 16,87 км.

Градежните работи се завршени во 2021 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.

Договорот за Заем од Европска Банка за обнова и развој за финансирање на Крива Паланка – Деве Баир, во должина од 13,00 км, склучен е на износ од 10 милиони евра, средства од ЕБОР и 2,5 милиони евра неповратна помош од Европска Унија. Во текот на 2019 година е избран изведувач на работите. Рокот за комплетирање на работите е 2023 година. Градежните работи се завршени во декември 2023 година.

Договор за заем со Европска Банка за обнова и развој за финасирање на автопатска делница за **Кичево – Букојчани**, во должина од 10 км е склучен декември 2021 година во вредност од 129 милиони евра . Во текот на 2022 година е избрана техничка асистенција согласно правилата на Европска Банка за обнова и развој . Во 2023 година се распишани тендери за избор на надзор и изведувач.

Договор за заем со Европска Банка за обнова и развој за финасирање на автопатска делница за **Скопје - Блаце** втора делница, во должина од 10,5 км е склучен јули 2022 година во вредност од 186 милиони евра . Во текот на 2023 година е избрана техничка асистенција согласно правилата на Европска Банка за обнова и развој. Исто така во 2023 година е распишан тендер за избор на изведувач.

2.3 Проекти финансирани од Кинеската Ексим Банка

Договорот за изградба на патна делница **Кичево – Охрид** број 08-9012/1 од 12.11.2013 година е склучен помеѓу Јавното претпријатие за државни патишта како инвеститор и изведувачот Sinohydro Corporation Limited, со рок за завршување на работите до 29.01.2018 година. Вредноста на договорот е 598.074.670,03 евра, од кои 90% се обезбедени со заем од Ексим банка и се исплаќа во УСД и 10% од инвеститорот во МКД. Во текот на мај 2014 година отпочната е изградбата на автопатот Кичево – Охрид како дел од Коридор 8, со должина од 56,7 км.

Пробиени се околу 95% од трасата (пристапни патишта и дел е полн профил на траса). Се работи на земјани работи (ископ и насип, изработка на клинови кај вијадуктите и пропустите, и др.), конструкциите на сите мостови и вијадукти се завршени. Асфалтирано е 31,8 км со два слоја БНС 7+7см на сите пет поделници.

Тунелот е пробиен, примарната конструкција и секундарната конструкција се завршени, вкупно 4011м'. Каналите за електрика и полимерните канали за опасни материи се комплетно завршени. На влезот на левата тунелска цевка завршени се сите три таложници според проектот.

Во моментот се изведуваат работи на: спремање на тампон за асфалт во десна тунелска цевка од км.19+466-км.19+870, поставување на капаци на шахти во лева тунелска цевка и чистење на материјал околу шахти, поставување на сигнализација во десна тунелска цевка и нејзино поврзување.

Вкупниот прогрес на градежните работи во тунел изнесува 95 %.

Потпишан е Анекс бр. 1 кон Договорот за продолжување на рокот до 30.06.2021 година, Анекс бр.2 кон договорот за искористување на преостанатите средства од Основен договор по неопходен редослед на изведување на работите и оформување на функционални целини до обезбедување дополнителни средства и Анекс бр. 3 кон Договорот за дополнителни работи кои се нужни и неопходни за целосно завршување на проектот.

На почеток на месец септември 2019 година потпишан е Договор за Докомпетирање на проектна документација за Автопат Кичево - Охрид. Рок за проектирање: 12 месеци до септември 2020 година.

Доставен е допис од EXIM Bank за продолжување на рокот за повлекување на средства од кредитот по Основниот договор за Изградба на Автопат А2, делница Кичево - Охрид, кој рок истече на 14.02.2019 година и истиот се продолжува со краен рок на повлекување на средствата до 31.12.2021 година.

Исто така од EXIM Bank одобрени се дополнителни средства (во износ од 186.786.869,96 евра) согласно Анекс бр.3 за Изградба на Автопат А2, делница Кичево – Охрид кои се неопходни за завршување на изградбата на Автопат А2, делница Кичево – Охрид.

Потпишан е Анекс бр. 4 кон Договорот за изградба на автопат, делница Кичево-Охрид на 12.02.2020 год.

Потпишан е Анекс бр. 5 кон Договорот за изградба на автопат, делница Кичево-Охрид на 21.12.2021 год.

Проблеми:

Нестабилност на косините: Во изминатиот период се појавија нестабилности кои се манифестираат во форма на свлечишта на 13 зони на поделница 1, 2 , и 4.

Дислокација на надземни и подземни инфраструктурни објекти (далеководи, телефонски кабли, водоводни инсталации и сл.)

Дислокација на индивидуални станбени и стопански објекти кои се сечат со трасата на Автопатот.


Во тек е постапка за експропријација на веќе одобрени одлагалишта

Во тек се постапки за експропријација за паралелно пристапните патишта.


Неусогласености помеѓу проектната документација и состојбата на терен – со докомпетирање на проектната документација оваа состојба е надмината.

Реализирано заклучно со ИПС 74-2 (декември 2023) = 470.908.085,81 евра или 78,73%

- ❖ *Графички приказ бр.9: Учество на поединечите во вкупните инвестиции од средства од кредити*

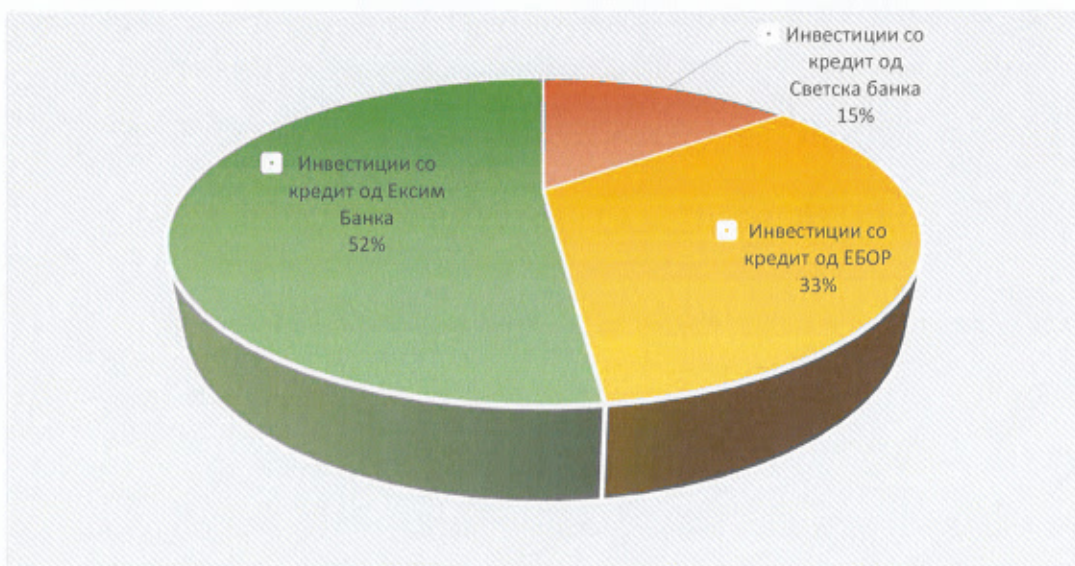

- ❖ *Графички приказ бр.10: Учество на поединечите во вкупните инвестиции по проекти од средства од кредити*

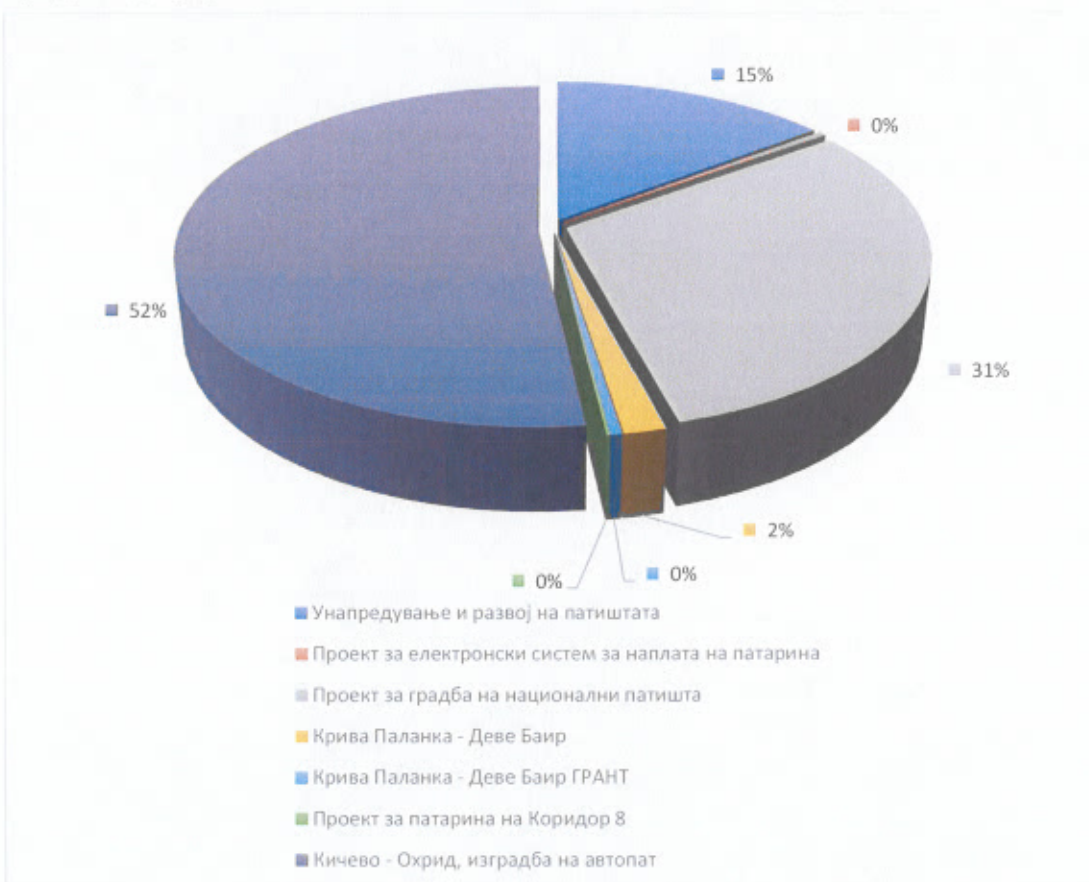

3. Инвестиции со буџетски средства

3.1 Проект за Изградба на коридор 8 на ниво на автопат, делница Тетово – Гостивар – Букојчани и Требениште – Струга – Кафасан и коридор 10д на ниво на автопат, делница Прилеп - Битола

Носител на проектот: Министерство за транспорт и врски и ЈП за државни патишта.

Почеток на изградба: март 2023 година.

Рок за изградба: јануари 2028 година.

Изведувач на Проектот: Бехтел/Енка.

Надзор: ИРД, Ептиса, Електра Солушнс и Евро консалтинг.

Буџет: Проектиран буџет 1.319.028.678,00 евра (согласно Договорот).

Статус: Во 2023 година се работеше на геомеханички испитувања на траса со пробивање на пристапни патишта до истите, се вршеше мобилизација од страна на изведувачот, се изработуваше проектна документација за трите делници, се вршеше исколчување на трасата и друго. Заклучно со крајот на 2023 година, исплатени се 206.800.000,00 евра односно 12.722.184.465,00 денари кон изведувачот на работите Бехтел/Енка.

VII. ЈАВНИ НАБАВКИ

Јавните набавки на ЈПДП во текот на 2023 година се вршеа согласно усвоениот План за јавни набавки, кој поради новонастанати потреби, во текот на годината беше изменет и дополнет четири пати.

Во текот на 2023 година ЈПДП спроведе постапки за следните јавни набавки и за кои има и склучени договори:

Ред. Бр.	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Вредност на договор со ДДВ
1	Одржување на автоматски стоп рампи SAME	4.720.000,00
2	Поштенски услуги	600.000,00
3	Хартија за фотокопир и хартија за плотер	1.174.855,20
4	Набавка, монтирање и одржување на GPS уреди во службени возила	471.882,00
5	Услуги за одржување на хигиена во времетраење од 2 години	24.850.800,00
6	Одржување на згради и објекти	14.160.000,00
7	Комунални услуги во времетраење од две години	29.500.000,00
8	Набавка на SMART картици за лица ослободени од патарина	584.100,00
9	Услуги за превоз на вработени во времетраење од две години	62.998.866,00
10	Докомплетирање на проектна документација за потребите за изградба на автопат А4, делница ГП "Блаце" – Скопје (клучка "Стенковец"), подделница 1 – проширување на постоен пат А4 од ГП "Блаце" до с. Блаце до ниво на автопат и изградба на дел од автопат со клучка за поврзување со локален пат до с. Блаце	2.902.800,00
11	Набавка на теренски возила	14.999.998,34
12	Електрична енергија	472.000.000,00
13	Надзор за докомплетирање на изградба на експресен пат А2, делница Длабочица – Страцин (Чатал)	24.223.040,00
14	Безалкохолни пијалоци	1.752.064,00

15	Одржување на ПП апарати и испитување на громобранска инсталација и заштитно заземјување	1.178.820,00
16	Рехабилитација и поправка на државен пат Р1301, делница Охрид – Свети Наум	723.417.886,00
17	Независна ревизија на финансиските извештаи за проектите финансирани од ЕБОР во времетраење од 3 години	708.000,00
18	Надзор на изградба на експресен пат А3, делница Крупиште – Кочани, на преостанати несусштински делови од изведбата со досегашниот надзор	3.032.045,00
19	Компјутери и компјутерска опрема	6.362.914,00
20	Одржување на автоматски стоп рампи – ELCA	5.900.000,00
21	Изработка на техничка документација - Сообраќаен проект на државен пат Р2242 Желино - Јегуновце врска со Р2234 и регионален пат Р2234 Јегуновце – Теарце	3.522.300,00
22	Изработка на техничка документација- Сообраќаен проект на државен пат Р1309 делница: Злетово-Добрево-Пробиштип и државен пат Р2232 делница: врска Р1309/2232-Ратавица-Злетово	2.360.000,00
23	Изработка на проектна документација за сообраќајна сигнализација за водење на сообраќај на државните патишта согласно законот за употреба на јазиците	4.678.700,00
24	Одржување на опрема за видео надзор	8.260.000,00
25	Одржување на лифтови	354.000,00
26	Оптичко комуникациско поврзување, интернет пакет услуги и услуги за фиксна телефонија, вклучувајќи и кол центар, во времетраење од три години	56.471.024,00
27	Одржување и сервисирање на фотокопири и принтери	708.000,00
28	Одржување на IP телефонија во времетраење од три години	2.360.000,00
29	Средства за хигиена	930.265,00

30	Надзор над одржување на државни патишта во времетраење од три години	101.350.228,32
31	Надзор за докомпетирање на изградба на експресен пат А2, делница Крива паланка - Длабочица	27.505.800,00
32	Надзор за изградба на обиколница на Тетово преку клучка Требош до Непроштено (фаза 1)	15.251.500,00
33	Изградба на обиколница на Тетово преку клучка Требош до Непроштено (фаза 1)	752.077.711,78
34	Одржување на електроенергетски објекти -ЕЕ	87.320.000,00
35	Набавка на микробранови транспондери (TAG) за електронска наплата на патарина	36.509.200,00
36	Изработка на проектна документација за Санација на мост на Р2250, делница Киселица - Луке	2.336.400,00
37	Привремени вработувања	3.540.000,00
38	Реконструкција со проширување на регионален пат Р1109 делница, Понов мост – влез во Богданци	321.649.520,85
39	Надзор за реконструкција со проширување на регионален пат Р1109 делница, Понов мост – влез во Богданци	8.732.000,00
40	Санација на мост над река Шевница на Р1101	47.199.862,29
41	Потрошен материјал за принтери и фотокопири	1.510.647,00
42	Санација на одрон/косина на Р1202, делница Бошков Мост - Мелнички Мост (кај Косоврасти)	94.396.637,00
43	Санација на мост над река Вардар (кај село Здуње) на државен пат А2, делница Гостивар Стража	41.149.154,46
44	Колективно осигурување на вработени, каско осигурување на возила, осигурување од автоодговорност и осигурување на имот (недвижности и опрема)	4.538.453,00
45	Санација на свлечиште/трупот на патот на км 49+800 на Р1202, делница Косоврасти -Мелнички мост	46.981.742,79
46	Изработка на техничка документација - Сообраќаен проект на државен пат Р1309 делница: Зрновце-Кочани-Пониква	1.770.000,00

47	Одржување на систем за евиденција на работно време	354.000,00
48	Одржување на фискални апарати	1.770.000,00
49	Канцелариски материјали	871.324,00
50	Кафе и други материјали за приготвување на топли напитки	590.449,00
51	Изработка на проектна документација за санација на свлечиште на стар манастирски пат Општина Крива Паланка	3.280.400,00
52	Изработка на проектна документација за санација на свлечиште на улица Св.Јоаким Осоговски, Општина Крива Паланка	3.540.000,00
53	Изработка на проектна документација за санација на свлечиште на Регионален пат Р2245 делница Киселица - Луке	3.540.000,00
54	Мобилна телефонија во времетраење од две години	7.080.000,00
55	Надградба на ERP софтвер	1.888.000,00
56	Изработка на проектна документација за проширување и подобрување на безбедноста во сообраќајот на државен пат Р2234, делница Кондово – Радуша – Јегуновце и изградба на обиколница на Свиларе	23.446.600,00
57	Лиценци за антивирус софтвер	252.000,00
58	Одржување и надградба на постоечки електронски систем за наплата на патарина и консултативни анализи	3.540.000,00
59	Одржување на светлосна сигнализација (VMS, трепкачи и семафори)	14.160.000,00
60	Одржување на вентилатори во тунели Демир Капија 1 и 2	4.130.000,00
61	Поставување на сообраќајна сигнализација на државен пат Р1203 делница Тетово - Г.П. Јажинце	40.920.124,08
62	Технички преглед и регистрација на службени моторни возила	79.013,43
63	Одржување, поправка и сервисирање на возила	3.540.000,00
64	Одржување на оптички кабел и комуникациска опрема	5.900.000,00

65	Лиценци за софтвер за канцелариско работење со Е-меил	1.887.165,00
66	Изработка на Геодетски елаборати во времетраење од 2 години	4.720.000,00
67	Одржување на компјутери и компјутерска опрема	7.080.000,00
68	Дигитални сертификати	196.009,80
69	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	707.733,00
70	Одржување на клима уреди	7.080.000,00
71	Гориво за службени возила и гориво за агрегати	7.080.000,00
72	Одржување на тунелски системи и опрема	16.166.000,00
73	Санација на трупот на патот на Р1306, делница Прилеп - Крушево (Кај Славеј)	88.498.657,28
74	Одржување на уреди за непрекинато и резервно напојување	11.210.000,00

Врз основа на спроведените постапки за јавни набавки во 2023 година склучени се 74 договори.

Подготвил: Оливера Вранеш
Елена Цикарска
Ilir Hodza
Maja T. Петрушевиќ
Shkelqim Miftari
Драган Ристовски
Ангелина Маџовска

Контролирал: Даниела Тасевски
Миле Куновски
Игор Митренцев
Кирил Каркалашев
Жаклина С. Богдановска

Одобрил: Сузана Атанасова
Татјана Миновска
Arsim Qoku
Зоран Сламков
Naxhi Ismaili
Ejup Latifi
Оливера Стефановска

ДИРЕКТОР
Ejup Rustemi

