

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
Бр. 02-3097/1
18.07 2019 год.
СКОПЈЕ

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

**ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
за 2018 година**

Скопје, 2019

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавни претпријатија ("Службен весник на Република Македонија" број 38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), Јавното претпријатие за државни патишта доставува годишен Извештај за своето работење за претходната година до Владата на Република Северна Македонија

СОДРЖИНА:

I.	ВОВЕД.....	4
II.	ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ НА ЈПДП.....	7
III.	ОРГАНОГРАМ НА ЈПДП.....	17
IV.	ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА.....	20
V.	ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ	21
VI.	ИНВЕСТИЦИИ	45
VII.	ЈАВНИ НАБАВКИ.....	66

I. ВОВЕД

Јавното Претпријатие за државни патишта (во натамошниот текст: ЈПДП) е основано на 03.01.2013 со Одлука за основање број 41-10147/1 од 28.12.2012 донесена од Владата на Република Македонија, објавена во Службен Весник на РМ бр.1 од 02.01.2013 година. Претпријатието е запишано во Централен Регистар на РМ со ЕМБС 6839673 и е правен следбеник на Агенцијата за државни патишта Скопје.

Основна цел и дејност на ЈП за државни патишта е планирање, изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на патиштата и управување со државните патишта. Со тоа ЈП за државни патишта останува двигател на патната инфраструктура во Република Северна Македонија.

Надлежности на ЈПДП се:

1. Управување со државните патишта;
2. Постојано следење и контролирање на состојбите на државните патишта;
3. Преземање мерки за рационално користење на средствата наменети за државните патишта;
4. Вршење инвестициски работи од областа на државните патишта;
5. Наплата на надоместоците за користење на јавните патишта;
6. Задолжувања кај домашни и странски финансиски институции;
7. Организирање на изработка на студии и проекти за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување, заштита и наплата на патарина со право нив да ги отстапува на физички и правни лица во согласност со закон;
8. Давање на вршење работи за изградба, реконструкција, рехабилитација и одржување на државните патишта на правни лица во согласност со Закон;

9. Предлагање одлука за започнување на постапка за давање концесија и/или други видови на јавно – приватно партнерство;
10. Издавање одобренија, одобрувања и мислења во согласност со Законот за јавните патишта;
11. Организирање активности што се поврзани со вршење на броење на сообраќај, заштита на државните патишта, катастар на државните патишта и формирање на неопходни бази на податоци;
12. Применување и користење на систем за управување со одржувањето на коловозите (PMS) и систем на управување со одржувањето на мостовите (BMS);
13. Поддршка за изградба, реконструкција и рехабилитација на патишта кои не се државни патишта, врз основа на обврски произлезени од закон.

Финансиските средства кои ЈПДП ги користи за изградба, реконструкција, одржување и заштита на јавните патишта, согласно Законот за јавни патишта се обезбедуваат од:

1. Дел од акцизата од деривати од нафта;
2. Надоместок за употреба на јавните патишта за моторни и приклучни возила (патна такса);
3. Надоместок за употреба на јавен пат, негов дел или објект на патот (патарина);
4. Надоместок за:
 - а) поставување натписи и рекламни табли во заштитниот појас на државните патишта,
 - б) приклучување на пристапен пат на државен пат,
 - в) поставување инсталации во трупот на патот, во патниот и заштитниот појас на државен пат,
 - г) изградба и користење на комерцијални објекти на кои е дозволен пристап на државен пат надвор од населено место,
 - д) прекумерно користење на државен пат,
 - ѓ) вонреден превоз на државен пат и
 - е) штета сторена на патот и објектите на патот;
5. Средства од Буџетот на Република Северна Македонија;

6. Заеми и кредити и

7. Други приходи

Извештајот за работењето го опфаќа целокупното работење на Јавното претпријатие за државни патишта за 2018 година, работењето на органите на управување на ЈПДП, работењето на внатрешната ревизија, остварените финансиски резултати за 2018 година, инвестициите во проекти во патната инфраструктура во 2018 година и реализацијата на годишната програма за 2018 година, како и Јавните набавки остварени во 2018 година, во согласност со надлежностите на Јавното претпријатие за државни патишта утврдени во Законот за јавни патишта и Статутот на ЈП за државни патишта.

Согласно Законот за јавни патишта, Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2018 година, е донесена од Управниот Одбор на ЈПДП и за неа е добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија.

II. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ НА ЈПДП:

Органи на управување на Јавното претпријатие за државни патишта се:

- Управен одбор,
- Надзорен одбор за контрола на материјално – финансиско работење,
- Директор

1. РАБОТА НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Во текот на 2018 година беа одржани 20 седници на Управен одбор.

На седниците на Управниот одбор беа донесени следните поважни акти и одлуки во врска со работењето на ЈПДП:

- Одлука за распишување на конкурс за избор на Директор на ЈПДП,
- Одлука за формирање на Комисија за прием и прегледување на пристигнатите документи по јавен конкурс за избор на Директор на ЈПДП,
- Јавен конкурс за избор на Директор на ЈПДП,
- Одлука за именување на вршител на должност Директор на ЈПДП,
- Одлука за усвојување Годишен план за јавни набавки за 2018 година на ЈПДП,
- Годишен план за јавни набавки за 2018 година на ЈПДП,
- Одлука за усвојување и донесување на Програмата за одржување и заштита на државните патишта за 2018 година,
- Одлука за распределба на средства за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици за 2018 година,
- Одлука за одлучување по Барање за реализација на проекти од општина Пласница,
- Одлука за одлучување по Барање во врска со Одлуката за распределба на средства за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици на општините и градот Скопје, од општина Пласница,
- Одлука по Барање за парична помош, поднесена од Илиевски Ристе,

- Правилник за Измена на Правилник за надоместок на определена материјални трошоци и други примања на функционери избрани од Управен одбор на ЈПДП,
- Решение за исплата на надоместок за одвоен живот од семејството,
- Одлука за одлучување по Приговор од работникот Стојан Ристески против решение за изрекување на дисциплинска мерка парична казна,
- Одлука за одлучување по Приговор од работникот Славе Ѓорѓиевски против Решение за враќање на работа,
- Одлука за избор на Директор по јавен конкурс за избор на Директор,
- Одлука за разрешување на Директор на ЈПДП,
- Одлука за утврдување на висина на плата на Директор на ЈПДП,
- Решение за службено патување во странство во Велика Британија,
- Одлука за пренамена на средства од Договорот за заем за Програмата за национални патишта,
- Одлука за усвојување на Извештај за попис на основни средства и ситен инвентар за 2017 година,
- Одлука за отпис – расходување на основни средства за 2017 година,
- Одлука за отпис – расходување на ситен инвентар за 2017 година,
- Одлука за усвојување на Извештајот за попис на состојба на салдата на паричните средства, побарувањата, обврските и материјалното работење на ЈПДП за 2017 година,
- Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во ЈПДП за 2018 година,
- Решение за службено патување во странство Р.Словенија,
- Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење на ЈПДП за четвртиот квартал 2017 година,
- Одлука за усвојување на Годишната сметка на ЈПДП за 2017 година,
- Одлука за употреба на средства остварени со работењето на ЈПДП за 2017 година,
- Решение за службено патување во странство Р.Хрватска,

- Правилник за работа во одделението за наплата на патарина и контрола,
- Одлука за усвојување и донесување на Правилник за службена облека на вработените во Одделението за наплата на патарина и контрола,
- Правилник за службена облека на вработените во Одделението за наплата на патарина и контрола,
- Одлука за усвојување и донесување Кодекс за однесување на вработените во одделението за наплата на патарина и контрола,
- Одлука за усвојување на Планот за дополнување на Годишниот план за јавни набавки на ЈПДП за 2018 година,
- Одлука за одлучување по жалба од давателот на јавна услуга Славчо Ѓеоргиевски против Решение за суспендирање на давател на јавна услуга од работа,
- План за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2018 година на ЈПДП,
- Кодекс за однесување на вработените во одделението за наплата на патарина и контрола,
- Одлука по барање за придонес за финансиска помош во организација на настанот поднесено од Друштво за патишта на РМ,
- Одлука за одлучување по барање за поддршка, донација од Здружение за заштита, помош и унапредување на статусот на маргинализирани групи граѓани Градиме Иднина – Скопје,
- Одлука за одлучување по Барање за спонзорство и донација за поддршка на одржување на конференција поднесено од Здружението 6 та звезда,
- Одлука за одлучување по Барање за спонзорство од друштво за филмска, театарска и видео продукција, трговија и рачно правени филмови 2БА Продукција Скопје, за едукативна тв интернет серија Нова Бушава Азбука,
- Одлука за давање согласност на предлог текстот на правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места во ЈПДП, предложен од страна на Директорот на ЈПДП,
- Одлука за усвојување и донесување на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за плата на вработените во ЈПДП,

- Правилник за изменување и дополнување на Правилник за плата и наградување на вработените во ЈПДП,
- Одлука за усвојување и донесување на Правилникот за оценување, содржината на извештаите и образецот за оценување на давателите на јавни услуги во ЈПДП,
- Правилникот за начинот и постапката за оценување, содржината на извештаите и образецот за оценување на давателите на јавни услуги во ЈПДП,
- Одлука за усвојување и донесување на Правилник за начинот на унапредување на давателите на јавни услуги во ЈПДП, формата и содржината на интерниот оглас,
- Одлука за усвојување и донесување на Правилник за работа во одделението за наплата на патарина и контрола,
- Правилник за начинот на унапредување на давателите на јавни услуги во ЈПДП, формата и содржината на интерниот оглас,
- Одлука за усвојување и донесување на Правилник за работа во одделението за наплата на патарина и контрола,
- Одлука за именување Записничар и помошник записничар на Управен одбор,
- Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење на ЈПДП за Јануари - Март 2018 година,
- Одлука за усвојување и донесување на Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на унапредување на давателите на јавни услуги во ЈПДП, формата и содржината на интерниот оглас,
- Правилник за дополнување на Правилникот за начинот на унапредување на давателите на јавни услуги во ЈПДП, формата и содржината на интерниот оглас,
- Одлука за одлучување по жалба од давателот на јавна услуга Фатон Синани против Решение за изрекување на дисциплинска мерка дисциплинска неуредност,
- Одлука за одлучување по жалба од давателот на јавна услуга Енис Рустеми против Решение за изрекување на дисциплинска мерка дисциплинска неуредност,

- Одлука за одлучување по жалба од давателот на јавна услуга Филип Стојановски против Решение за изрекување на дисциплинска мерка дисциплинска неуредност,
- Одлука за одлучување по Приговор од давателот на јавна услуга Мамер Јусуф против Решение за изрекување на дисциплинска мерка парична казна,
- Одлука за одлучување по Приговор од давателот на јавна услуга Сашо Илиевски против Решение за изрекување на дисциплинска мерка дисциплинска неуредност,
- Одлука за неодобрување на финансиска помош на лицето Ивковска Сенада од Дебар,
- Одлука за дополнување на Одлука бр.02-4105/7 од 2.4.2018 година,
- Одлука за усвојување на Планот за изменување на Годишен план за јавни набавки за 2018 година на ЈПДП,
- Планот за изменување на Годишен план за јавни набавки за 2018 година на ЈПДП,
- Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на ЈПДП за 2017 година,
- Одлука за висината на благајничкиот максимум и плаќање во готово,
- Одлука за отпочнување постапка за задолжување со државна гаранција за финансирање на рехабилитација и проширување на државен пат А2 делница Крива Паланка – граница со Бугарија,
- Одлука за одлучување по Приговор од давателот на јавна услуга Раде Милковски против Решение за изрекување на дисциплинска мерка дисциплинска неуредност,
- Одлука за усвојување на Предлогот за изменување и дополнување на Одлуката за висината и начинот на наплата на надоместокот за употреба на пат (патарина),
- Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење на ЈПДП за Април - Јуни 2018 година,
- Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење на ЈПДП во првото полугодие од 2018 година,

- Одлука за неодобрување на финансиска помош за лекување на ретко заболување – малиген тумор на тенко црево и миеолична леукемија на Филип Димишковски,
- Одлука за отпочнување постапка за доделување на грант по Проект Подобрување и крајпатни инфраструктурни услужни и сервисни елементи долж Коридор 8 и Коридор 10,
- Одлука за усвојување на дополнителниот Извештај за работењето на ЈПДП за 2017 година,
- Одлука за усвојување за изменување и дополнување на Програмата за одржување и заштита на државните патишта за 2018 година,
- Одлука за одлучување по Барање за финансиски средства од здружението на граѓани Гушни го светот за реализација на проектот Македонија го гушка светот,
- Одлука за одлучување по Приговор од давателот на јавна услуга Езгон Гури против Решение за изрекување на дисциплинска мерка парична казна,
- Одлука за усвојување на Планот за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2018 година на ЈПДП,
- Планот за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2018 година на ЈПДП,
- Одлука за усвојување и донесување на Планот за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2018 година на ЈПДП,
- Планот за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2018 година на ЈПДП,
- Одлука за усвојување и донесување на Планот за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2018 година на ЈПДП,
- Планот за дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2018 година на ЈПДП,
- Одлука за донација на дрвна маса за Ранковце – К. Паланка,
- Одлука за Претседател на Управен одбор на ЈПДП, Тања Томиќ,
- Одлука за Заменик Претседател на Управен одбор на ЈПДП, Аземина Учкан,

- Одлука за усвојување и донесување на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за одржување и заштита на државните патишта за 2018 година,
- Одлука за усвојување на Планот за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2018 година на ЈПДП,
- Планот за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2018 година на ЈПДП,
- Статутарна одлука за изменување на Статутот на ЈПДП,
- Одлука за усвојување на Извештајот за финансиското работење на ЈПДП за Јули - Септември 2018 година,
- Одлука за донација на дрвна маса на експресен пат Штип – Радовиш,
- Одлука за одлучување по Барање за одобрување на финансиски средства за изградба на Спомен биста од Панче Самојловски,
- Одлука за одлучување по Барање со молба во врска со настанат пожар, каде што бил опожарен домот на Роберт Стојан Атанасов од Струмица,
- Одлука за одлучување по барање за поддршка, донација од Здружение за заштита, помош и унапредување на статусот на маргинализирани групи грѓани Градима Иднина – Скопје,
- Одлука за одлучување по Барање со молба за финансиска помош заради сериозно нарушено здравје и заради можност за продолжување на лекувањето од Сабри Ајрули,
- Одлука за одлучување по Барање за финансиска помош заради влошена здравствена состојба и потреба од финансиски средства за купување на потребните лекарства од Злате Михајловски,
- Одлука за одлучување по Приговор од давателот на јавна услуга Славче Ѓоргиевски, а во врска со Решение за изрекување на дисциплинска мерка ,
- Одлука за отпочнување постапка за задолжување со дополнителни финансиски средства со државна гаранција за финансирање на изградба на автопатот Кичево – Охрид,
- Одлука за изменување на Одлуката за отпочнување постапка за задолжување со дополнителни финансиски средства со државна гаранција за финансирање на изградба на автопатот Кичево – Охрид,

- Одлука за усвојување на Финансиски план на ЈПДП за 2019 година,
- Одлука за донесување на Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта во РМ за 2019 година,
- Одлука за одлучување по Барање за донација од Боро Стајиќ,
- Одлука за одлучување по Приговор од работникот Славче Ѓоргиевски,
- Одлука за исплата на регрес за годишен одмор за 2018 година.

2. РАБОТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ

Во текот на 2018 година беа одржани 16 седници на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиско работење на ЈПДП.

На седниците Надзорниот одбор ги разгледа и даде мислење по однос на следните поважни акти и одлуки во врска со работењето на ЈПДП:

- Давање Одобрение на Годишниот план за јавни набавки за ЈПДП за 2018 година,
- Давање Мислење за Годишната сметка на ЈПДП за 2017 година,
- Давање на Одобрение на Планот за дополнување на Годишниот план за јавни набавки на ЈПДП за 2018 година,
- Давање Мислење за Извештајот од финансиското работење на претпријатието во првиот квартал од 2018 година,
- Донесување на Одлука за Заменик Претседател на Надзорен одбор за контрола на материјално – финансиско работење на ЈПДП - Александар Ружин,
- Давање Мислење за Извештајот за работењето на ЈПДП за 2017 година,
- Донесување на Одлука за записничар и помошник записничар за седниците на Надзорен одбор,
- Давање Одобрение на Планот за изменување на Годишниот план за јавни набавки на ЈПДП за 2018 година,


- Давање Мислење за Извештајот од финансиското работење на претпријатието во вториот квартал од 2018 година,
- Давање Мислење за Извештајот од финансиското работење на претпријатието во првото полугодие од 2018 година,
- Давање Мислење за дополнетиот Извештајот за работењето на ЈПДП за 2017 година,
- Давање Одобрение за Одлуката за отпочнување постапка за доделување на грант на Проектот Подобрување и крајпатни инфраструктурни услужни и сервисни елементи долж Коридор 8 и Коридор 10,
- Давање Одобрение на Планот за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки на ЈПДП за 2018 година,
- Давање Одобрение на Планот за доплонување на Годишниот план за јавни набавки на ЈПДП за 2018 година,
- Давање Одобрение на Одлуката за пренамена на средства од Договорот за заем за Програмата за национални патишта,
- Давање на Одобрение на Одлуката за отпочнување постапка за задолжување со државна гаранција за финансирање на рехабилитација и проширување на државен пат А2 делница Крива Паланка – граница со Бугарија,
- Давање Мислење на Извештајот од финансиското работење на претпријатието во третиот квартал од 2018 година,
- Давање Одобрение на Одлуката за отпочнување постапка за задолжување со дополнителни финансиски средства со државна гаранција за финансирање на изградба на автопат Кичево – Охрид,
- Давање Одобрение на Планот за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки на ЈПДП за 2018 година,
- Донесување на Одлука за Претседател на Надзорен одбор за контрола на материјално – финансиско работење на ЈПДП – Александар Ружин,
- Донесување на Одлука за Заменик Претседател на Надзорен одбор за контрола на материјално – финансиско работење на ЈПДП – Осман Мислими,

- Давање Одобрение за изменување на Одлуката за отпочнување постапка за задолжување со дополнителни финансиски средства со државна гаранција за финансирање на изградба на автопат Кичево – Охрид,
- Давање Мислење за Финансискиот план на ЈПДП за 2019 година,
- Давање Мислење на Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2019 година,
- Давање Одобрение на Одлуката за исплата на регрес за годишен одмор за 2018 година

3. ДИРЕКТОР НА ЈПДП

Со Јавното претпријатие за државни патишта раководи Директор. Во текот на 2018 година, со Одлука на Управниот Одбор на ЈПДП за избор на Директор по јавен конкурс за избор на директор, бр.02-2101/3 од 08.02.2018 година, избран е Директор на ЈПДП. Работата на Директорот на ЈПДП во текот на 2018 година беше насочена кон реализацијата на Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државни патишта, и грижата за законитоста во работењето и примена на прописите, статутот и другите акти на претпријатието. Директорот работеше спроведувајќи ги одлуките и заклучоците на Управниот одбор на Јавното претпријатие, организираше и раководеше со процесот на работењето на ЈПДП, ја реализираше Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2018 година. Исто така, склучуваше договори за реализација на програмите и други договори за потребите од тековното работење на Јавното претпријатие. Редовно ги вршеше сите останати надлежности утврдени со Статутот на Јавното претпријатие, во насока на обезбедување законитост во работењето и реализација на главните цели и задачи на Јавното претпријатие за државни патишта.

III. ОРГАНОГРАМ НА ЈПДП

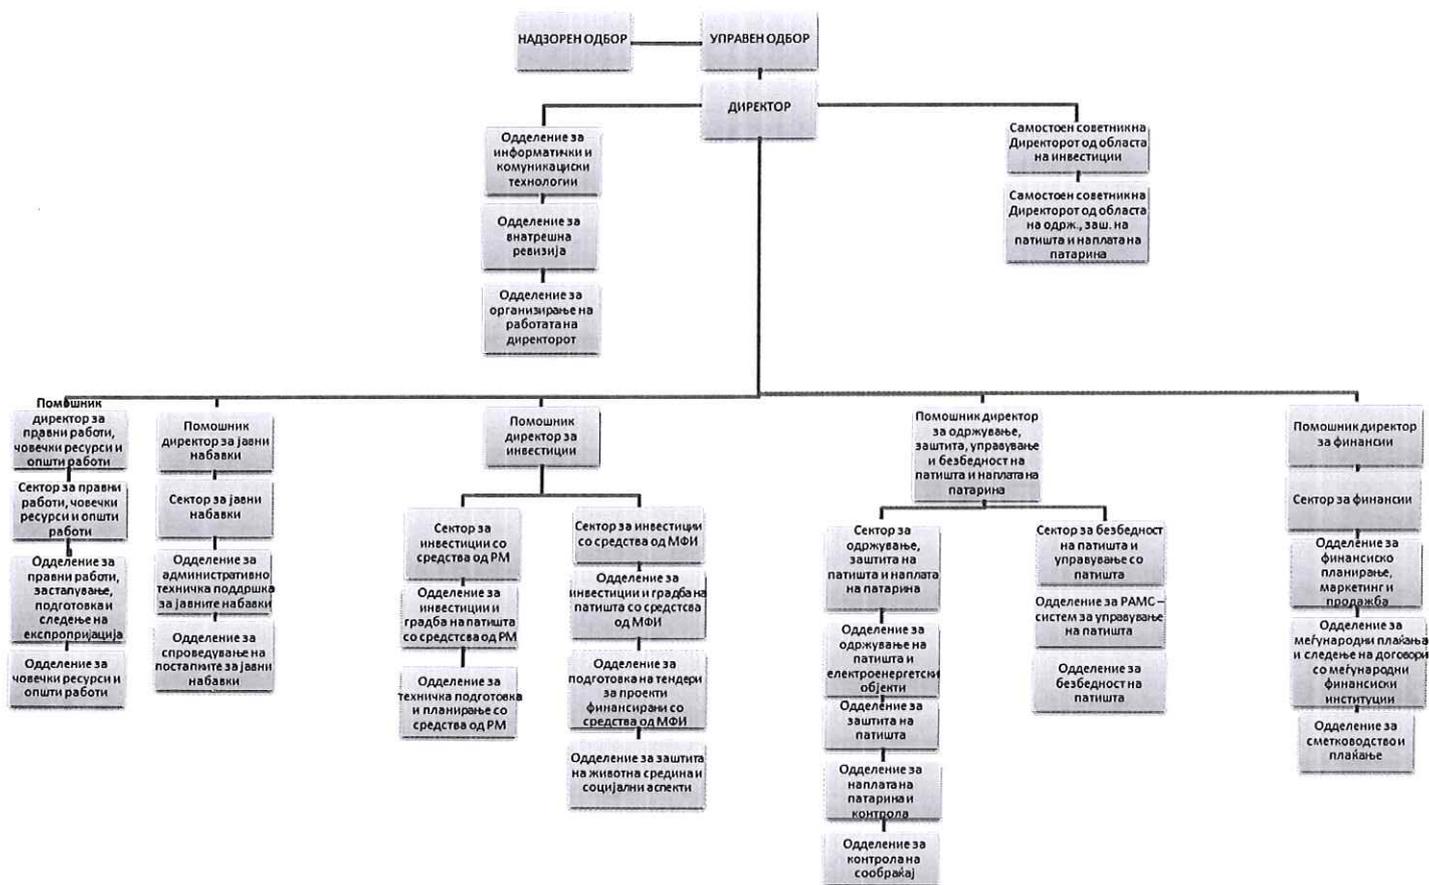

Во рамките на Јавното претпријатие за државни патишта утврдени се:

- 7 посебни работни места и тоа: 5 Помошници директори и 2 самостојни советници на директорот,
- 3 самостојни одделенија, како организациони единици кои не се во рамки на Сектор, туку се под директна надлежност на Директорот на Јавното претпријатие и тоа: Одделение за внатрешна ревизија, Одделение за информатички и комуникациски технологии и Одделение за организирање и поддршка на работата на Директорот
- 7 Сектори, како организациони единици под директна надлежност на Помошник директор и 18 Одделенија во рамките на секторите и тоа:

1. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ
 - 1.1 Одделение за финансиско планирање, маркетинг и продажба
 - 1.2 Одделение за меѓународни плаќања и следење на договори со меѓународни финансиски институции
 - 1.3 Одделение за сметководство и плаќање
2. СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ, ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ОПШТИ РАБОТИ
 - 2.1 Одделение за правни работи, застапување, подготовка и следење на експропријација
 - 2.2 Одделение за човечки ресурси и општи работи
3. СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ
 - 3.1 Одделение за административно-техничка поддршка за јавни набавки
 - 3.2 Одделение за спроведување на постапките за јавни набавки
4. СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИИ СО СРЕДСТВА ОД РМ
 - 4.1 Одделение за инвестиции и градба на патишта со средства од РМ
 - 4.2 Одделение за техничка подготовка и планирање со средства од РМ
5. СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИИ СО СРЕДСТВА ОД МФИ
 - 5.1 Одделение за инвестиции и градба на патишта со средства од МФИ
 - 5.2 Одделение за подготовка на тендери за проекти финансирани со средства од МФИ
 - 5.3 Одделение за заштита на животна средина и социјални аспекти
6. СЕКТОР ЗА ОДРЖУВАЊЕ, ЗАШТИТА НА ПАТИШТА И НАПЛАТА НА ПАТАРИНА
 - 6.1 Одделение за одржување на патишта и електроенергетски објекти
 - 6.2 Одделение за заштита на патишта
 - 6.3 Одделение за наплата на патарина и контрола
 - 6.4 Одделение за контрола на сообраќај
7. СЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПАТИШТА И УПРАВУВАЊЕ СО ПАТИШТАТА
 - 1.1 Одделение за РАМС – систем за управување со патиштата
 - 1.2 Одделение за безбедност на патиштата

Просечниот број на вработени во текот на 2018 година изнесува 427 вработени, а вкупниот број на вработени во Претпријатието на 31 декември 2018 година изнесува 447, од кои 339 вработени на неопределено време и 108 на определено време до 31.12.2018. Во текот на 2018 година, во Јавното претпријатие за државни патишта работен однос засноваа вкупно 108 лица на определено време и 22 лица на неопределено (10 лица превземени од Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор).

Просечната исплатена бруто плата во 2018 година изнесува 45.050 денари, а просечната нето плата 30.336 денари.

Во Јавното претпријатие за државни патишта во 2018 година вкупниот број на влезни/излезни документи изнесува 38.697 од кои: 20.470 се влезни документи, 6.806 се интерни документи и 11.420 се излезни документи.

Приказ на број на влезни/излезни документи во Јавното претпријатие за државни патишта по сектори во 2018 година:

Сектор		Влезни документи	Интерни документи	Излезни документи	Вк.
01	Организација и развој	0	0	1	1
02	Управување и раководење	344	861	313	1518
03	Канцелариско архивски општи и правни работи	5992	1149	3528	10669
04	Човечки ресурси	966	3310	924	5200
05	Финансиско и материјално	3788	127	415	4330
06	Одбрана и безбедност	0	0	0	0
07	АОП	2	0	4	6
08	Јавни набавки	1806	1047	2261	5114
09	Инвестиции	3181	38	904	4123
10	Одржување и заштита на патишта, наплата на патарина и контрола, безбедност и управување на патишта	3949	262	2908	7119
11	Внатрешна ревизија	6	12	5	23
12	ИПА	436	1	157	594

IV. ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Во Годишниот план за извршување на внатрешна ревизија за 2018 година планирани се 3 ревизии и тоа:

- Системска Ревизија на Поставување на визуелни бариери и сигнализација на државни патишта,
- Follow up ревизија на Системска ревизија на ИПА – Компонента III. (Реконструкција и надградба на автопатската делница Смоквица – Гевгелија).
- Ревизија по барање на Директорот, Системска ревизија - Изградба на делница Градско – клучка Дреново како дел од коридоро X-d. (ИРА II)

Планираните ревизии согласно Годишниот План за извршување на внатрешна ревизија се реализирани. Дадените препораки кои произлегуваат од Конечните ревизорски извештај се во тек.

V. ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Финансиските извештаи, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Правилникот за сметководство (Сл.весник на РМ бр. 159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2018 и 2017 година. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

Согласно Законот за трговски друштва и Правилникот за водење сметководство, Јавното претпријатие за државни патишта е должно да води сметководствена евиденција на капиталот, средствата, побарувањата, обврските, приходите, трошоците и да го утврди финансискиот резултат од работењето по Годишната сметка.

ЈП за државни патишта ја состави Годишната сметка и Финансиските извештаи во согласност со законските прописи и општи акти:

- Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ, број 28/04, 84/05, 61/16, 64/18, 120/18);
- Законот за јавни претпријатија (Службен весник на РМ, број 38/96, 6/02, У.бр.175/01 во 19/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16);
- Законот за Централен регистар (Службен весник на РМ), број 50/01, 49/03, 109/05, 88/08 и 35/11);
- Правилник за водење на сметководство (Службен весник на РМ, број 159/09, 164/10 и 107/11);
- Правилник за сметководствен план и содржината на одделни сметки во сметковниот план (Службен весник на РМ број 174/11);
- Правилник за вршење на попис на средствата и обврските и усогласување на сметководствената со фактичката состојба утврдена со пописот 107/11;
- Одлука за донесување на Национална класификација на дејностите НКД Рев.2 (Службен весник на РМ, број 147/08 и 4/13).

Финансиските извештаи се составени врз основа на методот на набавна вредност.

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Претпријатието применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации. Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата,

односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл. Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била заснована проценката или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања. Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека Претпријатието ќе продолжи да работи во догледна иднина. Претпријатието нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Билансот на состојба ја покажува состојбата на средствата и изворите на претпријатието на 31.12.2018 година. Билансот на состојба е статички и кумулативен преглед, кој го набљудува претпријатието во даден момент и ја прикажува состојбата на средствата и изворите кои произлегуваат од сите активности во претпријатието од неговото основање до денот на составување на билансот. Вредностите на ставките во Билансот на состојба се искажани според нивниот износ при набавка на средството, корегирани за промените што настанале во меѓувреме, како резултат на амортизацијата на средствата и отплата на кредитите.

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номиналната вредност. Паричните средства се состојат од денарска и девизна жиро сметка, готовина во благајни и депозити по видување во комерцијалните банки.

Побарувањата за дадени аванси се признаваат во висина на нивната номинална вредност, намалени за исправката за сомнителни и спорни побарувања за аванси и се состојат од дадени аванси на изведувачи заради тековно и инвестиционо одржување.

Залихите се искажуваат според набавната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортни трошоци и други зависни трошоци. Залихите на ситен инвентар се водат по пониската од набавната вредност и нето реализациона вредност. Набавната вредност ја сочинуваат сите направени трошоци за залихите да се доведат во нивната постојната состојба и локација. Нето реализационата вредност е проценета продажна цена во редовен тек на работење намалена за трошоците за нејзино довршување и проценети трошоци.

Авансите за основни средства претставуваат средства дадени на добавувачи за набавка на основни средства и се искажуваат во висина на нивната номинална вредност, намалени за исправката за сомнителни и спорни аванси за основни средства.

Недвижности, постројки и опрема се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

Амортизацијата на основните средства се пресметува врз основа на право-пропорционална метода во текот на проценетиот век на употреба на основните средства. Амортизација на инвестициите во тек не се пресметува се додека средствата во изградба не се активираат.

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање и останати расходи. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Претпријатието има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, пример преку договори за осигурување, надоместувањето се признава како посебно средство, но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен, резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

во илјади денари

БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО претходна година	ОСТВАРЕНО тековна година	Споредбена анализа оств. тек. / оств. претх.	Структурна Анализа Тековна година
АКТИВА				
Парични средства	2,575,701	3,036,904	1.18	3.22
Побарувања	20,818	334,582	16.07	0.35
Залихи	1,395	1,371	0.98	0.00
Краткорочни финансиски средства	0	0	-	0.00
Други тековни средства (АВР)	23,315	31,233	1.34	0.03
Тековна актива	2,621,229	3,404,090	1.30	3.61
Материјални средства и вложувања во недвижности	81,988,952	90,880,686	1.11	96.30
Долгорочни финансиски вложувања	0	0	-	0.00
Нематеријални средства	28,081	23,014	0.82	0.02
Долгорочни финансиски средства	76,852	62,895	0.82	0.07
Нетекковна актива	82,093,885	90,966,595	1.11	96.39
Вкупна актива	84,715,114	94,370,685	1.11	100.00
Вонбилансна актива	0	0	-	0.00
Краткорочни обврски	3,525,690	5,716,206	1.62	6.06
Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	1,039,585	1,083,465	1.04	1.15
Тековни обврски	4,565,275	6,799,671	1.49	7.21
Долгорочни обврски	30,085,630	35,003,070	1.16	37.09
Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	132,442	136,919	1.03	0.15
Нетекковни обврски	30,218,072	35,139,989	1.16	37.24
Вкупно обврски	34,783,347	41,939,660	1.21	44.44
Капитал	5,000	5,000	1.00	0.01
Акумулирана добивка	32,883,817	34,951,434	1.06	37.04
Резерви	2,067,617	5,178,880	2.50	5.49
Ревалоризациони резерви	9,796,453	9,796,453	1.00	10.38
Добивка/ Загуба за деловната година	5,178,880	2,499,258	0.48	2.65

Вкупен капитал	49,931,767	52,431,025	1.05	55.56
ПАСИВА				
Вкупно обврски и капитал	84,715,114	94,370,685	1.11	100.00
Вонбилансна пасива	0	0	-	0.00

Вкупната актива/пасива во Билансот на состојба во 2018 година изнесува 94.370.685.211 денар. Во однос на претходната 2017, кога изнесувала 84.715.113.821 денар, бележи зголемување од 11%. Во активата најголемо зголемување, согласно структурната и споредбената анализа, има во материјалните средства и вложувања во недвижности т.е инвестициите во тек. Додека во пасивата, зголемувањето е најголемо кај долгорочните обврски т.е. обврските по заеми и кредити и кај вкупниот капитал на претпријатието.

2. БИЛАНС НА УСПЕХ

Билансот на успех ги покажува вкупно остварените приходи и расходи од работењето на ЈПДП за 2018 година, и финансискиот резултат за истата година.

во илјади денари

БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВАРЕНО претходна година	ПЛАНИРАНО тековна година	ОСТВАРЕНО тековна година	Спор. анал. тек. / претх.	Спор. анал. оств. / план.	Структ. анал. тек. год.
Приходи од продажба	3,896,919	4,073,000	4,074,292	1.05	1.00	57.55
Останати оперативни приходи	2,566,656	2,815,000	3,005,208	1.17	1.07	42.45
Вкупно оперативни приходи	6,463,575	6,888,000	7,079,500	1.10	1.03	100.00
Потрошени сировини, материјали и енергија	44,173	71,000	61,043	1.38	0.86	1.76
Трошоци за вработените	210,963	260,000	259,910	1.23	1.00	7.49
Амортизација на материјални средства	1,590,146	1,550,000	1,680,553	1.06	1.08	48.45
Вредносно усогласување на тековни средства	0	30,000	27,530	0.00	0.92	0.79
Останати оперативни расходи	1,491,322	1,493,000	1,439,882	0.97	0.96	41.51
Вкупно оперативни расходи	3,336,604	3,404,000	3,468,918	1.04	1.02	100.00
Добивка од оперативно работење	3,126,971	3,484,000	3,610,582	1.15	1.04	0.00

Приходи од финансирање	2,533,722	355,000	574,291	0.23	1.62	0.00
Расходи од финансирање	134,834	578,400	1,685,615	12.50	2.91	0.00
Добивка пред оданочување	5,525,859	3,260,600	2,499,258	0.45	0.77	0.00
Данок на добивка	346,979	0	0	0.00	0.00	0.00
Нето добивка / загуба	5,178,880	3,260,600	2,499,258	0.48	0.77	0.00

Во првиот дел од Билансот на успех се содржани оперативните приходи, кои изнесуваат 7.079.500.190 денари, и оперативните или општите трошоци, кои изнесуваат 3.468.918.135 денари. Нивната разлика ја дава оперативната добивка или добивка од работењето, која за тековната година изнесува 3.610.582.055 денари. Оперативната добивка е во рамките на планираната за 2018 година и истата е поголема од 2017 година за 15% кога изнесувала 3.126.971.841 денар.

Во вториот дел ставките во најголема мера се од екстерна природа и на нив претпријатието речиси и не може да влијае. Со дејство на овие ставки се добива нето добивката. Како показател за успешноста на работењето во анализите претставува оперативната добивка, за разлика од нето добивката на која влијаат ставки како што се каматите, кусните разлики и сл. Добивката пред оданочување за 2018 година изнесува 2.449.257.805 денари, и истата е помала од 2017 година кога изнесувала 5.525.859.490 денари. Истата е помала токму поради влијанието на позитивните и негативните курсни разлики.

Нето добивката за 2018 година, изнесува 2.499.257.805 денари. Нето добивката е иста со добивката пред оданочување за 2018 година, бидејќи вишокот на средства остварени со работењето на ЈПДП со Одлука од Управниот Одбор на ЈПДП ќе се употреби за инвестициски вложувања потребни за реализација на Годишната програма за 2019 година, односно добивката ќе се реинвестира.

3. СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ

Приходите се признаваат доколку е веројатно дека идните економски користи ќе бидат прилив за Претпријатието и доколку овие користи може веродостојно да се измерат. Приходите на Претпријатието се економски користи кои настануваат во текот на разгледуваниот период, кои произлегуваат од редовните активности на истото.


Приходите на Претпријатието произлегуваат од надоместоците утврдени со Законот за јавни патишта.

СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВАРЕНО претходна година	ПЛАНИРАНО тековна година	ОСТВАРЕНО тековна година	Спор. анал. тек. / оств. претх.	Спор. анал. оств. / план.	Структ. анал. тек. год.
Приходи од дејноста						
Приходи регистрација	1,491,657,146	1,578,000,000	1,556,561,286	1.04	0.99	20.34
Приходи патарина	2,381,824,609	2,750,000,000	2,494,200,560	1.05	0.91	32.59
Приходи од вонреден превоз	18,831,437	20,000,000	20,582,238	1.09	1.03	0.27
Приход од рекламни табли, инсталации, пристапен пат, прекоп и друго	4,606,159	8,000,000	2,948,091	0.64	0.37	0.04
Приходи од акциза	2,542,060,643	2,800,000,000	2,979,885,411	1.17	1.06	38.93
Останати приходи од работењето	24,595,487	15,000,000	25,322,604	1.03	1.69	0.33
Вкупни оперативни приходи	6,463,575,481	7,171,000,000	7,079,500,190	1.10	0.98	92.50
Останати приходи						
Позитивни курсни разлики	2,529,961,987	0	566,741,325	0.22	0	7.40
Приходи од	3,759,689	0	7,549,398	2.01	0	0.10

камати						
Вкупно останати приходи	2,533,721,676	0	574,290,723	0.23	0	7.50
Вкупно приходи	8,997,297,157	7,171,000,000	7,653,790,913	0.85	1.06	100.00

Во 2018 година ЈП за државни патишта оствари приходи во вкупен износ од 7.653.790.913 денари. Вкупните приходи во претходната година изнесуваат 8.997.297.157 денари. Намалувањето на вкупните приходи се должи најмногу поради намалување на финансиските приходи, кои се однесуваат во најголем дел на пресметаните позитивни курсни разлики 2018 година.

Графички приказ на приходите остварени во 2018 година споредбено со 2017 година:

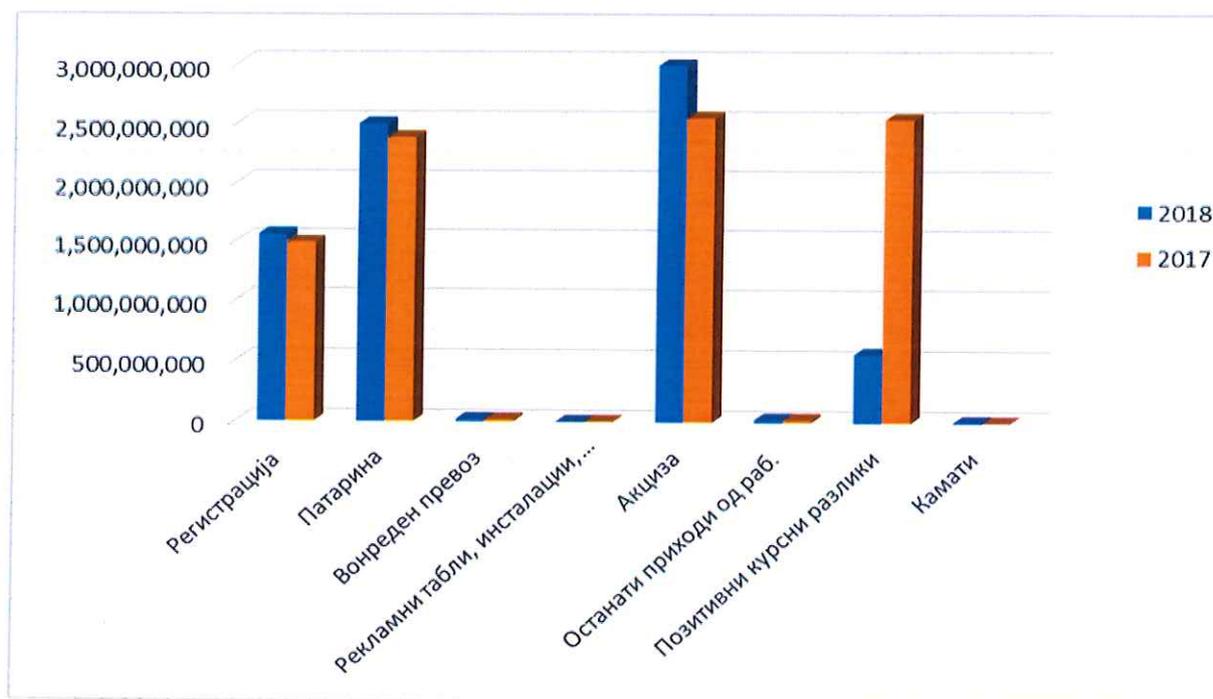

Оперативните приходи за 2018 година изнесуваат 7.079.500.190 денари, и истите се во рамките на планираното. Оперативните приходи во претходната 2017 година изнесуваат 6.463.575.481 денари и истите во 2018 година бележат зголемување за 10%. Најголемо зголемување согласно структурната анализа и споредбената анализа во дадена во табелата бр.3 претпријатието бележи кај приходите од регистрација, приходите од патарина и приходите од акциза.

Согласно Законот за јавни патишта, тука спаѓаат: надоместокот за употреба на јавен пат, негов дел или објект на патот (патарина), надоместокот за употреба на

јавните патишта за моторни и приклучки возила (патна такса) што се плаќа при регистрација на возилата, и други приходи кои произлегуваат од работењето.

Висината на надоместокот за употреба на јавните патишта за моторни и приклучни возила (патна такса) што се плаќа при регистрација на возилата, еднаш годишно, се определува во зависност од влијанието на возилото врз оштетувањето на патот. Во 2018 година од овој надоместок, оставрен е приход во износ од 1.556.561.286 денари. Остварениот износ е во рамките на планираното и истиот е поголем за 4% во однос на претходната година. Од приходот од надоместокот за употреба на јавните патишта за моторни и приклучни возила – патна такса, се врши одлив на средства на имателите на моторни и приклучни возила со кои се врши меѓународен сообраќај. Согласно Одлуката за висината и начинот на плаќање на надоместокот за употреба на јавните патишта за моторните и приклучните возила (патна такса), се утврдува правото за враќање на дел од уплатениот износ сразмерно на времето што моторните и приклучните возила го поминале надвор од Република Македонија.

Висината на надоместокот за употреба на јавен пат, негов дел или објект на патот (патарина) е определена во зависност од должината на делницата на која се наплаќа надоместокот и од категоријата на возилата. Во 2018 година овој приход изнесува 2.494.200.560 денари и истиот е за 5% поголем во однос на претходната година. Ова зголемување се должи на повеќе превземени активности. Поставени се комплетно нови кабини на целиот коридор 8 (32 кабини) со најсовремена технологија и системи за ладење и греење, на коридорот 10 конкретно на наплатните Станици Романовце, Сопот, Отовица и Петровец направени се од почеток со поставување на нови кабини и изградба на нови управни згради. На сите овие наплатни Станици поставен е систем кој подржува електронска наплата на патарина, поставена е најсовремена технологија и системи за ладење и греење. Вработените на наплатните Станици добија нови униформи за работа. Сите овие активности овозможија изворедни услови за работа на вработените на Наплатните Станици. Контролната служба кој е дел од наплатната служба го санкционираше секое прекршување на правилникот за работа на Јавното Претпријатие, имено покренати се 51 дисциплински постапки во тековната 2018 година против вработени во наплатната служба. Со ваквото професионално работење Контролната служба допринесе за рекордно остварениот приход во 2018 година.


Во други приходи од работењето влегуваат разни надоместоци што се плаќаат на магистралните и регионалните патишта, како што се надоместокот за поставување на натписи и рекламни табли во заштитниот појас на државен пат, приклучување на пристапен пат на државен пат, поставување на инсталации во трупот на патот и патниот појас на државен пат, изградба и користење на

комерцијални објекти на кој е дозволен пристап на јавен пат надвор од населено место, за прекумерно користење на државен пат, за вонреден превоз и за штета на државен пат и на објектите на патот.

Делот од акцизата од дериватите од нафта, за финансирање на Програмата за патишта во 2018 година, изнесуваат 2.979.885.411 денар и е поголема во однос на планот за 6,42%. Согласно Законот за јавните патишта овие средства се трансферираат од Буџетот на Република Македонија на сметка на Јавното претпријатие најмалку четири пати годишно, во интервали од најмалку три календарски месеци.

Останатите приходи за 2018 година изнесуваат 574.290.723 денари. Во останати приходи влегуваат позитивните курсни разлики и приходите од камати. Приходите од камати се признаваат за временскиот период за кој истите се однесуваат. Овие приходи се помали од претходната година и истите во најголема мера се од екстерна природа, и поради тоа претпријатието тешко може да ги испланира и да влијае на нивната реализација.

Графички приказ: Учеството на поединечните приходи во вкупно остварените приходи за 2018 година

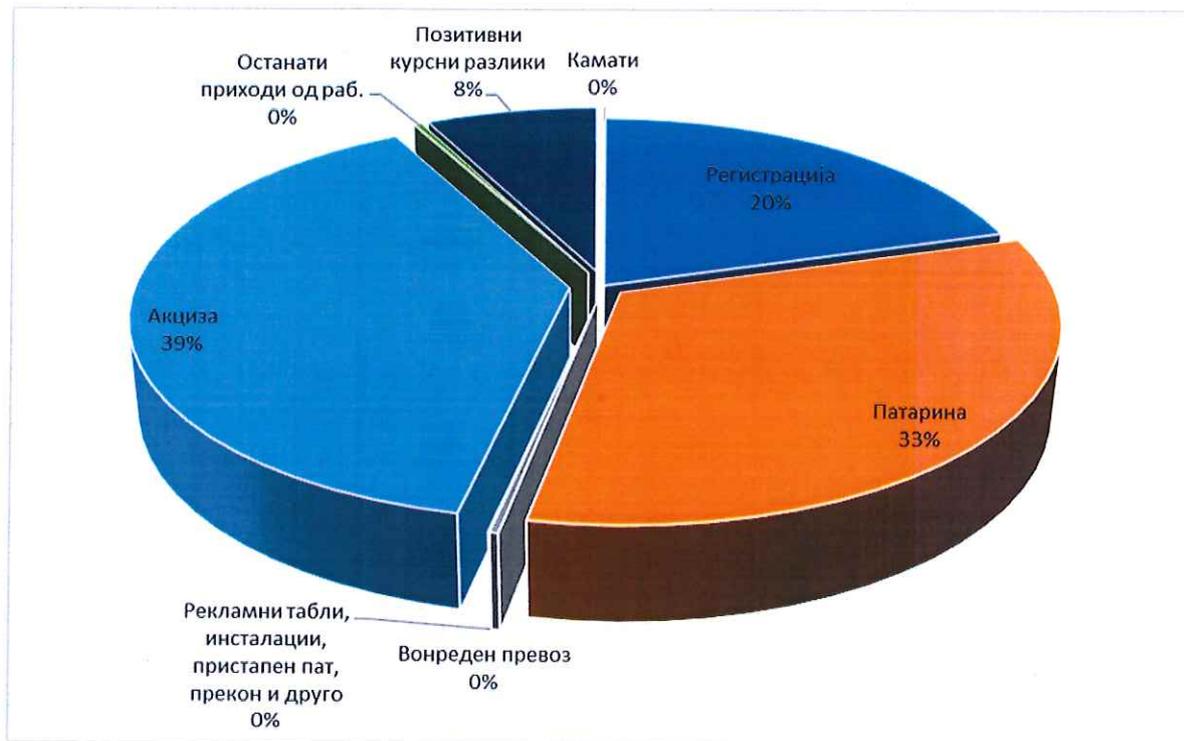

4. СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ


Расходите се признаваат во билансот на успех кога се јавува намалување на идните економски користи поврзано со намалување на дадено средство или зголемување на дадена обврска кое може веродостојно да се измери. Расходите се признаваат врз основа на нивната директна поврзаност помеѓу направените трошоци и заработувањето на конкретните приходи.

СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВАРЕНО претходна година	ПЛАНИРАНО тековна година	ОСТВАРЕНО тековна година	Спор. анал. тек. / претх.	Спор. анал. оств. / план.	Структ. анал. тек. год.
Расходи од дејноста						
Трошоци за потрошен материјал, ситен инвентар и гориво	10,919,244	21,000,000	10,101,083	0.93	0.48	0.20
Трошоци за енергија	33,253,480	50,000,000	50,941,858	1.53	1.02	0.99
Плата, надоместоци за плата и останати трошоци за вработените	210,962,681	260,000,000	259,909,629	1.23	1.00	5.04
Амортизација	1,590,146,421	1,550,000,000	1,680,552,699	1.06	1.08	32.60
Вредносно усогласување		30,000,000	27,530,401	0.00	0.92	0.53
Трошоци за одржување на објекти и патишта	925,387,366	845,000,000	808,997,478	0.87	0.96	15.69
Комунални и други услуги	156,513,416	225,000,000	204,868,320	1.31	0.91	3.97
Провизија за здруженија за технички преглед	64,498,021	66,000,000	68,279,806	1.06	1.03	1.32
Трансфери до ЕЛС	300,000,000	300,000,000	300,000,000	1.00	1.00	5.82
Банкарски трошоци	29,270,837	28,000,000	31,494,465	1.08	1.12	0.61
Други трошоци од работењето	15,652,174	29,000,000	26,242,396	1.68	0.90	0.51


Вкупно оперативни расходи	3,336,603,640	3,404,000,000	3,468,918,135	1.04	1.02	67.30
Останати раходи						
Камата по кредити	83,341,643	80,400,000	74,044,406	0.89	0.92	1.44
Негативни курски разлика	51,492,384	498,000,000	1,611,570,567	31.30	3.24	31.27
Вкупно останати расходи	134,834,027	578,400,000	1,685,614,973	12.50	2.91	32.70
Вкупно расходи	3,471,437,667	3,982,400,000	5,154,533,108	1.48	1.29	100.00

Во 2018 година ЈП за државни патишта оствари расходи во вкупен износ од 5.154.533.108 денари. Во претходната 2017 година вкупните расходи изнесуваат 3.471.437.667 денари. Зголемувањето на вкупните расходи во 2018 година во однос на претходната се должи најмногу поради зголемени негативни курсни разлики.

Графички приказ: Остварени расходи во однос на планирани расходи за 2018 година

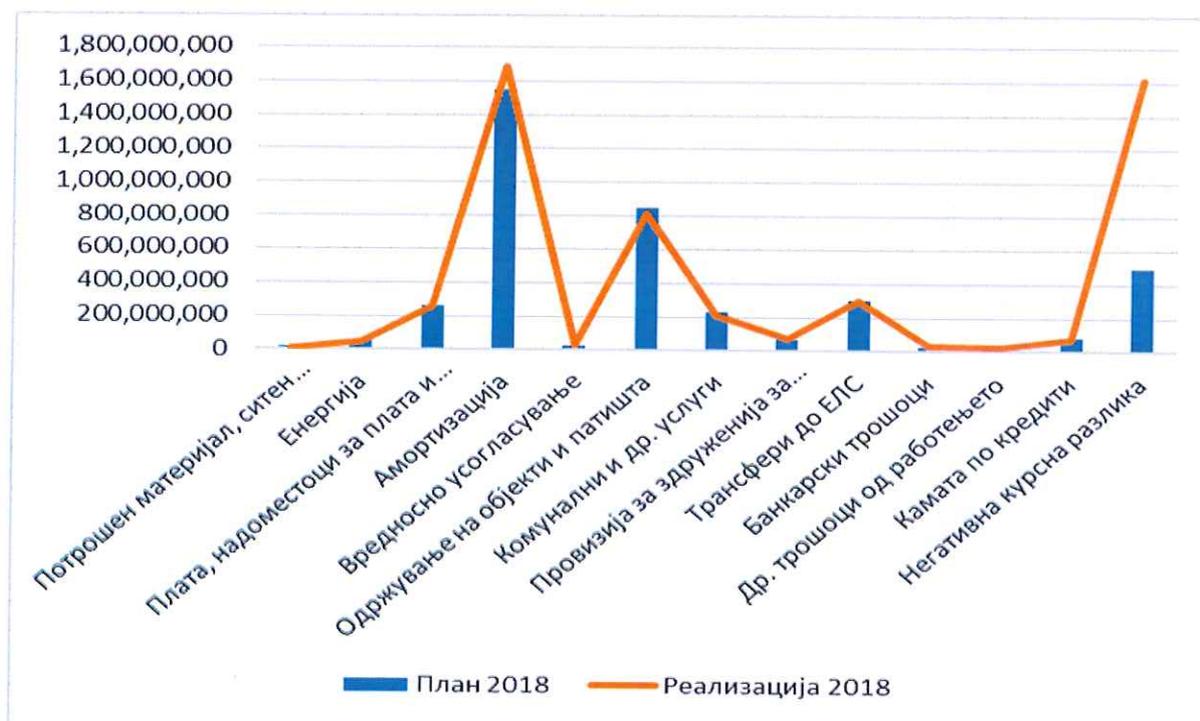

Графички приказ: Остварени расходи за 2018 година во однос на истите расходите за 2017 година

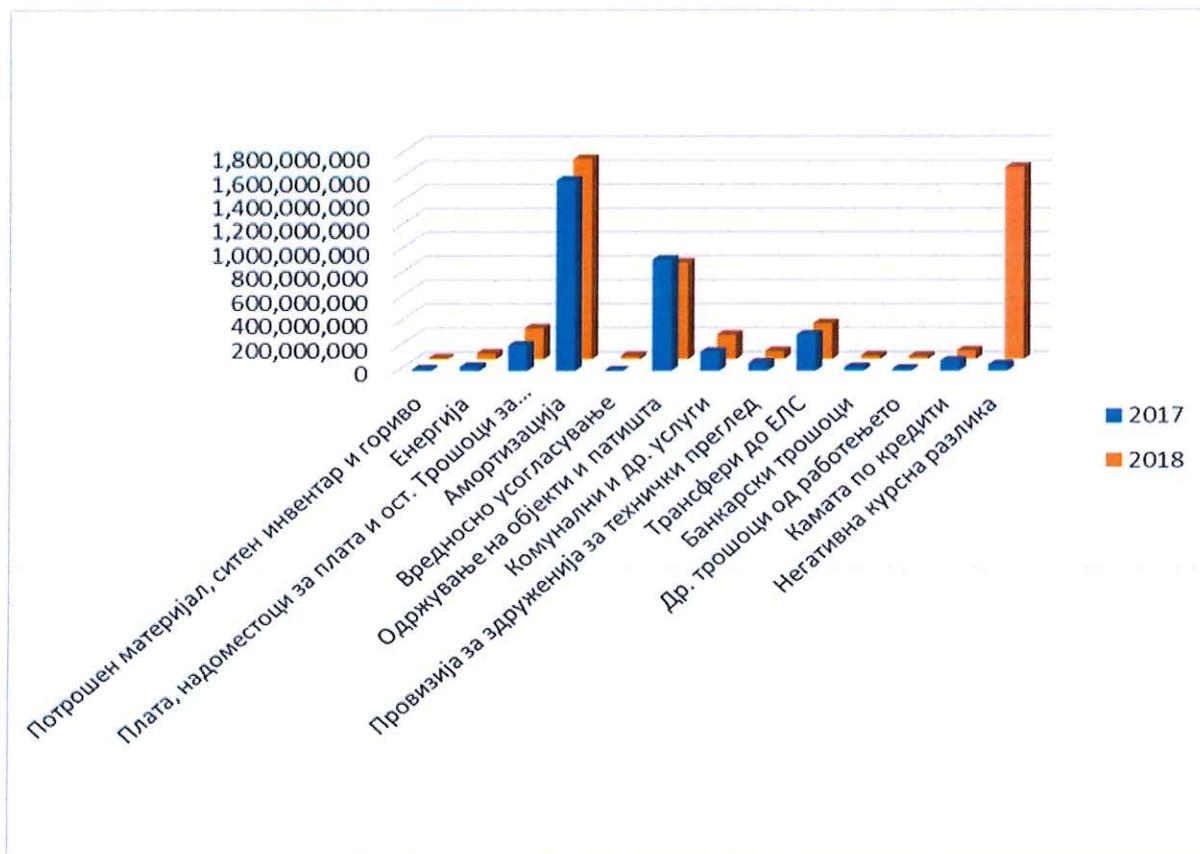

Оперативните расходи за 2018 година изнесуваат 3.468.918.135 денари, и истите се во рамките на планираното. Оперативните расходи во 2017 година изнесуваат 3.336.603.640 денари и истите во 2018 година бележат зголемување за незначителни 4% однос на претходната година.

За потрошен материјал, ситен инвентар и гориво потрошени се 10.101.083 денари. Тука влегуваат канцелариски материјали, тонери, ролни за фискални печатари, парагон билети за патарините, средства за хигиена, ХТЗ опрема и сл.

За енергија во 2018 година трошоците изнесуваат 50.941.858 денари. Тука спаѓаат приклучоците на дистрибутивна мрежа за објекти на патот, користење на дистрибутивен систем за електрична енергија и потрошена електрична енергија за осветлување на државните патишта, клучките и објектите и за гориво.

За плата, надоместоци за плата и останати трошоци за вработените потрошени се средства во износ од 259.909.629 денари, што е во согласност со планираното за 2018 година. Зголемувањето на трошоците во однос на претходната година е поради зголемен број на вработени кој во 2017 година изнесувал 391, додека во 2018 година изнесува 427.

Трошокот за амортизација во 2018 година изнесува 1.680.552.699 денари, додека истиот трошок во 2017 година изнесува 1.590.146.421 денар што процентуално нема значително отстапување во однос на планираното и оствареното во претходната година.

Вредносното усогласување во 2018 година изнесува 27.530.401 денар, додека во 2017 година не е пресметан ваков трошок поради тоа што претпријатието немало сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската.

Трошоците за одржување на објекти и патишта во 2018 година изнесуваат 808.997.478 денари, истите се во рамките на планираните трошоци и се помали во однос на претходната година. Најголем дел од овие трошоци се однесуваат за тековното одржување на патиштата, за што ЈПДП има склучено договор со ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта Македонијапат и истите изнесуваат 767.798.778 денари. Остатокот од овие трошоци се: одржување на зградите и објектите на ЈПДП, одржување на електроенергетски објекти, одржување на автоматски стоп рампи, одржување на хардверот и софтверот на ЈПДП, одржување на лифтови, копири, принтери, систем за ладење и греење, телефонска централа, одржување комуникациска опрема на наплатните станици, одржување на возилата, одржување на агрегати, одржување на хигиената на објектите на ЈПДП, трошоци за чистење на патни канавки и канали на патиштата, косење трева, расчистување на грмушки, кастрење гранки и сечење дрва во патен појас на автопат и слични трошоци за одржување.

Комуналните и другите услуги во 2018 година изнесуваат 204.868.320 денари, и истите бележат зголемување во однос на претходната година. Зголемувањето се должи на склучени нови договори за РАМС Софтвер, мерење на патиштата и консултански услуги за софтверот, консултантски услуги за проектна документација како детален дизајн на мерки за санација на безбедноста на патиштата за ЈПДП и склучен договор за Оптичко комуникациско поврзување и Интернет симетричен пристап во административната зграда на ЈПДП и во Контролен центар во Неготино вклучувајќи го и кол центарот. Во овие трошоци влегуваат и поштенските услуги, трошоци за снабдување со вода, воден

надоместок и одводнување, за смет, парно греење, паркинг услуги, патарина и регистрација на возила, дератизација и дезинфекција, услуги за прочистување на отпадни и атмосферски води, трошоци за огласи, весници и списанија, трошоци за истражувања и изработка на елаборати, трошоци за надзор, обезбедување на наплатните станици и др. слични услуги.

За провизија за извршена услуга од здруженијата за технички преглед согласно склучени договори потрошени се 68.279.806 денари. Во однос на претходната година истата е зголемена, сразмерно на зголемениот приход од регистрација. Имено здруженија за технички преглед согласно склучените договори со ЈПДП за извршената услуга што ја даваат при регистрација на возилата наплатуваат провизија од 3,5%.

За трансфери до ЕЛС трошоците во 2018 година изнесуваат 300.000.000 денари, согласно планираното. Средствата од овие трансфери до Единиците на локалната самоуправа се наменети за изградба, реконструкција и одржување на локалните патишта и улици.


Банкарските трошоци во 2018 година изнесуваат 31.494.465 денари. Овие трошоци бележат зголемување во однос на претходната година како резултат на зголемениот приход од патарина.

Другите трошоците од работењето во 2018 година изнесуваат 26.242.396 денари. Истите се зголемени во однос на претходната година поради судски пресуди за настанати штети на патот и други основи. Тука влегуваат надоместоците на членовите за Управен одбор и Надзорен одбор, трошоци за репрезентација, трошоци за осигурување на објекти и возила, административни и судски такси, авторски хонорари, сметководствени услуги, ревизија, судски вештачења, трошоци за лиценци и сертификати, адвокатски и нотарски услуги, трошоци по судски извршни надоместоци на штети на други друштва и физички лица.

Останатите расходи за 2018 година изнесуваат 1.685.614.973 денари. Во останати расходи влегуваат негативните курсни разлики и каматите по кредити. Вкупно останатите расходи бележат зголемување во однос на претходната година поради пресметаните негативни курсни разлики. Имено, Претпријатието ја води својата сметководствена евиденција и известува во денари. Трансакциите во странска валута се евидентираат по важечкиот курс на странската валута на денот на трансакцијата. Извршена е пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата. Позитивните и негативните курсни

разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи или расходи од финансирање. Најголем број од трансакциите на Претпријатието се во ЕУР и УСД. Средниот курс на Еврото на 31.12.2018 година изнесува 61,4950 МКД, додека во 2017 изнесува 61,4907, а средниот курс на Доларот бележи зголемување во однос на курсот на крајот од претходната година и тоа 53,6887 МКД во 2018 и 51,2722 МКД во 2017 година.

Графички приказ: Учество на поединечните расходи во вкупните остварените расходи за 2018 година

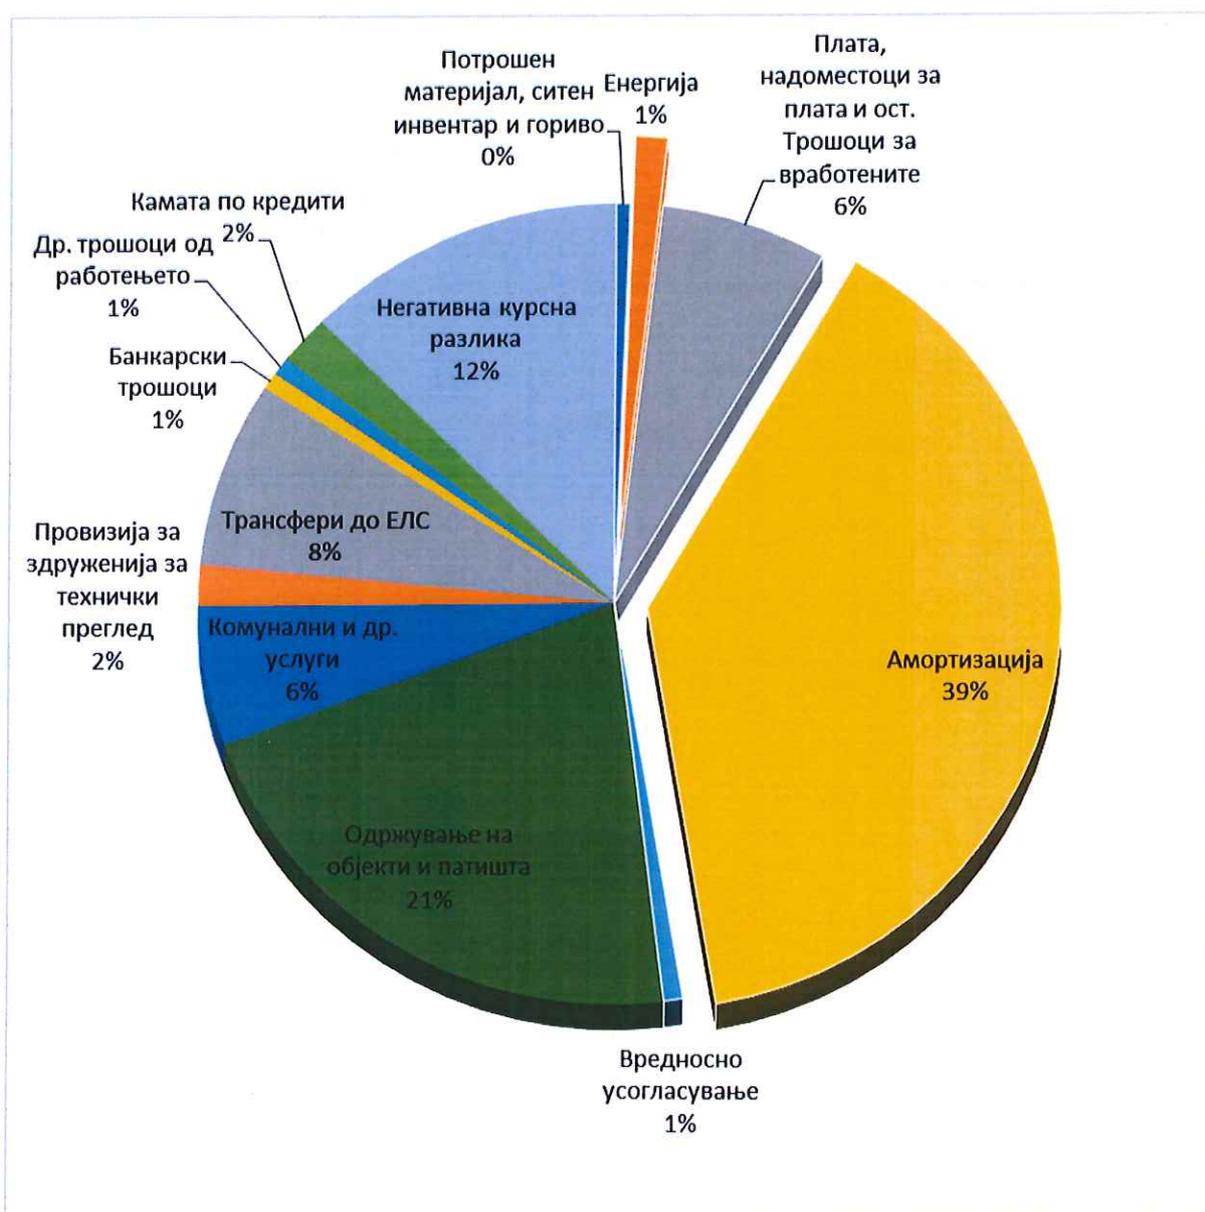

5. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА

Во овој дел од финансиското известување се претставени состојбата на поединечните материјалните и нематеријалните средства на претпријатието, споредбата на нивната состојба со претходната година, како и амортизацијата на секое поединечно средство со амортизацијата од претходната година.

СПЕЦИФ. НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТ. МАТЕР. СРЕДСТВА	СОСТОЈБА претх. год.	АМОРТИЗ. претх. год.	СОСТОЈБА тек. год.	АМОРТИЗ. тек. год.	Пром. осн. с- ва	Пром. аморт.
Имот, машини и опрема	99,988,186,566	55,888,107,806	101,735,776,535	57,554,505,442	1.02	1.03
Возила	45,742,054	42,096,049	45,742,054	43,107,949	1.00	1.02
Мебел и вградување на мебел	6,749,582	5,407,961	6,006,208	4,778,599	0.89	0.88
Материјалн и средства во подготовка	33,634,803,450	0	43,377,338,230	0	1.29	0
Аванси за набавка на материјални средства	4,246,449,510	0	3,317,212,539	0	0.78	0
Останати материјални основни средства	11,929,992	9,296,869	11,348,014	10,345,235	0.95	1.11
Вкупно матер. средства	137,933,861,154	55,944,908,685	148,493,423,580	57,612,737,225	1.08	1.03
НЕМАТ. СРЕДСТВА						

Дадени аванси	0	0	0	0	0	0
Права	0	0	0	0	0	0
Гудвил	0	0	0	0	0	0
Трошоци за истражување и развој	0	0	0	0	0	0
Други нематеријални средства	38,097,967	10,017,083	42,146,009	19,131,527	1.11	1.91
Вкупно нематеријални средства	38,097,967	10,017,083	42,146,009	19,131,527	1.11	1.91
Вкупно средства	137,971,959,121	55,954,925,768	148,535,569,589	57,631,868,752	1.08	1.03

Вкупните средства во 2018 година изнесуваат 148.535.569.589 денари. Во споредба со претходната година истите покажуваат зголемување од 8%. Во најголем дел, зголемувањето во однос на 2017 година се должи на зголемени материјални средства во подготовка и тоа за цели 29%.

Акумулираната амортизација во 2018 година изнесува 57.631.868.752 денари. Во споредба со претходната година, исто така покажува зголемување, како резултат на зголемен износ на вкупните средства.

6. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ

Во овој дел од извештајот прикажани се долгорочните кредити на јавното претпријатие, износот на основицата на секој кредит, каматната стапка, времетраењето на кредитот, вкупно исплатениот износ и износот што преостанува да се исплати.

	6. Преглед на кредити	Износ на основица	Камат на стапка	Износ на 6-месечен ануитет	Вкупно исплатено до 31.12.2018	Преостанат долг	Времетраење (од - до, Вк. Години)
1	Краткорочни кредити						
	Вкупно краткорочни кредити	0	0	0	0	0	0
	Долгорочни кредити						
2	Патишта II ЕИБ - Луксембург	€ 60,000,000	3.62	1,752,266	40,725,078	19,274,922	15.11.2006-15.05.2024
3	ТТФСЕ II - Светска банка	€ 14,670,375	Либор	610,240	7,957,731	6,712,644	15.12.2012-15.06.2024
4	Регионални и локални патишта Светска банка	€ 69,124,920	Либор	2,390,417	23,638,427	45,486,493	15.09.2013-15.03.2028
5	*Проект за рехабил. на магистрални и регионални и патишта - Светска б.	€ 52,000,000	Либор	1,529,412	0	34,921,630	15.10.2020-15.04.2037
6	*Проект за подобрување и развој на патишта - Светска банка	€ 83,000,000	Либор	2,075,000	0	13,479,689	15.11.2023-15.05.2043
7	Регионални и локални	€ 50,000,000	Либор +1	2,718,960	25,529,360	24,470,640	15.12.2012-15.06.2023

	патишта ЕБОР						
8	*Коридор Х - патарини ЕБОР	€ 15,880,000	Либор +1	721,818	1,550,379	6,649,621	20.10.2015- 20.04.2026
9	*Програма за националн и патишта ЕБОР	€ 181,000,000	Либор +1	7,240,000	1,596,000	28,667,000	20.02.2018 - 20.02.2030
10	*Патна делница Штип- Радовиш ЕБОР	€ 64,000,000	Либор +1	2,909,091	0	10,640,000	15.03.2020- 15.09.2030
	Вкупно долгорочн и кредити (2+3+4+5+6 +7+8+9+10) ЕУР	€ 589,675,295		€ 21,947,203	€ 100,996,975	€ 190,302,640	
11	*Кичево- Охрид	\$505,044,967	2	9,962,521	0	\$287,666,643	21.07.2019- 21.01.2034
12	Миладино вци-Штип	\$278,374,072	2	7,123,321	0	\$182,911,924	21.07.2019- 21.01.2034
	Вкупно долгорочн и кредити (11+12) УСД	\$783,419,039		\$17,085,842	0	\$470,578,567	0

Забелешка: Кредитите означени со (*) се во фаза на имплементација и сеуште се повлекуваат средства од истите а кај некои од нив започната е и отплатата на повлечениот дел од кредитот.

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Вкупниот капитал на Претпријатието заклучно со 31 декември 2018 година е во износ од 52.431.024.878 денари. Промените во капиталот заклучно со 31 декември 2012 година се состојат од ревалоризациони резерви кои се пресметуваа за недвижностите, постројките и опремата заклучно со 31 декември 2012 година и остварена добивка. На 01.01.2013 година со трансформацијата на „Агенцијата“ во „Јавно претпријатие за државни патишта“ се изврши корекција на капиталот, односно основната главнина со состојба на 31 декември 2018 година изнесува 5.000.000 денари и се состои од паричен влог. Средствата се земени од салдото на сметката на Агенцијата за државни патишта во рамките на трезорската сметка и се дел од салдото на денот на отворањето на сметката на ЈП за државни патишта. Овој капитал е упишан во Централниот регистар на РМ.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ	ОСТВАРЕНО претходна година	ОСТВАРЕНО тековна година	Според. анал. оств. тек. / оств. претх. (%)	Структ. Анал. Тек. год. (%)
Нераспределена добивка на почетокот на периодот	32,883,816,643	34,951,433,935	1.06	66.66
Основачки влог	5,000,000	5,000,000		0.01
Нето добивка/загуба за деловната година	5,178,880,138	2,499,257,805	0.48	4.77
Резерви	2,067,617,292	5,178,880,138	2.50	9.88
Ревалоризациони резерви	9,796,453,000	9,796,453,000	1.00	18.68
Дивиденда				0.00
Вкупен капитал	49,931,767,073	52,431,024,878	1.05	100.00
Нераспределена добивка на крајот на периодот	34,951,433,935	40,130,314,073	1.15	/

Од дадената табела може да се види дека вкупниот капитал во 2018 година изнесува 52.431.024.878 денари, и истиот е зголемен за 5% во однос на претходната година кога изнесувал 49.931.767.073 денари.

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Извештајот за паричните текови ни ја дава целосната претстава за тековите на готовите пари во претпријатието, односно на едно место ни прикажува по кои основи претпријатието остварило готовински приливи во текот на 2018 година, а по кои основи се направени готовински одливи во истата година.

Извештајот за паричен тек е изготвен врз основа на директниот метод за пресметка на нето зголемувањето/намалувањето на паричните средства.

по месеци, во илјади денари

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	2017	2018	промена 2018/2017
Парични примања од надоместоци	6,417,197	7,022,729	1.09
Парични примања од останати оперативни активности	20,734	25,791	1.24
Исплати на добавувачи за трошоци за основна дејност	-1,197,244	-1,067,799	0.89
Исплати за плати и надоместоци на плати	-210,332	-259,361	1.23
Исплати за останати оперативни расходи	-278,898	-404,712	1.45
Платен данок од добивка	-377,428	-480,426	1.27
Примени камати	3,759	7,549	2.01
Парични средства од оперативни активности	4,377,788	4,843,771	1.11
Дадени/наплатени заеми на други	13,880	13,907	1.00
Набавки на нематеријални средства	-24,312	-4,048	0.17
Набавки на недвижности, постројки и опрема	-6,918,016	-10,821,961	1.56
Дадени/оправдани аванси за основни средства, нето	1,299,103	929,237	0.72
Парични средства од инвестиции	-5,629,345	-9,882,865	1.76
Платени камати на кредити	-83,342	-74,044	0.89
Примени (отплатени) долгорочни кредити, нето	3,298,935	6,891,775	2.09
Отплатени кредити	-1,456,060	-1,317,434	0.90
Парични средства од финансиски активности	1,759,533	5,500,297	3.13
Нето зголемување / намалување на паричните текови	507,976	461,203	0.91
Парични средства на почетокот на периодот	2,067,725	2,575,701	1.25
Парични средства на крајот на периодот	2,575,701	3,036,904	1.18

Во 2018 година од паричниот тек може да се види дека претпријатието има нето зголемување на паричните текови во износ од 461.203.138 денари. Претпријатието од оперативни активности прикажува готовински приливи и истите изнесуваат 4.843.771.832 денари. Додека, готовински одливи претпријатието најмногу покажува во инвестициските (вложувачки) активности и тоа 9.882.865.592 денари.

9. ПРЕГЛЕД НА ГОДИШНИ ПОДАТОЦИ

Во овој дел од извештајот, во табела ќе бидат прикажани ставките од билансите и извештаите кои се битни за претпријатието и нивната споредба во однос на намалувањето/зголемувањето со претходната година.

во илјади денари

ПРЕГЛЕД НА ГОДИШНИ ПОДАТОЦИ	Реализација 2017	Реализација 2018	Промена 2018/2017
Тековна актива	2,597,913	3,372,857	1.30
Тековни обврски	3,525,690	5,716,207	1.62
Вкупно приходи од дејноста	6,463,575	7,079,500	1.10
Вкупно приходи	8,997,297	7,653,791	0.85
Вкупно расходи од дејноста	3,336,604	3,468,918	1.04
Вкупно расходи	3,471,438	5,154,533	1.48
Трошоци за плата	210,963	259,910	1.23
Просечен број на вработени	391	427	1.09
Вкупно трошоци за кредити	83,342	74,044	0.89
Резерви	11,864,070	14,975,333	1.26
Капитал (влог, акум. добивка)	32,888,817	34,956,434	1.06
Добивка / Загуба	5,178,880	2,499,258	0.48
Вкупно материјални средства	81,988,952	90,880,686	1.11
Вкупно нематеријални средства	28,081	23,014	0.82
Вкупно средства	84,715,114	94,370,685	1.11

VI. ИНВЕСТИЦИИ

Инвестициите се преод на заштедите во капитални фондови. Во суштина, инвестициите се разликата меѓу вкупниот доход и потрошувачката во еден одреден временски период, кои се трансформираат во фиксни и обртни капитални добра. Инвестициите се вбројуваат меѓу најзначајните фактори на економскиот развој. Инвестициите т.е. капиталот се создава од домашните заштеди (акумулацијата) и позајмен капитал од странство, во форма на кредити и странски директни инвестиции. ЈПДП, капиталните средсва ги обезбедува од домашни заштеди и странски кредити.

Во табелата што следи се прикажани инвестиции од сопствени средства и инвестициите со странски кредити остварени во 2018 година и нивната споредба со претходната година.

Годишна Програма	Реализација 2017 година	Програма 2018	Реализација 2018 година	Според ба 2018/20 17	Оств. /план.	Струк. Анал. реал. 2018
ИНВЕСТИЦИИ	7,761,371,729	16,748,600,000	7,989,972,547	1.03	0.48	1.00
Инвестиции од сопствени средства	1,992,217,066	3,434,600,000	2,548,225,536	1.28	0.74	0.32
Градба и рехабилитација на државни патишта	448,645,806	1,246,000,000	816,102,561	1.82	0.65	0.10
Свлечишта и рехабилитација на мостови и тунели	132,323,317	92,000,000	169,741,098	1.28	1.85	0.02
Осветлување	33,020,447	44,600,000	29,182,283	0.88	0.65	0.00
Сигнализација и опрема на патишта	33,174,832	30,000,000	3,304,516	0.10	0.11	0.00
Сопствено учество во инвестиции од странски кредити	813,519,722	824,000,000	470,007,069	0.58	0.57	0.06
Инвестиционо одржување	162,217,234	470,000,000	393,744,825	2.43	0.84	0.05
Експропријација	68,092,447	122,000,000	287,437,986	4.22	2.36	0.04
Проектирање	63,962,498	201,000,000	71,312,110	1.11	0.35	0.01

Надзор над градежни работи	228,847,663	378,000,000	293,235,886	1.28	0.78	0.04
Опрема и Софтвер	8,413,100	27,000,000	14,157,202	1.68	0.52	0.00
Инвестиции од странски кредити	5,769,154,663	13,314,000,000	5,441,747,011	0.94	0.41	0.68
Инвестиции со кредит од Светска банка	460,949,483	2,255,000,000	1,019,254,871	2.21	0.45	0.13
Подобрување на магистрала и регионални патишта	460,949,483	755,000,000	407,085,962	0.88	0.54	0.05
Унапредување и развој на патиштата	0	1,500,000,000	612,168,909	/	0.41	0.08
Инвестиции со кредит од ЕБОР	778,835,169	4,059,000,000	1,124,619,885	1.44	0.28	0.14
Проект за регионални и локални патишта	138,165,966	79,000,000	14,989,725	0.11	0.19	0.00
Проект за електронски систем за наплата на патарина	98,225,616	745,000,000	174,656,076	1.78	0.23	0.02
Проект за градба на национални патишта	542,443,587	2,135,000,000	371,876,882	0.69	0.17	0.05
Штип - Радовиш, изградба на експресен пат	0	1,000,000,000	563,097,202	/	0.56	0.07
Крива Паланка - Деве Баир	0	100,000,000	0	/	0.00	0.00
Кредит од Европска Инвестициона Банка	27,380,126	0	15,354,603	0.56	/	0.00
Инвестиции со кредит од Ексим Банка	4,501,989,885	7,000,000,000	3,282,517,652	0.73	0.47	0.41
Миладиновци - Свети Николе - Штип, изградба на автопат	1,657,149,490	3,000,000,000	1,351,283,444	0.82	0.45	0.17
Кичево - Охрид, изградба на автопат	2,844,840,395	4,000,000,000	1,931,234,208	0.68	0.48	0.24

Вкупно реализирани средства за инвестиции во 2018 година изнесуваат 7.989.972.547 денари. Најголемо зголемување во однос на претходната година има кај инвестициите од сопствени средства за 28%, и тоа за делот од програмата Градба и рехабилитација на државни патишта, согласно структурната и споредбената анализа.

1. Инвестиции со сопствени средства

1.1. Градба, рехабилитација и реконструкција на државни патишта, свлечишта, мостови и тунели, осветлување и сигнализација на патиштата

- Сончев град, во должина од 4,4км. Градежните работи комплетно се завршени. Поради појава на свлечиште потребно е да се извршат измени во тек на градба. Аплицирано е до МТВрски за измени во тек на градба. По направените измени ќе се изврши технички преглед и ќе се аплицира до МТВрски за употребна дозвола на патот.

- Опае – Бељаковце – Станчиќ – граница со Косово, во должина од 16км. Градежните работи комплетно се завршени. Поради измените настанати во тек на градба, изработена е дополнителна проектна документација од страна на проектант. Измена и дополна на инфраструктурниот проект е одобрен во октомври 2018 година од МТВрски. Во тек е процесот на дополнителна експропријација, и аплицирано е до МТВрски за измени во тек на градба. По направените измени и решавање на дополнителната експропријација која се јави поради измените настанати во тек на градба, ќе се организира технички прием и ќе се аплицира до МТВрски за употребна дозвола на патот.

- Изградба на клучка на обиколница Скопје, државен пат А2, месност Смилковци. Преостанува да се постави дел од сообраќајна сигнализација (портали над автопат). Градежните активности се целосно завршени.

- Рехабилитација на автопатска делница Неготино – Демир Капија, во должина од 8,8км. Градежните работи за рехабилитација на автопатската делница комплетно се завршени. Продолжен е рокот на изведувачот до 01.05.2019 година поради санација на појавеното свлечиште.

- Доизградба на регионален пат крак 1 од Р-418 (фаза 2), на потег фабрика „Вевчанка – Здравствен дом Вевчани, општина Вевчани во должина од 642 метри. Потпишан е Договор со Изведувач. Добиено е одобрение за градење, се чека правосилност на истото за да се воведат Изведувачот во работа. Рок за изградба е 12 месеци по воведување во работа.

- Изградба на регионален пат Старо Коњарево - Ново Коњарево (општина Ново Село - струмичко), во должина од 3,4 км. Потпишан е договор со Надзорен орган и во тек е потпишување на Договор со Изведувач. ЈП за државни патишта има аплицирано до МТВрски за издавање на одобрение за градење. Рок за изградба е 15 месеци по воведување во работа.

- Реконструкција на државен пат Р2133, делница Ропалце – Матејче – Липково, во должина од 6,0 км. На подделницата Матејче – Липково, која е во должина од 3,3 км, Изведувачот е воведен во работа во мај 2018 година со краен рок до септември 2019 година. Вкупниот прогрес на градежните работи изнесува околу 11%. За подделницата Ропалце – Матејче, која е во должина од 2,7 км, во јули 2018 година склучен е договор за изработка на дополнителна проектна документација. Краен рок за комплетирање на проектната документација е февруари 2019 година.

- Рехабилитација на државен пат А2 делница од Гостивар (мост кај село Здуње) до село Колари во должина од 28,50 км е целосно завршена.

- Рехабилитација на државен пат Р1106 делница Мост Близанско – Калугерец, во должина од 14,50 км. Патот е завршен во февруари 2018 година.

- Рехабилитација на државен пат Р1102, делница Петровец – Катланово во должина од 5,3км. Патот е завршен во јуни 2018 година.

- Рехабилитација на државен пат Р2234, делница Пршовце – Јегуновце, во должина од 5км. Патот е завршен во мај 2018 година

- Рехабилитација на државен пат Р1202, делница Кружен тек Р1201 – ГП Блато во должина од 5,3км. Патот е завршен во април 2018 година.

- Рехабилитација на државен пат Р1301, делница Охрид кај бензинска пумпа Биљанини извори (Туристичка лев и десен коловоз) – Коњско (Хотел Метропол) во должина од 6,0км. Патот е завршен во јули 2018 година.

- Итни градежни работи за санација на државен пат А2, Обиколница на Скопје. Патот е завршен во април 2018 година.
- Санацијата на 5 (пет) мостови на државен пат А2 делница од Гостивар (мост кај село Здуње) до село Колари е целосно завршена.
- Рехабилитација на мостови и тунели. Во текот на 2016-2018 година завршени се следниве активности во делот на изградба и санација на мостови, тунели и други: Санација на мост на магистрален пат А2, делница Гостивар – „Стража“, (пред “Стража“), Санација на мост на регионален пат Р1308 на Брајчинска река, Санација на мост на регионален пат Р2338 на Елешка река, Санација на мост на регионален пат Р2132, на река Треска (кон Самоков), Санација на мост на регионален пат Р2137, на река Вардар кај с. Војшанци, Изградба на плочест пропуст на река Вратничка, кај с. Дворце на регионален пат Р2234, Кондово-Јегуновце

Рамковна спогодба за поправка и рехабилитација на државни патишта од А категорија кои ги опфаќаат следните делници:

- Рехабилитација на обиколка на Скопје (клучка Стајковци – Клучка Мирковци) – возна и брза лента, во должина од 9км. Патот е завршен во ноември 2018 година.
- Рехабилитација на државен пат А3, делница Обиколница на Битола (клучка Крклино – Бензинска пумпа Лукоил), во должина од 8 км. Патот е завршен во ноември 2018 година.
- Рехабилитација на сообраќајна возна лента на државен пат А1 делница Велес (Штипска клучка) – Градско и Градско – Велес (Штипска клучка), во должина од 20,2км. Потпишан е Договор со Изведувач. Рокот за изведување на работите е 6 месеци од воведување во работа. Изведувачот е воведен во работа 03.09.2018 година со краен рок до 03.03.2019 година. Асфалтирани се 2,4км. Вкупниот прогрес на градежните работи изнесува околу 12%.
- Рехабилитација на државен пат А2, делница Колари – Кичево, во должина од 11,4 км. Потпишан е Договор со Изведувач. Рокот за изведување на работите е 10 месеци од воведување во работа. Изведувачот е воведен во работа 27.09.2018 година со краен рок до 26.07.2019 година. Добиено е Одобрение за Времен режим на сообраќај. Изведувачот врши геомтарски снимки на патот.

Рамковна спогодба за поправка и рехабилитација на државни патишта кои ги опфаќаат следните делници:

- Рехабилитација на државен пат Р1309, делница Кочани – Пониква, во должина од 12км. Потпишан е Договор со Изведувач. Рокот за изведување на работите е 12 месеци од воведување во работа. Изведувачот е воведен во работа 17.09.2018 година со краен рок до 17.09.2019 година. Асфалтирани се 12км. Вкупниот прогрес на градежните работи изнесува 85%.
- Рехабилитација на државен пат Р2342, делница Тркање – Пишица, во должина од 9,85км. Потпишан е Договор со Изведувач. Рокот за изведување на работите е 6 месеци од воведување во работа. Изведувачот е воведен во работа 17.09.2018 година со краен рок до 17.03.2019 година. Асфалтирани се 9,85км. Вкупниот прогрес на градежните работи изнесува 90%.
- Рехабилитација на државен пат Р1310, делница Радовиш – Подареш, во должина од 9,85км. Потпишан е Договор со Изведувач. Рокот за изведување на работите е 10 месеци од воведување во работа. Изведувачот е воведен во работа 17.09.2018 година со краен рок до 17.06.2019 година. Асфалтирани се 3,8км. Вкупниот прогрес на градежните работи изнесува 40%.
- Рехабилитација на државен пат Р1310, делница Берово – Клепало, во должина од 5,7км. Потпишан е Договор со Изведувач. Рокот за изведување на работите е 10 месеци од воведување во работа. Изведувачот е воведен во работа 03.10.2018 година со краен рок до 03.07.2019 година. Се работи на терен се чистат пропусти, берми и риголи.
- Рехабилитација на државен пат Р1102, делница Негорци – Гевгелија, во должина од 5,4км. Потпишан е Договор со Изведувач. Рокот за изведување на работите е 10 месеци од воведување во работа. Изведувачот е воведен во работа 28.09.2018 година со краен рок до 28.07.2019 година. Асфалтиран е 1,0 км. Вкупниот прогрес на градежните работи изнесува 20%.
- Рехабилитација на државен пат Р1107, Транзитен дел низ Кавадарци, во должина од 1,1км. Потпишан е Договор со Изведувач. Рокот за изведување на работите е 12 месеци од воведување во работа. Изведувачот е воведен во работа 16.11.2018 година со краен рок до 16.11.2019 година.

- Рехабилитација на државен пат Р1301, делница транзит низ Охрид – десен и лев коловоз во должина од 5,6км. Потпишан е Договор со Изведувач. Рокот за изведување на работите е 10 месеци од воведување во работа. Изведувачот е воведен во работа на 30.10.2018 година со краен рок до 30.08.2019 година. Одобен е времен режим на сообраќај од МТВ и од општина Охрид.
- Рехабилитација на државен пат Р1208, делница Охрид – Подмоље (кружен тек Евро хотел) во должина од 8,55км. Потпишан е Договор со Изведувач. Рокот за изведување на работите е 10 месеци од воведување во работа. Изведувачот е воведен во работа 17.09.2018 година со краен рок до 17.07.2019 година. Се работи на терен се чистат пропусти, канавки и банкини.
- Рехабилитација на државен пат Р1208, делница Подмоље (кружен тек Евро хотел) - Радожда во должина од (4,1км). Потпишан е Договор со Изведувач. Рокот за изведување на работите е 9 месеци од воведување во работа. Изведувачот е воведен во работа 07.11.2018 година со краен рок до 11.08.2019 година. Одобен е времен режим на сообраќај од МТВ и од општина Струга.
- Рехабилитација на државен пат делница, спој со Р1205 – Злетово – Пробиштип, во должина од 17,3км. Потпишан е Договор со Изведувач. Рокот за изведување на работите е 15месеци од воведување во работа. Изведувачот е воведен во работа 19.10.2018 година со краен рок до 19.01.2020 година. Одобен е времен режим на сообраќај од МТВ.
- Рехабилитација на државен пат Р2235, делница Маврово – Никифорово во должина од 6,6км. Потпишан е Договор со Изведувач. Рокот за изведување на работите е 10месеци од воведување во работа. Изведувачот е воведен во работа 11.12.2018 година со краен рок до 11.10.2019 година. Во тек е изработка на сообраќајниот проект за времен режим на сообраќај од страна на Изведувачот.
- Рехабилитација на државен пат Р1312, делница Прилеп – Прилепско Езеро во должина од 4,2км. Потпишан е Договор со Изведувач. Рокот за изведување на работите е 8 месеци од воведување во работа. Изведувачот е воведен во работа 03.12.2018 година со краен рок до 03.08.2019 година. Во тек е изработка на сообраќајниот проект за времен режим на сообраќај од страна на Изведувачот.
- Рехабилитација на државен пат Р1204, делница Кадрифаково - Штип во должина од 7,0км. Потпишан е Договор со Изведувач. Рокот за изведување на

работите е 8 месеци од воведување во работа. Изведувачот е воведен во работа 05.12.2018 година со краен рок до 05.08.2019 година. Во тек е изработка на сообраќајниот проект за времен режим на сообраќај од страна на Изведувачот.

- Реализацијата на договорот за Осветлување на дел на автопат А2 и А4 (делница клучка Хиподром – клучка Белви - клучка Илинден и делница клучка Илинден - клучка Кадино) е започната во 2017 година и истиот е завршен во 2018 година. Осветлена е патна делница во должина од околу 12 километри. Вкупно се поставени 276 канделабри со 585 светилки.

1.2. Инвестициско одржување.

Одржувањето на магистралната и регионалната патна мрежа во Република Македонија во текот на извештајниот период се вршеше согласно програмата и динамичките планови на ЈП “Македонија пат”, а усогласени со ЈПДП. Приоритет во одржувањето на патната мрежа беа работите кои обезбедија безбедно одвивање на сообраќајот и воедно го продолжија периодот на траење на дел од патната инфраструктура.

Согласно Договорот за одржување склучен со ЈП Македонијат, во позицијата **4.1. Надградување и поправка на коловози во 2018 реализирани се работи на следните патни правци:**

1. P2245 К.Паланка – Огут
2. P1206 Сарај – Карпалак
3. P29274 Шемшово – Лешок
4. P29278 Неготино (Полошко)-спој со А2
5. P1206 Сарај-Семениште
6. P1206 Желино-Сараќино
7. P2239 Спој А4-Стенковец
8. P2345 Трстија – Бигла
9. P2345 Трсино-Трстија
10. P1402 Смолари - Дражево – Коњарево
11. P1403 Влез Струмица (Добрејци)
12. P2334 Кучичино – Теранци
13. P2431 Карбинци – Плачковица
14. P2431 Радовиш – Плачковица
15. P1205 Влез во Пробиштип
16. P2334 Штип-Караорман-Аргулица
17. P1402 Транзит низ Куклиш

18. P2336	Стари Град -Теово-Согле-Богомила
19. P2336	Богомила-Стровија (Гостиражни)
20. P1102	Смоквица-Прдејци
21. P1401	Спој P1105 - Балинци
22. P29173	Неготино-Дисан
23. P1102	транзит Демир Капија
24. P2137	Корешница-Бистренци
25. P1102	Давидово-Миравци
26. P1101	кл. Крклино - Влез Битола
27. P1201	Спој за Вевчани (Кореа)
28. P2243	Мороишки мост – Дрслајца
29. P1301	Хотел Гранит-Пумпена ст.
30. P1208	Распаке - Подмоље
31. P2231	Осломеј-Туин
32. P1311	Рапеш-Старавина
33. P1312	Прилеп- Прилепско езеро
34. P1101	Лозани-Вашерејца
35. P2333	Бистрица-Драгош
36. P1101	Транзит Прилеп

1.3. Инфраструктурни проекти

До крајот на 2018 година беа завршени следните проекти:

- Изработка на проектна документација за наплатни станици на автопати (Кичево – Охрид, Миладиновци – Штип, Д.Капија – Смоквица - Гевгелија);
- Изработка на проектна документација за Рехабилитација на државен пат А2, делница Куманово – Страцин (Чатал);
- Изработка на проектна документација за Реконструкција и рехабилитација на државен пат А2, делница Крива Паланка – Деве Баир (Граница со р. Бугарија);
- Изработка на проектна документација за заштитна ограда на Обиколница Битола
- Изработка на дополнителна проектна документација за државен пат Р2133, делница Ропалце – Матејце
- Изработка на техничка документација на ниво на Основен проект и Измена и дополна на Проект за инфраструктура за државен пат Р 29272, делница Опае – Белановце – Станчич

Во фаза на изработка се следниве Проекти:

- Изработка на Инфраструктурен и Основен проект за државен пат А2, делница Букојчани – Кичево (варијанта со тунел)
- Изработка на проектна документација за рехабилитација на државен пат Р1202 Маврови Анови -Жировница;
- Изработка на проектна докум. за рехабилитација на држ. пат А1, делница Катланово - Петровец на ниво на стандарден автопат и рехабилитација на двата коловози;
- Изработка на дополнителна проектна документација за Струмица – Валандово – Спој со А1

1.4. Експропријација

Во 2018 година исплати се вршени по основ на спогодби за експропријација, судски порамнувања, судски решенија и решенија за времени застапници во постапките за експропријација за следните проекти:

- Изградба на Автопат А2 Кичево – Охрид во должина од 56,7 км;

Автопатот А2, делница Кичево-Охрид е поделен на 5 поделници. Постапката за експропријација на земјиште за главната траса е спроведена. Постапката за експропријација на вкупно 17-седумнаесет одлагалишта и 5-пет клучки (Арбиново, Издеглавје, Ботун, Мешеиште и Извор) е спроведена. Постапката за експропријација на Денивелиран патен јазол Требениште, на Патен јазол Подмоље и Патен јазол Аеродром Св.Апостол Павле е спроведена. Исто така спроведена е постапката и за 9-девет косини.

Во тек се вонпарнични постапки за утврдување на надомест за експроприран имот пред Основен суд Кичево и Охрид и Апелационен суд Битола и Гостивар.

Постапката за Клучка Кнежино е стопирана поради промена на проектот. Во текот на 2018 година успешно е завршена постапката за експропријација на 25-дваесет и пет објекти кои се наоѓаа на траса и истите се урнати.

- Изградба на Автопат Миладиновци-Свети Николе-Штип во должина од 47 км;

Постапката за експропријацијата на земјиштето е завршена, останати се само неколку постапки кои се водат пред основните судови за определување надоместок за експроприраниот имот.

При крајот на 2018 година е отпочната постапка за експропријација на косини долж Автопатот и заклучно со 2018 процентот на спроведена експропријација беше 75,3%. Моментално е при крај постапката за експропријација, се решаваат и последните катастарски парцели.

- Изградба на А1 Прилеп-Градско од мост на река Раец преку ДПЈ Дреново до ДПЈ Градско во должина од 25,7 км;

Постапката за експропријацијата на земјиштето заклучно со 2018 година е завршена 99%, во тек се неколку постапки за определување надоместок за експроприран имот. Преку Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, завршена е постапката за раскинување на договорите за закуп на земјоделското земјиште со што се отстранети пречките за изведување на градежните работи.

- Рехабилитација и подобрување на коловозот на државен пат Р2133 делница с. Ропалце до с. Матејче и Реконструкција и Рехабилитација на делови од регионалниот пат Р2133 делница Матејче-Липково;

Постапката за експропријацијата заклучно со 2018 година е завршена 100%, во тек се неколку постапки за определување надоместок за експроприран имот.

- Изградба на А2 делница Ранковце-Крива Паланка на ниво на експресен пат поделен во 2 лота со 10 одлагалишта, лот 1 од км 0+000 до км 10+308 и лот 2 од км 10+308 до км25+850;

Постапката за експропријацијата на земјиштето за експресниот пат и 10-те одлагалишта продолжи во текот на 2018 година. Заклучно со 2018 година се спроведе 98% од земјиштето за 10 одлагалишта и 95% за земјиштето на лот 2. Од месец април интензивно започнаа и вонпарнични постапки за утврдување на надомест за експроприран имот пред Основен суд Крива Паланка и Апелационен суд Скопје, така што до крајот на 2018 година од 300-триста започнати постапки, правосилно завршени и исплатени беа 57 судски постапки.

- Изградба на Регионален пат Р2-138 (303) дел од крстосница со постојниот пат кон Водно до крстосница со Р2134 во Сопиште

Во текот на 2018 година беше спроведена постапка за експропријација согласно Измената и дополнувањето на Проектот за инфраструктура по што

следеше и постапка за пренамена на земјоделското и шумското земјиште во градежно. Исто така преземени се подготвителни активности за комплетирање на документацијата потребна за добивање на одобрение за употреба на предметната делница.

- Изградба на експресен пат А3 Штип-Кочани, прва секција од км 0,00 до км 14+300 и втора секција од км 14+300 до км 28+057,44.

Во текот на 2018 година е завршена постапката за експропријација за првата секција од км 0,00 до км 14+300. За оваа секција во тек е постапката за трајна пренамена за земјоделско земјиште во градежно земјиште. До крајот на 2018 година за втората секција од км 14+300 до км 28+057,44 постапката за експропријација е завршена со речиси 90%. Во тек се вонпарнични постапки пред надлежните судови за определување надоместок за експроприрана недвижност.

- Изградба и реконструкција на делница Старо Коњарево – Ново Коњарево како дел од државен пат Р1402 (Р-605);

Постапката за експропријација на земјиштето е започната во текот на 2017 година и заклучно со декември 2018 година експропријацијата е завршена 75%.

- Изградба на државен пат А4, делница Штип- Радовиш од км 7+463,31 до км 37+200,00;

Постапката за експропријација на земјиштето е започната во текот на 2017 година и до крајот на 2018 година експропријација на земјиштето за овој дел е на 98%.

Во тек на месец април 2018 година, исто така е започната постапката за експропријација на земјиштето од км 5+066.00 до км 7+413.49, и експропријацијата во овој дел е завршена со 97% до крајот на годината. Во тек е постапка за уште две катастарки парцели.

Во текот на 2018 година, за ова делница, е направена и трајна пренамена на шума и шумско земјиште во градежно неизградено земјиште.

Во тек е и постапката за пренамена на земјоделско земјиште во градежно која се води пред Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство.

- Изградба на државен пат Р2246, делница Гарски мост-Ехловец (Извор) од км 8+223,22 до км 16+000,22;

Експропријацијата е започната во текот на месец февруари 2017 година и заклучно со 2018 година експропријацијата е завршена 90%.

- Изградба на обиколен пат околу село Вевчани во правец кон село Октиси.
Експропријацијата е започната во текот на месец април 2017 година, а заклучно со декември 2018 година експропријацијата е завршена со 98%. Преостануваат да се експроприраат уште 4 – четири катастарски парцели.
- Изградба на нов мост бр.4 на река Пчиња на регионален пат Р2136, на делница Ржаничино-Долно Коњаре на км 7+165,00 КО Долно Коњаре, Општина Петровец. На крајот на месец декември 2018 година до Државното правобранителство за подрачје на Скопје, беше доставена документација за отпочнување на постапката за експропријација.
- Реконструкција и рехабилитација на магистралниот пат А2, делница Крива Паланка - граничен премин Деве Баир
Експропријацијата е започната во месец мај 2018 година, а заклучно со декември 2018 година експропријацијата е завршена 75%.
- Реконструкција и рехабилитација на АЗ/Р1312 (делница Велес-Кадрифаково како експресен пат, VI секција)
Во текот на месец ноември 2018 година отпочната е постапка за експропријација врз основа на Дополнување и корекции на геодетски елаборат за геодетски работи за посебни намени за потполна експропријација, за неколку катастарски парцели коишто биле пропуштени во основниот елаборат и за кои не била спроведена постапката за експропријација. Исто така преземени се подготвителни активности за комплетирање на документацијата потребна за добивање на одобрение за употреба на предметната делница.
- Изградба на патен јазол Смилковци на траса на Северна обиколница – Скопје
Преземени се подготвителни активности за комплетирање на документацијата потребна за добивање на одобрение за употреба на предметната делница.
- Изградба на Наплатна станица Преод на Автопат Миладиновци-Свети Николе-Штип
Во текот на месец септември 2018 година отпочната е постапка за експропријација и истата е комплетно завршена заклучно со декември 2018 година.

- Наплатни станици на Коридор 10


Во текот на месец Октомври 2018 година, отпочната е постапка за експропријација за пет (5) наплатни станици, и тоа за: Отовица, Петровец, Гевгелија, Сопот и Демир Капија. Постапката за експропријација за овие пет наплатни станици е при крај.

Изградба на нов мост на река Луда Мара К.О. Ваташа- Кавадрази, при крајот на 2018 година, отпочната е постапка за експропријација.

- Државен пат Р29272 делница Опае-Баленовце-Станчиќ, проширување на косини

При крајот на 2018 година, е отпочната постапка за трајна експропријација, а заклучно со декември 2018 година експропријацијата беше реализирана до 65%.

Графички приказ: Учество на поединечите во вкупните инвестиции од сопствени средства

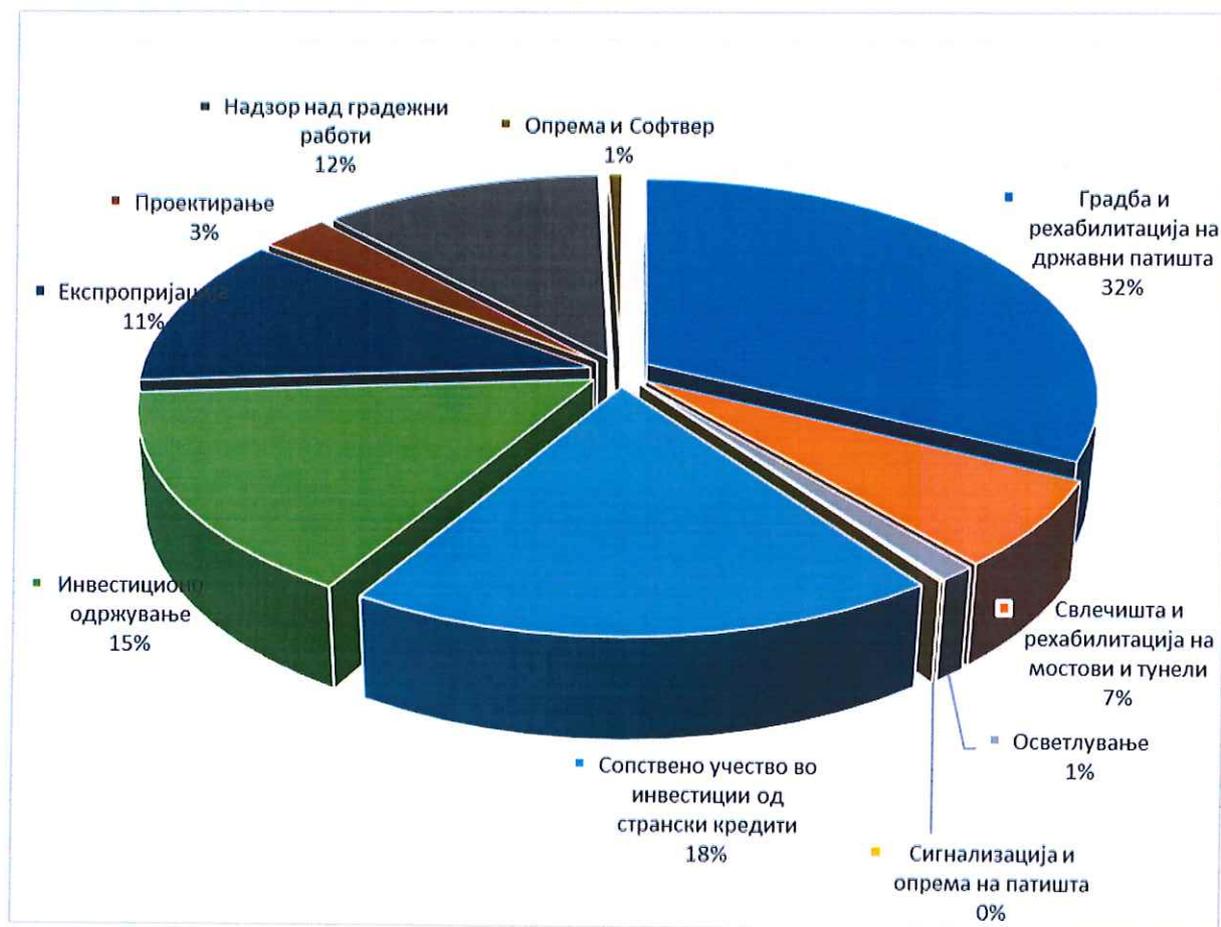

2. Инвестиции со странски кредити

2.1 Проекти финансирани со заем од Светска банка

Договорот за Заем од Светска Банка за финансирање на Проектот за рехабилитација на магистрални и регионални патишта склучен е на износ од 52.000.000 ЕУР. Крајниот рок за затворање на заемот е 2019 година, а салдото на неповлечени средства од кредитот изнесува 22,02 мил.ЕУР.

Во текот на 2018 година завршен е магистралниот пат АЗ, делница Кочани – Делчево како и свлечишта и нестабилни зони на регионалниот пат Р1103 Лакавица – Неготино на км 7+200

Во текот на 2019 година се очекува да се заврши следните државни патишта: Проектирање и рехабилитација на 12 државни патишта групирани во следните 4 групи: Лот 1: Младо Нагоричане – Пелинце; Куманово – Свети Николе; Тетово – Попова Шапка Лот 2: Јурумлери – Драчево; Битола – Демир Хисар; Драчево – Орешани – Таор Лот 3: Делчево – Звегор; Делчево – Пехчево; Берово – Ваница Лот 4: Струмица – Ново Село; Кавадарци – Росоман; Фурка – Богданци – Гевгелија, како и свлечиштата и нестабилните зони на Регионалниот пат Р1202, Маврово – Дебар на км. 43+100

Проект финансиран со средства од Светска Банка е и Изградбата на нов експресен пат – делница: Ранковце-Крива Паланка, со должина од 23 км. Вкупната инвестиција на изградба на експресен пат делница Ранковце-Крива Паланка ќе биде во износ од 58,1 милиони евра. Градежните работи започнаа на 23.05.2018 година и до крајот на 2018 прогресот на градежните работи изнесува 10%.

Проблеми:

- Третирањето на археолошките наоѓалишта на трасата
- Решавање на експропријација
- Недостатоци во проектната документација
- Дислокација на постоечка инсталација (ЕВН итн.).
- На дел од новопроектираната траса е во колизија со асфалтната база на Изведувачот Синохидро кој има валидна дозвола за работа.

2.2 Проекти финансирани од Европска банка за обнова и развој

Договорот за Заем од Европска Банка за обнова и развој за финансирање на Проектот за постојните регионални и општински патишта склучен е на износ од 50.000.000 ЕУР. Делницата Велес – Кадрифаково, III фаза, Лозово – Сарамзалино – Кадрифаково е комплетно изведена во 2017 година. Преостанува да се изгради во 2019 година паралелен пат кај Кадрифаково.

Договорот за Заем од Европска Банка за обнова и развој за финансирање на “Изградба и инсталација на електронски систем за наплата на патарини во Република Македонија” склучен е на износ од 15.880.000 ЕУР. Со овој договор се опфатени модернизација на 3 постоечки наплатни станици и изградба на 4 нови наплатни станици долж Коридорот 10. Проектирањето за сите наплатни станици е завршено во тек на месец септември 2016 год. Подолг период течеа процедурите за добивање на одобренија за градење за некои наплатни станици по следниов приоритет: НС Петровец, НС Градско, НС Сопот, НС Отовица, НС Демир Капија и НС Гевгелија.

Во текот на 2016 после завршена ревизија се одобруваа Проектите за Инфраструктура и траен режим на сообраќај додека во текот на 2017 год. се поднесуваа проектите за мислење на Институтот за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија, откако се добиени сите претходни согласности на почетокот на 2017 година се аплицираше преку електронскиот систем за Одобренија за градење. Во фазата на добивање на одобренија за градење се добиваа одредени забелешки на проектната документација од страна на Министерството за транспорт и врски, при што проектантот на проектната документација беше должен да ги отстрани забелешките и повторно да ги однесе проектите електронски да се пре-потпишат од ревидентот, па потоа повторно да се аплицираат на електронскиот систем за Одобренија за градење.

За првата Наплатна Станица Романовце во 2017 година комплетно се завршени градежните работи. Наплатните станици Сопот и Отовица се комплетно завршени во текот на 2018 година. Очекуваме наплатните станици Петровец, Градско, Демир Капија и Гевгелија да се комплетираат во текот на 2019 година.

Договорот за Заем од Европска Банка за обнова и развој за финансирање на Проектот за магистрални патишта склучен е на износ од 181.000.000 ЕУР.

Преку овој договор се финансира изградбата на експресен пат А1, Градско – Прилеп, делница Фариш – Дреново (10,197 км). Договор со Изведувачот е потпишан

во Јануари 2016. Отпочнато е со градежни работи во мај 2016, Изведувачот има пробиено 85% од трасата, ископ на земја, изработка на насип, бетонирање на 3 единечни и 4 дупли моста (вкупно 13 објекта), бетонирање на 1 дупли натпатник, бетонирање на 1 потпатник. Завршени се 12 потпатника, 5 потпорни сидови и изработени се 11 цевсти пропусти, а времетраењето на градежните работи е планирано да биде 24 месеци. Вкупниот прогрес изнесува 26%, односно прогресот на градежните работи изнесува 25%.

Проблеми:

- Третирањето на археолошките наоѓалишта на трасата е завршено во месец ноември 2018
- Каснење од страна на надлежните институции за третирање на археолошки наоѓалишта поради кои издадено е Решение за забрана за изведување на било какви градежни работи на 15% од целокупната должина на трасата и едно одлагалиште за ископан материјал.
- Неусогласеност на проектната документација со реалната состојба на терен
- Недостатоци во проектната документација
- Непредвидени геолошки услови при фундаирање на објекти и изведба на ископи
- Подземна инфраструктура која се евидентира и инвентаризира на лице место
- Предвидени еколошки ограничувања каде изведбата се одвива во посебни услови
- На дел од трасата каде условите за работа се многу тешки и каде се сретнавме со непредвидени геолошки услови за изведба на тунел со две цевки (вкупна должина 1.600m), Изведувачот достави нацрт предлог за вредносно инженерство кој е во процедура.

Од Изведувачот се очекува да поднесе барање за продолжување на рокот на изведба на градежните работи.

Кон крајот на 2016 година е избран најповолен понудувач за изградба на експресен пат Штип – Крупиште. Изградба на нов експресен пат на делница Штип – Кочани, во должина од 28 км, 1 фаза е Штип – Крупиште и 2 фаза Крупиште – Кочани. Тендерот за претквалификација за изградба на 1 фаза (должина 14,30км) беше распишан во 2016 година и потпишан е Договор со избраниот изведувач на работите. Градежните работи започнаа во 2017 година и до крајот на 2018 прогресот на градежните работи изнесува 45%.

Проблеми:

- Неусогласеност на проектната документација со реалната состојба на терен
- Недостатоци во проектната документација
- Непредвидени геолошки услови при ископ и изведба на насипи
- Подземна и надземна инфраструктура која се евидентира и е во тек се процедури со сопствениците на тие инсталции за нивна дислокација или заштита (ЕВН, Мепсо, Телеком, Неотел итн.).
- На дел од новопроектираната траса е во колизија со асфалтната база на Изведувачот Синохидро кој има валидна дозвола за работа.

Договорот за Заем од Европска Банка за обнова и развој за финансирање на Штип - Радовиш склучен е на износ од 64.000.000 ЕУР. Во текот на 2017 година водена е тендерска постапка за избор на најповолен понудувач за изградба на фаза 1 од делницата Штип-Радовиш (во должина од 23,56 км.) која ќе се гради по нова траса. Во текот на 2018 година изведувачот на работите изведе околу 30% од предвидените градежни активности.

2.3 Проект за техничка помош при имплементација на проектот за доизградба на Коридор X, делница Демир Капија - Смоквица, финансиран од ЕИБ

Со средства од Европската Инвестициска Банка се финансираат консултантски услуги за техничка помош при имплементација на Проектот за доизградба на Коридор X, делница Демир Капија-Смоковица. Договорот ќе трае 74 месеци и е потпишан со компанијата Safege од Франција.

Во согласност со член 5 од Законот за задолжување на Република Македонија со првиот дел од Заемот од ЕИБ, финансискиот договор за проектот за изградба на автопатот на Коридор 10, делница Демир Капија-Смоквица, предвидено е повлекувањата на средствата по наведениот проект да ги спроведува Министерството за финансии, согласно процедурите наведени во финансискиот договор, додека плаќањата за предметниот договор е предвидено да ги спроведува ЈПДП.

2.4 Проекти финансирани од Кинеската Ексим Банка

Во текот на мај 2014 година отпочната е изградбата на автопатот Миладиновци – Штип во должина од 47 км. Согласно склучениот договор за изградба на автопат Миладиновци-Штип со изведувачот Синохидро Корпорацион лимитед Кина, рокот за завршување на работите предвиден со договорот е 01.05.2017 година. Во текот на 2018 година од страна на надзорот над изградбата на автопат Миладиновци-Штип доставени се дописи со укажување за продолжување на рокот за завршување на проектот и дадено мислење дека треба да се скучи Анекс на договорот за продолжување на крајниот рок за завршување до 31.12.2019 година, без финансиски надомест. Како причина за продолжување на рокот се наведени неповолните временски услови. Комплетирани се 98 км асфалт, од вкупно 139 плочасти и цевести пропусти, завршени се околу 99%. Завршени се сите армирано бетонски потпорни ѕидови. На мостовските конструкции прогресот е 99%. Вкупниот прогрес на градежните работи заклучно со декември 2018 година е 98%.

Договорот за Заем со Ексим Банка - Кина за изградба на автопатот Миладиновци – Штип склучен е на износ од 278.374.072 УСД. Салдото на неповлечени средства изнесува 120.928.437 УСД.

Договорот за изградба на патна делница Кичево – Охрид број 08-9012/1 од 12.11.2013 година е склучен помеѓу Јавното претпријатие за државни патишта како инвеститор и изведувачот Sinohydro Corporation Limited, со рок за завршување на работите до 29.01.2018 година. Вредноста на договорот е 411.287.800,07 евра, од кои 90% се обезбедени со заем од Ексим банка и се исплаќа во УСД и 10% од инвеститорот во МКД. Во текот на мај 2014 година отпочната е изградбата на автопатот Кичево – Охрид како дел од Коридор 8, со должина од 56,7 км.

Во текот на 2017 година и претходно надзорот над изградбата на автопат Кичево-Охрид има доставено повеќе дописи со кои укажува на проблеми на траса поради неусогласеност на проектната документација со реалните услови на терен, променливата геологија, појавената потреба од препроектирање на постоечка документација (препрооектирање на тунелот за кој немало геомеханички испитувања и погрешна категоризација, препроектирање речиси на сите потпорни ѕидови, поголем дел од усеците, вијадуктите, мостовите, натпатниците, потпатниците, плочестите и цевести пропусти и друго), дислокација на електро водовите, експропријација на објекти на траса, како и изработка на нова проектна документација за позиции кои не беа предвидени со Основниот Проект, а се неопходни за правилно функционирање на Автопатот и појавена потреба од дополнителни и нови работи, а со тоа и зголемен обем на работа.

Надзорот укажува за потребата од продолжување на рокот за завршување на работите и за потребата од дополнителни финансиски средства.

Во текот на месец ноември 2017 година се започна со интензивни разговори и одржани се многу состаноци со изведувачот Синохидро Корпоратион Лимитед, на кои присуствуваа преставници од кабинетот на Заменик на Претседателот на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, заради продолжување на рокот за завршување на работите, надминување на многубројните проблемите во врска со изградбата на автопатот и изнаоѓање на најдобро можно решение за целосна реализација на проектот од јавен интерес, за кој имаше укажување од надзорот дека доколку се прекине штетните последици по однос на инвеститорот ќе бидат многу големи.

Исто така, во текот на 2018 година интензивно се продолжи со разговори и се одржаа многу состаноци со изведувачот Синохидро Корпоратион Лимитед, на кои присуствуваа и преставници од кабинетот на Заменик на Претседателот на Владата на Република Северна Македонија задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори, претставници на Министерство за транспорт и врски и Министерство за Финансии, се со цел да се изнајдат решенија за надминување на проблемите во врска со изградбата на автопатот. Надзорниот орган над изградбата на автопат Кичево-Охрид достави повеќе дописи со Укажувања од кои се јави потреба за потпишување на Анекси кон Основниот Договор и тоа:


- Анекс бр.1 склучен на ден 04.05.2018 година со кој рокот на завршување на работите е продолжен до 30.06.2021 година. Договорните страни се откажаа од меѓусебни побарувања настанати пред датумот на потпишување на анексот, како и заклучно со 31.07.2018 година, а инвеститорот се обврза да ги преземе сите потребни активности пред банката-давател на заемот за продолжување на рокот за повлекување на парични средства според договорот за заем, согласно новиот рок за завршување на работата.
- Анекс бр.2 склучен на ден 24.08.2018 година се однесува на пренамена на преостанатите парични средства од Основниот Договор и истите да се искористат за изведување на работи по неопходен редослед во процесот на изведување на работите и оформување на функционални делови по должината на трасата, до обезбедување на дополнителни парични средства.
- Анекс бр.3 склучен на ден 16.11.2018 година со кој изградбата на 8 патни јазли (фаза 2) и еден алтернативен пат се вклучени како составен дел на работите на изградба на автопатот, како нужни и неопходни за целосно

завршување на проектот. Заради потребата од изведување на непредвидени и дополнителни градежни работи договорните страни се договорија вредноста на основниот договор да се зголеми за дополнителни 186.786.869,96 евра согласно прифатени прогнозирани предмер пресметки. Инвеститорот и Изведувачот се откажаа од оштетни побарувања заклучно со 30.06.2020 година. Со Анекс бр.3 се предвидува дека истиот ќе влезе во сила и ќе стане правно обврзувачки единствено доколку бидат обезбедени финансиски средства и доколку законот за обезбедување со државна гаранција на соодветниот договор за заем е донесен од републичкото собрание и објавен во службен весник.

Анексите беа потпишани по усвојување на измени на Законот за реализација на инфраструктурни објекти за изградба на автопат Миладиновци-Штип и автопат Кичево Охрид од страна на Собранието на Република Македонија на 11 април 2018 година, на 11 септември 2018 година и на 14 ноември 2018 година, соодветно.

Вкупниот прогрес на градежните работи заклучно со декември 2018 изнесува 66,5%.

Графички приказ: Учество на поединечите во вкупните инвестиции од средства од кредити

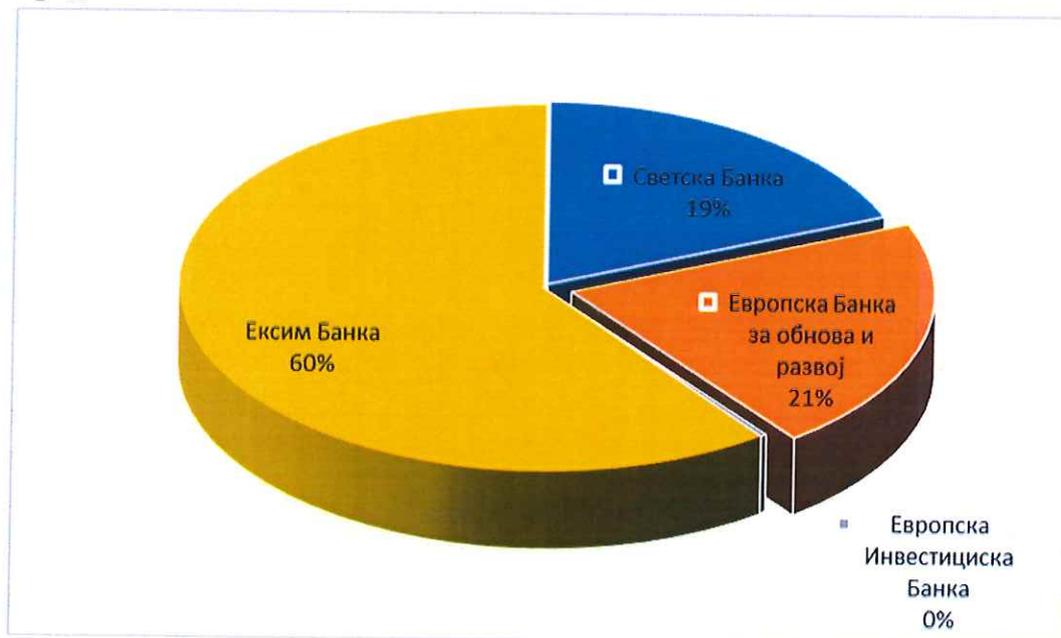

VII. ЈАВНИ НАБАВКИ

Јавните набавки на ЈПДП во текот на 2018 година се вршеа согласно усвоениот План за јавни набавки, кој поради новонастанати потреби, во текот на годината беше изменет и дополнет шестпати.

Во текот на 2018 година ЈПДП спроведе постапки за следните јавни набавки и за кои има и склучени договори:

Ред. Бр.	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Вредност на договор со ДДВ
1	Безконтактни смарт картици за инвалиди	214.760,00
2	Одржување и сервисирање на фотокопири и принтери	472.000,00
3	Одржување на ЛЕД дисплеи	1.180.000,00
4	Дигитални сертификати за електронски потпис	107.444,00
5	Одржување на ПП централа, ПП апарати и испитување на громобранска инсталација и заштитно заземјување	168.740,00
6	Поправка и рехабилитација на државни патишта	944.000.000,00
7	Канцелариски материјали	454.300,00
8	Средства за хигиена	1.167.020,00
9	Комунални услуги	5.250.000,00
10	Одржување на софтвер за канцелариско и архивско работење	177.000,00
11	Ролни за фискални печатари	3.681.600,00
12	Санација на мост над река Вардар на регионален пат Р1103, делница Лакавица – Неготино (Пепелиште)	115.168.000,00
13	Стручни обуки за Информатички Технологии	999.700,00
14	Превентивно и адаптивно одржување на ЕРП софтвер во времетраење од две години	3.304.000,00
15	Безалкохолни пијалоци	440.659,00
16	Изработка на дополнителна проектна документација за државен пат Р2133, делница Ропалце – Матејче	2.230.200,00
17	ИТ Услуги – Сигурносна проверка, тестирање и ревизија на ИТ инфраструктурата во ЈПДП од несакани напредни ИТ напади и пенетрациско тестирање	472.000,00
18	Фискални печатари	319.032,00
19	Санација на мост над Железница на регионален пат Р1103, делница Лакавица - Неготино.	22.420.000,00

20	Надзор на мост Железница на регионален пат Р1103, делница Лакавица - Неготино	1.642.560,00
21	Кафе и други материјали за приготвување на топли напитки	499.977,00
22	Надзор на санација на мост над река Вардар на регионален пат Р1103, делница Лакавица – Неготино (Пепелиште).	2.342.005,00
23	Консултативни стручни анализи и мислења при проектирањето, изградбата и одржувањето на државните патишта во Република Македонија, стучни консултации при припремните работи за изработка на техничката документација, стручни консултации при изработка на техничката документација, ревизија на изработена техничка документација, давање на консултативни стручни мислења и анализи при градењето, одржувањето, надградбата – рехабилитацијата на коловозните конструкции на патиштата и објектите на нив и по потреба да врши контролни геомеханички, асфалтни и бетонски испитувања во времетраење од три години.	57.820.000,00
24	Надзор на рехабилитации на државни патишта од рамковна спогодба	5.898.584,00
25	Опрема за компјутерска мрежна периметарска заштита со вклучени алатки за дијагностика на мрежниот сообраќај (backup/failover)	295.000,00
26	Електрични апарати и уреди	184.080,00
27	Изработка на проектна документација за заштитна ограда на Обиколница на Битола	2.348.200,00
28	Изнајмување на механизација за потребите на контролен пункт Неготино	9.204.000,00
29	Лиценци за антивирус софтвер и софтвер за канцелариско работење	375.988,00
30	Изработка проектна документација за санација на повеќе свлечишта на Р1108 (С.Вода – Кожуф).	7.063.008,00
31	Колективно осигурување на вработените, каско осигурување на возила, осигурување од автоодговорност и осигурување на имот (недвижности и опрема)	1.001.150,00
32	Надзор на рехабилитации на повеќе државни патишта финансирани од Меѓународни финансиски институции	17.698.820,00
33	Изработка на геодетски елаборати	11.800.000,00
34	Експресно пренесување на пратки - брза пошта	472.000,00
37	Изработка на проектна документација за Струмица – Валандово – спој со А1	45.430.000,00
36	Одржување на компјутери и компјутерска опрема	704.460,00
37	Сервисирање и тековно одржување на фискални печатари	1.770.000,00

38	Санација на свлечиште на Р2433 (Радовиш – Конче)	17.431.072,00
39	Надзор на изградба на државен пат Р1402 Делница, Старо Коњарево – Ново Коњарево.	5.859.880,00
40	Изградба на државен пат Р1402, делница Старо Коњарево - Ново Коњарево	82.587.508,00
41	Гориво за службени возила и гориво за агрегати	2.419.000,00
42	Изработка на проектна документација за санација на: - Свлечиште на регионален пат Р1308, делница Претор – Маркова Нога; - Свлечиште (одрон) на регионален пат Р1102, делница Велес – Градско (транзитен дел низ Велес); - Свлечиште на регионален пат Р2241, делница Лабуниште – Јабланица; - Свлечиште на регионален пат Р1201, делница, Џеписhte – Требишта (Р. Албанија); - Свлечиште на регионален пат Р1301, делница: Охрид – Св. Стефан; - Свлечиште на регионален пат Р2249, делница: Мелничани – Горенци (Центар Жупа)	8.793.633,00
43	Технички преглед и регистрација на моторни возила	65.556,00
44	Изработка на проектна документација за санација на потпорни сидови на регионалниот пат Р1202, кај село Јанче и село Скудриње.	2.312.800,00
45	Надзор на градежно санациски работи на мост бр.1, р. Лакавица на Р1103.	1.719.732,00
46	Потрошен материјал за принтери	155.170,00
47	Одржување и надградба на постоечкиот електронски систем за наплата на патарина	3.540.000,00
48	Ситен инвентар	516.845,00
49	Ролни за фискални печатари	5.544.525,00
50	Изработка на проектна документација за мост бр.3 на регионален пат Р1103, делница Лакавица – Неготино	590.000,00
51	Изработка на проектна документација за експресен пат делница Битола-Меџитлија, со обиколница на Битола	46.610.000,00
52	Одржување на згради и објекти	10.620.000,00
53	Изработка на проектна документација за Санација на мост број 1 на Р2244 над река Пчиња, кај с. Драгоманце.	1.168.200,00
54	Пошумување косини на автопат Миладиновци- Штип за стабилизација и заштита од ерозија	15.517.000,00
55	Обележување на патен појас – експроприационен појас, проценка на вредноста на земјиште, земјоделски и шумски култури и вештачење на објекти	5.900.000,00
56	Изработка на проектна документација за реконструкција на делница Струмица - Дабиле	3.540.000,00
57	Хартија за фотокопир и хартија за плотер	1.156.990,00

58	Осветлување на раскрсници, клучки, тунели и мостови на државните патишта.	69.722.746,00
59	Санација на свлечиште на државен пат Р2238, делница Маврово – Галичник	23.482.000,00
60	Патна опрема, подвижни табли со трепкачи за означување на место од патот каде сообраќајна лента е затворена, а сообраќајот се пренасочува	352.820,00
61	Изработка на проектна документација за реконструкција и рехабилитација на државниот пат Р1109.	5.841.000,00
62	Изработка и комплетирање на проектна документација за поврзување на идниот автопат А4, делница Миладиновци – Свети Николе – Штип (клучка Средно Коњаре) со регионалниот пат Р2136.	578.200,00

Врз основа на спроведените постапки за јавни набавки во 2018 година за истите се склучени се 62 договори.



ДИРЕКТОР,
Зоран Китанов
