




РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - REPUBLIKA E MACEDONISE SE VERIUT
ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА
NDËRMARRJA PUBLIKE PËR RRUGË SHETËRORE
Бр.-Nr. 02 - 6353 /
28 -06- 2022 20 год.-viti
СКОПЈЕ - SHKUP

ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА

ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА

за 2021 година

Скопје, 2022

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија (“Службен весник на Република Македонија” број 38/96, 06/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.275/19), ЈП за државни патишта доставува годишен Извештај за своето работење за претходната година до Владата на Република Северна Македонија

СОДРЖИНА:

I.	ВОВЕД.....	4
II.	ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ НА ЈПДП.....	6
III.	ОРГАНОГРАМ НА ЈПДП.....	15
IV.	ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА.....	19
V.	ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ	19
VI.	ИНВЕСТИЦИИ	42
VII.	ЈАВНИ НАБАВКИ.....	62

I. ВОВЕД

Јавното Претпријатие за државни патишта (во натамошниот текст: ЈПДП) е основано на 03.01.2013 со Одлука за основање број 41-10147/1 од 28.12.2012 донесена од Владата на Република Македонија, објавена во Службен Весник на РМ бр.1 од 02.01.2013 година. Претпријатието е запишано во Централен Регистар на РМ со ЕМБС 6839673 и е правен следбеник на Агенцијата за државни патишта Скопје.

Основна цел и дејност на ЈП за државни патишта е планирање, изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на патиштата и управување со државните патишта. Со тоа ЈП за државни патишта останува двигател на патната инфраструктура во Република Северна Македонија.

Надлежности на ЈПДП се:

1. Управување со државните патишта;
2. Постојано следење и контролирање на состојбите на државните патишта;
3. Преземање мерки за рационално користење на средствата наменети за државните патишта;
4. Вршење инвестициски работи од областа на државните патишта;
5. Наплата на надоместоците за користење на јавните патишта;
6. Задолжувања кај домашни и странски финансиски институции;
7. Организирање на изработка на студии и проекти за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување, заштита и наплата на патарина со право нив да ги отстапува на физички и правни лица во согласност со закон;

8. Давање на вршење работи за изградба, реконструкција, рехабилитација и одржување на државните патишта на правни лица во согласност со Закон;
9. Предлагање одлука за започнување на постапка за давање концесија и/или други видови на јавно – приватно партнерство;
10. Издавање одобренија, одобрувања и мислења во согласност со Законот за јавните патишта;
11. Организирање активности што се поврзани со вршење на броење на сообраќај, заштита на државните патишта, катастар на државните патишта и формирање на неопходни бази на податоци;
12. Применување и користење на систем за управување со одржувањето на коловозите (PMS) и систем на управување со одржувањето на мостовите (BMS);
13. Поддршка за изградба, реконструкција и рехабилитација на патишта кои не се државни патишта, врз основа на обврски произлезени од закон.

Извештајот за работењето го опфаќа целокупното работење на Јавното претпријатие за државни патишта за 2021 година, работењето на органите на управување на ЈПДП, работењето на внатрешната ревизија, остварените финансиски резултати за 2021 година, инвестициите во проекти во патната инфраструктура во 2021 година и реализацијата на годишната програма за 2021 година, како и Јавните набавки остварени во 2021 година, во согласност со надлежностите на Јавното претпријатие за државни патишта утврдени во Законот за јавни патишта и Статутот на ЈП за државни патишта.

Согласно Законот за јавни патишта, Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2021 година, е донесена од Управниот Одбор на ЈПДП и за неа е добиена согласност од Владата на Република Северна Македонија.

II. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ НА ЈПДП:

Органи на управување на Јавното претпријатие за државни патишта се:

- Управен одбор,
- Надзорен одбор за контрола на материјално – финансиско работење,
- Директор

1. РАБОТА НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Во текот на 2021 година беа одржани 21 седница на Управен одбор.

На седниците на Управниот одбор беа донесени следните поважни акти и одлуки во врска со работењето на ЈПДП:

- Одлука за избор на Директор на ЈПДП по пат на јавен конкурс за избор на Директор.
- Одлука за разрешување на ВД Директор на ЈПДП.
- Одлука за утврдување на висина на плата на Директорот на ЈПДП.
- Годишна програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2021 година (дополнета).
- Годишна програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2021 година (изменета и дополнета).
- Годишниот План за јавни набавки за 2021 година на Јавното претпријатие за државни патишта.
- Програмата за одржување и заштита на државни патишта за 2021 година со ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионални патишта.
- Склучување на менаџерски договор со Директорот на ЈПДП.
- Одлука за распределба на средствата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици за 2021 година.

- Одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за државни патишта за 2021 година.
- Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за плата на вработените во ЈПДП.
- Одлука за висината на благајничкиот максимум за 2021 година.
- Одлука по повик за донација од Здружение на граѓани обнова Глобал Струмица.
- Одлука по Барање за потребна помош бр.02-156/1 од 8.1.2021 година од Дејан Најдоски од Прилеп.
- Одлука по Барање за исплата на парична помош бр.02-103/2 од 5.1.2021 година, од вработен во ЈПДП – Тони Митровски.
- Одлука по Барање на спонзорство/донаторство бр.02-768/1 од 25.1.2021 година од Унија на карате ветерани.
- Одлука по Приговор против решението за изрекување на дисциплинска мерка парична казна од вработен Ерсан Идризи бр.02-621/1 од 20.1.2021 година.
- Правилник за изменување и дополнување на правилникот за систематизација на работни места во ЈПДП и донесување на Одлука за давање согласност на истиот.
- План за изменување и дополнување на годишниот план за јавни набавки за 2021 година на Јавно претпријатие за државни патишта
- Одлука за усвојување на корегирани Финансиски план за 2021 година.
- Извештајот за извршениот попис на основни средства и ситен инвентар на ЈПДП за 2020 година.
- Одлука за отпис – расходување на основни средства за 2020 година.
- Одлука за отпис – расходување на ситен инвентар за 2020 година.
- Извештајот за попис на состојбата на парични средства, побарувања, обврски и материјално работење на ЈП за државни патишта со состојба на ден 31.12.2020 година.
- Годишна сметка на Јавното претпријатие за државни патишта за 2020 година.

- План за изменување и дополнување на годишниот план за јавни набавки за 2021 година на Јавно претпријатие за државни патишта.
- Одлука по јавен конкурс за избор на заменик на директор на Јавното претпријатие за државни патишта.
- Одлука за прифаќање на Ценовникот за плаќање на услугите на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта бр.02-610/3 од 8.4.2021 година.
- Извештајот од финансиското работење на претпријатието во првиот квартал од 2021 година.
- Одлука за усвојување и донесување Програма за изменување на Програмата за одржување и заштита на државните патишта за 2021 година.
- Одлука за отпочнување постапка за задолжување со државна гаранција за финансирање на изградба на автопатска делница Букојчани – Кичево, како дел од европскиот коридор 8 (државен пат А2).
- Одлука за висина на надоместокот на членовите на Управен одбор.
- Одлука за висината на надоместокот на членовите на Надзорен одбор за контрола на материјално финансиско работење.
- Правилникот за изменување на правилникот за систематизација на работни места во ЈПДП и донесување на Одлука за давање согласност на истиот.
- Правилникот за изменување на правилникот за наградување на вработените во ЈПДП.
- Одлука за отпочнување постапка за задолжување заради издавање на банкарска гаранција за потребата за постапка за експропријација за државен пат А4 делница Штип - Радовиш.
- Одлука за отпочнување постапка за задолжување заради издавање на банкарска гаранција за потребата за постапка за експропријација за државен пат А2 делница Ранковце – Крива Паланка.
- Одлука за отпочнување постапка за задолжување заради издавање на банкарска гаранција за потребата за постапка за експропријација за државен пат А4 Миладиновци – Свети николе – Штип делница Свети Николе - Штип за одводнување.

- Одлука за отпочнување постапка за задолжување заради издавање на банкарска гаранција за потребата за постапка за експропријација за реконструкција на магистрален пар А1 (постоечки Р106) Прилеп – Градско, делница од излез на прилеп (б.станица Лук Оил) до мост на р.Ленишка со патен јазол Прилеп.
- План за изменување и дополнување на годишниот план за јавни набавки за 2021 година на Јавно претпријатие за државни патишта.
- Одлука за склучување на Колективен договор за изменување на Колективниот договор на ЈПДП со Синдикатот на ЈПДП.
- Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за државни патишта за 2020 година.
- Одлука за исплата на регрес за годишен одмор за 2021 година.
- Одлука по Молба за еднократна помош за градба на кука и недостаток на финансиски средства од вработен Мухамедали Абдулахи бр.02-5760/1 од 4.6.2021 година.
- Одлука за уредување на односите на Заменикот директор на ЈПДП (Менаџерски договор) со ЈПДП.
- Одлука за донација на парични средства на Здружението Културен Забавен Живот.
- Одлука за висината на надоместоците на членови на УО, записничар и помошник записничар бр.02-5758/6 од 4.6.2021 година.
- План за дополнување на годишниот план за јавни набавки за 2021 година на Јавно претпријатие за државни патишта.
- Одлука за висина на надоместокот на членовите на Управен одбор.
- Одлука за висината на надоместокот на членовите на Надзорен одбор за контрола на материјално финансиско работење.
- Одлука за давање на согласност на Барање за санирање на зимски пунктови.
- Извештајот за финансиско работењето на Јавното претпријатие за државни патишта за вториот квартал 2021 година.
- Извештајот за финансиско работењето на Јавното претпријатие за државни патишта за првото полугодие 2021 година.

- Одлука по Барање за исплата на парична помош од вработената Менсуре Рашитовиќ бр.02-8091/1 од 9.8.2021 година.
- Одлука по Барање за исплата на парична помош од вработениот Тоше Миовски бр.02-8552/1 од 23.8.2021 година.
- Одлука по Барање за донација од СОС Детско село бр.02-8710/1 од 27.8.2021 година.
- Решение за службено патување во странство на Директорот на ЈПДП бр.02-8840/1 од 2.9.2021 година.
- Одлука за разрешување и именување на помошник записничари на Управен одбор.
- Одлука за изменување на Одлуката за висината на надоместокот на членови на УО, записничар и помошник записничарите бр.02-7972/13 од 4.8.2021 година.
- Одлука за усвојување на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за одржување и заштита на државните патишта за 2021 година.
- Одлука по одлучување по Барање од страна на ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта.
- Извештајот за финансиско работењето на Јавното претпријатие за државни патишта за третиот квартал 2021 година.
- Одлука за усвојување на Финансиски план за 2022 година.
- Одлука за определување право на користење на службен мобилен телефон со ограничување на висината на месечниот лимит на сметка до определен износ.
- Одлука по Барање за финансиска помош од вработената Менсуре Рашитовиќ бр.02-8091/1 од 9.8.2021 година.
- Одлука по Барање за финансиска помош од вработениот Тоше Миовски бр.02-8552/1 од 23.8.2021 година.
- Одлука по Барање за финансиска помош од вработениот Садат Садики бр.04-9228/1 од 15.9.2021 година.
- Одлука по Барање за донација од СОС Детско село бр.02-8710/1 од 27.8.2021 година.

- Одлука по Приговор врз основа на решението за изрекување на дисциплинска мерка парична казна бр.04-9229/5 од 13.10.2021 година од вработениот Анастасе Паунков.
- Решение за службено патување во странство на Директорот на ЈПДП, бр.на Барање 02-12474/1 од 14.12.2021 година.
- Одлука за усвојување на Финансовиот план на ЈПДП за 2022 година.
- Одлука за усвојување и донесување Програма за изменување и дополнување на Програмата за одржување и заштита на државните патишта за 2021 година.
- Одлука за склучување на Колективен договор за дополнување на Колективниот договор на ЈПДП со Синдикатот на ЈПДП.
- Одлука по Жалба врз основа на решението за изрекување на дисциплинска мерка парична казна бр.04-9737/11 од 15.12.2021 година од вработениот Ердин Османи.
- Одлука по Приговор врз основа на решението за изрекување на дисциплинска мерка парична казна бр.04-9645/12 од 15.12.2021 година од вработениот Бојан Ристовски.
- Одлука по Барање за поништување на образецот за оценување на давателот за јавна услуга за 2021 година и Ревизија на целокупното работење на Секторот за контрола бр.10-11937/4 од 10.12.2021 година од вработениот Беким Џемаили.
- План за изменување на Годишниот план за јавни набавки за 2021 година на ЈПДП.

2. РАБОТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО - ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ

Во текот на 2021 година беа одржани 14 седници на Надзорниот одбор за контрола на материјално – финансиско работење на ЈПДП.

На седниците Надзорниот одбор ги разгледа и даде мислење по однос на следните поважни акти и одлуки во врска со работењето на ЈПДП:

- Давање мислење на Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2021 година.
- Давање мислење на Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2021 година (изменета и дополнета).
- Давање Одобрение на Годишниот план за јавни набавки за 2021 година на Јавното претпријатие за државни патишта бр.02-992/9 од 29.1.2021 година.
- Давање одобрение на Програмата за одржување и заштита на државните патишта за 2021 година со ЈП за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта.
- Давање одобрение на Одлуката за распределба на средствата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на општинските патишта и улици за 2021 година, со бр.02-992/13 од 29.1.2021 година.
- Давање Одобрение на Одлуката за висината на благајничкиот максимум за 2021 година, донесена од Управниот одбор со бр.02-992/16 од 29.1.2021 година.
- Давање мислење на корегирани Финансиски план за 2021 година.
- Давање мислење за Годишна сметка на Јавното претпријатие за државни патишта за 2020 година.
- Разгледување и давање одобрение на Планот за измена и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2021 година со бр.02-2314/5 од 3.3.2021 година.
- Разгледување и давање одобрение на Планот за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2021 година со бр.02-3093/7 од 23.3.2021 година.
- Давање мислење за Извештајот од финансиското работење на претпријатието во првиот квартал од 2021 година.

- Давање одобрение за отпочнување постапка за задолжување со државна гаранција за финансирање на изградба на автопатската делница Букојчани – Кичево, како дел од европскиот дел 8 (државен пат A2).
- Давање одобрение за отпочнување постапка за задолжување заради издавање на банкарска гаранција за потребата за постапка за експропријација на државен пат на автопат A4 Миладиновци – Свети Николе – Штип, делница Свети николе – Штип за одводнување.
- Давање мислење за Извештајот од финансиското работење на претпријатието во четвртиот квартал од 2020 година.
- Разгледување и давање одобрение на Планот за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2021 година со бр.02-7154/4 од 12.7.2021 година.
- Давање Одобрение на Одлуката за исплата на регрес за годишен одмор за 2021 година бр. 02-7154/4 од 12.7.2021 година, донесена од страна на Управниот одбор.
- Давање мислење на Извештајот за финансиското работење на претпријатието во вториот квартал од 2021 година.
- Давање мислење на Извештајот за финансиското работење на претпријатието во првото полугодие од 2021 година.
- Разгледување и давање одобрение на Планот за изменување и дополнување на Годишниот план за јавни набавки за 2021 година со бр.02-7972/12 од 4.8.2021 година.
- Давање Мислење на Финансискиот извештај од финансиското работење на претпријатието во третиот квартал од 2021 година.
- Разгледување и давање мислење на корегирани Финансиски план за 2022 година со бр.05-11261/1 од 11.11.2021 година.
- Разгледување и давање Одобрение на Одлуката за исплата бонус во 2021 година бр.12866/7 од 23.12.2021 година, донесена од Управен одбор на ден 23.12.2021 година.
- Разгледување и давање Одобрение на Планот за изменување на Годишниот план за јавни набавки за 2021 година на ЈПДП бр.02-992/9 од 29.1.2021 година,

бр.02-2314/5 од 3.3.2021 година, бр.02-3093/7 од 23.3.2021 година, бр.02-7154/4 од 12.7.2021 година и бр.02-7972/12 од 4.8.2021 година, заведен под бр.02-12906/12 од 24.12.2021 година, донесена од страна на Управниот одбор.

3. ДИРЕКТОР НА ЈПДП


Со Јавното претпријатие за државни патишта раководи Директор, кој има заменик што го заменува и го води тековното работење на јавното претпријатие во негово отсуство. Управниот одбор на Јавното претпријатие за државни патишта донесе Одлука за разрешување на вршителот на должност Директор на Јавното претспријатие за државни патишта бр.02-332/4 од 12.01.2021 година и Одлука за избор на директор по јавен конкурс за избор на директор бр.02-332/3 од 12.01.2021 година по распишан јавен конкурс на ден 25.12.2020 година. За Директор на Јавното претпријатие за државни патишта е избран Ејуп Рустеми сметано од 12.01.2021 година.

Управниот одбор на Јавното претпријатие за државни патишта донесе Одлука за избор на заменик на директор по јавен конкурс за избор на заменик на директор бр.02-3093/8 од 23.03.2021 година по распишан јавен конкурс на ден 05.03.2021 година. За Заменик на директорот на Јавното претпријатие за државни патишта е избран Благојче Трпевски сметано од 29.03.2021 година.

Работата на ВД Директорот и Директорот на ЈПДП во текот на 2021 година беше насочена кон реализацијата на Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државни патишта, и грижата за законитоста во работењето и примена на прописите, статутот и другите акти на претпријатието. ВД Директорот а потоа Директорот работеше спроведувајќи ги одлуките и заклучоците на Управниот одбор на Јавното претпријатие, организираше и раководеше со процесот на работењето на ЈПДП, ја реализираше Годишната програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на државните патишта за 2021 година. Исто така, склучуваше договори за реализација на програмите и други договори за потребите од тековното работење на Јавното претпријатие. Редовно ги вршеше сите останати надлежности утврдени со

Статутот на Јавното претпријатие, во насока на обезбедување законитост во работењето и реализација на главните цели и задачи на Јавното претпријатие за државни патишта.

III. ОРГАНОГРАМ НА ЈПДП

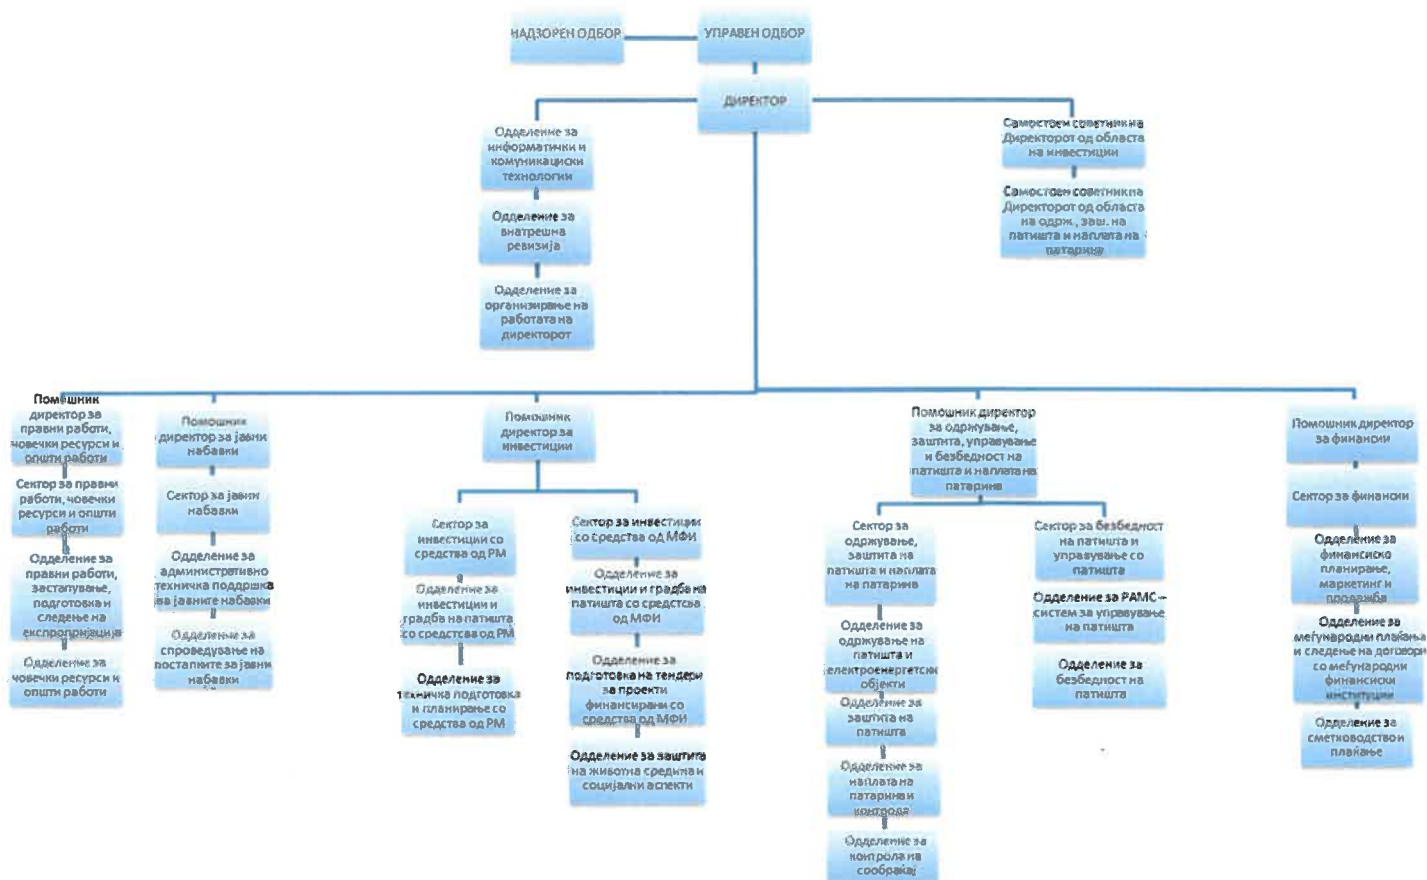

Во рамките на Јавното претпријатие за државни патишта утврдени се:

- 7 посебни работни места и тоа: 5 Помошници директори и 2 самостојни советници на директорот,
- 3 самостојни одделенија, како организациони единици кои не се во рамки на Сектор, туку се под директна надлежност на Директорот на Јавното претпријатие и тоа: Одделение за внатрешна ревизија, Одделение за информатички и

комуникациски технологии и Одделение за организирање и поддршка на работата на Директорот

- 7 Сектори, како организациони единици под директна надлежност на Помошник директор и 18 Одделенија во рамките на секторите и тоа:

1. СЕКТОР ЗА ФИНАНСИИ

- 1.1 Одделение за финансиско планирање, маркетинг и продажба
- 1.2 Одделение за меѓународни плаќања и следење на договори со меѓународни финансиски институции
- 1.3 Одделение за сметководство и плаќање

2. СЕКТОР ЗА ПРАВНИ РАБОТИ, ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ОПШТИ РАБОТИ

- 2.1 Одделение за правни работи, застапување, подготовка и следење на експропријација
- 2.2 Одделение за човечки ресурси и општи работи

3. СЕКТОР ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

- 3.1 Одделение за административно-техничка поддршка за јавни набавки
- 3.2 Одделение за спроведување на постапките за јавни набавки

4. СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИИ СО СРЕДСТВА ОД РМ

- 4.1 Одделение за инвестиции и градба на патишта со средства од РМ
- 4.2 Одделение за техничка подготовка и планирање со средства од РМ

5. СЕКТОР ЗА ИНВЕСТИЦИИ СО СРЕДСТВА ОД МФИ

- 5.1 Одделение за инвестиции и градба на патишта со средства од МФИ
- 5.2 Одделение за подготовка на тендери за проекти финансирани со средства од МФИ
- 5.3 Одделение за заштита на животна средина и социјални аспекти

6. СЕКТОР ЗА ОДРЖУВАЊЕ, ЗАШТИТА НА ПАТИШТА И НАПЛАТА НА ПАТАРИНА

- 6.1 Одделение за одржување на патишта и електроенергетски објекти
- 6.2 Одделение за заштита на патишта
- 6.3 Одделение за наплата на патарина и контрола
- 6.4 Одделение за контрола на сообраќај

7. СЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПАТИШТА И УПРАВУВАЊЕ СО ПАТИШТАТА

1.1 Одделение за РАМС – систем за управување со патиштата

1.2 Одделение за безбедност на патиштата

Вкупниот број на вработени во Претпријатието на 31 декември 2021 година изнесува 483, од кои 362 вработени на неопределено време и 121 преку Агенција за привремени вработувања до 31.12.2021. Во текот на 2021 година, во Јавното претпријатие за државни патишта работен однос засноваа вкупно 8 лица на неопределено време, по пат на превземање од Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците согласно Законот за преземање на административни службеници вработени преку К5 програма во Министерство за политички систем и односи меѓу заедниците. .

Просечната исплатена бруто плата во 2021 година изнесува 47.661 денари, а просечната нето плата 31.512 денари. Месечните примањата на членовите на Управен и Надзорен одбор на ЈПДП изнесуваат: Претседател 12.000 денари, заменик претседател 11.000 денари, членови 10.000 денари. Како надоместок за материјални трошоци односно трошоци за користење на мобилен телефон и патни трошоци на Претседателот, Заменикот претседател и членовите на УО и НО им се плаќа месечен надомест од 2.000 денари.

Во Јавното претпријатие за државни патишта во 2021 година вкупниот број на влезни/интерни/излезни документи изнесува 38.018 од кои: 17.414 се влезни документи, 6.677 се интерни документи и 13.927 се излезни документи.

Приказ на број на влезни/интерни/излезни документи во ЈПДП за 2021 по сектори:

Сектор		Влезни документи	Интерни документи	Излезни документи	Вк.
1	Организација и развој	0	1	0	1

2	Управување и раководење	304	1054	197	1555
3	Канцелариско архивски општи и правни работи	3170	863	1093	5126
4	Човечки ресурси	68	2601	121	2790
5	Финансиско и материјално работење	4190	95	245	4530
6	Одбрана и безбедност	0	0	0	0
7	АОП	0	0	0	0
8	Јавни набавки	347	1299	1240	2886
9	Инвестиции	4934	139	987	6060
10	Одржување и заштита на патишта, наплата на патарина и контрола, безбедност и управување на патишта	4209	598	9920	14727
11	Внатрешна ревизија	1	9	8	18
12	ИПА	156	6	85	247
13	ИКТ	35	12	31	78

IV. ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Во Годишниот план за извршување на внатрешна ревизија за 2021 година планирани се 3 ревизии и тоа:

- Системска ревизија на ИПА II, зајакнување на системот на внатрешни контроли на Единицата поврзана со ИПА и мониторинг согласно со договорот во Единицата за управување со средствата од инструментот за претпристапна помош – ИПА
- Ревизија на инвестициони проекти за градба
- Ревизија по барање на Директорот -

Планираните ревизии согласно Годишниот План за 2021 год., за извршување на внатрешна ревизија се реализирани.

V. ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ

Финансиските извештаи, се составени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Правилникот за сметководство (Сл.весник на РМ бр.159/2009) и применливи од 1 јануари 2010 година.

Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 декември 2021 и 2020 година. Таму каде што е потребно, споредбените податоци се прилагодени и усогласени со цел да одговараат на извршеното прикажување во тековната година.

Согласно Законот за трговски друштва и Правилникот за водење сметководство, Јавното претпријатие за државни патишта е должно да води сметководствена евиденција на капиталот, средствата, побарувањата, обврските, приходите, трошоците и да го утврди финансискиот резултат од работењето по Годишната сметка.

Финансиските средства кои ЈПДП ги користи за изградба, реконструкција, одржување и заштита на јавните патишта, согласно Законот за јавни патишта се обезбедуваат од:

1. Дел од акцизата од деривати од нафта;
2. Надоместок за употреба на јавните патишта за моторни и приклучни возила (патна такса);
3. Надоместок за употреба на јавен пат, негов дел или објект на патот (патарина);
4. Надоместок за:
 - а) поставување натписи и рекламни табли во заштитниот појас на државните патишта,
 - б) приклучување на пристапен пат на државен пат,
 - в) поставување инсталации во трупот на патот, во патниот и заштитниот појас на државен пат,
 - г) изградба и користење на комерцијални објекти на кои е дозволен пристап на државен пат надвор од населено место,
 - д) прекумерно користење на државен пат,
 - ѓ) вонреден превоз на државен пат и
 - е) штета сторена на патот и објектите на патот;
5. Средства од Буџетот на Република Северна Македонија;
6. Заеми и кредити и
7. Други приходи

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето односно дека Претпријатието ќе продолжи да работи во догледна иднина. Претпријатието нема намера, ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење.

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА

Билансот на состојба ја покажува состојбата на средствата и изворите на претпријатието на 31.12.2021 година. Билансот на состојба е статички и кумулативен преглед, кој го набљудува претпријатието во даден момент и ја прикажува состојбата на средствата, изворите и капиталот кои произлегуваат од сите активности во претпријатието од неговото основање до денот на составување на билансот. Вредностите на ставките во Билансот на состојба се искажани според нивниот износ при набавка на средството, корегирани за промените што настанале.

Паричните средства се водат во билансот на состојба според номиналната вредност. Паричните средства се состојат од денарска и девизна жиро сметка, готовина во благајна.

Побарувањата за дадени аванси се признаваат во висина на нивната номинална вредност и се состојат од дадени аванси на изведувачи.

Авансите за основни средства претставуваат средства дадени на добавувачи за набавка на основни средства и се искажуваат во висина на нивната номинална вредност.

Недвижности, постројки и опрема се евидентираат по нивната набавна вредност.

Амортизацијата на основните средства се пресметува врз основа на право-пропорционална метода во текот на проценетиот век на употреба на основните средства. Амортизација на инвестициите во тек не се пресметува се додека средствата во изградба не се активираат.

Обврските спрема добавувачи се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

Обврските по кредити се состојат од обврски по долгорочни кредити земени од Меѓународни финансиски институции (Светска банка, ЕБОР и Ексим банка) и се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата

се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

Резервации (резерви за обврски) се признаваат кога Претпријатието има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан, кога е веројатно дека ќе настанат идни одливи на средства по тој основ и кога е можно да се процени износот на обврската. Кога се очекува надоместување на дел од ваква обврска во иднина, надоместувањето се признава како посебно средство, но само кога е извесно дека ќе биде примено истото. Расходот за било која резервација се признава во билансот на успех намалено за износот на надоместувањето.

во илјади денари

1. БИЛАНС НА СОСТОЈБА	ОСТВАРЕНО претходна година	ОСТВАРЕНО тековна година	Споредбена анализа оств. тек. / оств. претх. (%)	Структурна Анализа Тековна година (%)
--------------------------	----------------------------------	--------------------------------	--	--

АКТИВА

Парични средства	1,191,199	2,193,563	1.84	1.91
Побарувања	178,288	217,896	1.22	0.19
Залихи	1,503	1,670	1.11	0.00
Краткорочни финансиски средства	0	0	-	0.00
Други тековни средства (АВР)	7,015	55,122	7.86	0.05
Тековна актива	1,378,005	2,468,251	1.79	2.15
Материјални средства и вложувања во недвижности	106,491,015	112,504,058	1.06	97.83
Долгорочни финансиски вложувања	0	0	-	0.00
Нематеријални средства	8,763	1,159	0.13	0.00
Долгорочни финансиски средства	35,055	21,010	0.60	0.02

Нетековна актива	106,534,832	112,526,227	1.06	97.85
Вкупна актива	107,912,837	114,994,478	1.07	100.00
Вонбилансна актива	0	0	-	0.00
Краткорочни обврски	7,464,504	7,232,060	0.97	6.29
Одложено плаќање на трошоци и приходи (ПВР)	2,305,871	2,196,970	0.95	1.91
Тековни обврски	9,770,376	9,429,030	0.97	8.20
Долгорочни обврски	38,038,820	43,973,023	1.16	38.24
Други долгорочни обврски и резервирања за ризици и трошоци	193,956	209,063	1.08	0.18
Нетековни обврски	38,232,776	44,182,086	1.16	38.42
Вкупно обврски	48,003,152	53,611,116	1.12	46.62
Капитал	5,000	5,000	1.00	0.00
Акумулирана добивка	42,627,572	45,512,573	1.07	39.58
Резерви	2,885,001	4,595,660	1.59	4.00
Ревалоризациони резерви	9,796,453	9,796,453	1.00	8.52
Добивка/ Загуба за деловната година	4,595,660	1,473,676	0.32	1.28
Вкупен капитал	59,909,686	61,383,362	1.02	53.38
Вкупно обврски и капитал	107,912,837	114,994,478	1.07	100.00
Вонбилансна пасива	0	0	-	0.00

Вкупната актива/пасива во Билансот на состојба во 2021 година изнесува 114.994.477.929 денари. Во однос на претходната 2020, кога изнесувала 107.912.837.417 денари, бележи зголемување од 7%. Во активата најголемо зголемување, согласно структурната и споредбената анализа, има во материјалните средства и вложувања во недвижности т.е инвестициите во тек, и исто така во тековните средства зголемување има кај паричните средства на претпријатието. Додека во пасивата, зголемувањето е најголемо кај долгорочните обврски т.е. обврските по заеми и кредити кај краткорочните обврски, а пак краткорочните обврски бележат намалување за разлика од претходната година.

2. БИЛАНС НА УСПЕХ

Билансот на успех ги покажува вкупно остварените приходи и расходи од работењето на ЈПДП за 2021 година и финансискиот резултат за истата година.

во илјади
денари

2. БИЛАНС НА УСПЕХ	ОСТВ. претходна година	ПЛАН. тековна година	ОСТВ. тековна година	Спор. анал. тек. /претх. (%)	Спор. анал. план. /тек. (%)	Структ. анал. тек. год. (%)
Приходи од продажба	3,747,737	3,900,000	4,630,296	1.24	1.19	55.61
Останати оперативни приходи	3,213,576	3,043,000	3,696,521	1.15	1.21	44.39
Вкупно оперативни приходи	6,961,313	6,943,000	8,326,816	1.20	1.20	100.00
Потрошени сировини, материјали и енергија	102,623	92,150	104,390	1.02	1.13	2.35
Трошоци за вработените	244,184	320,000	273,890	1.12	0.86	6.17
Амортизација на материјални средства	2,066,046	1,900,000	1,957,223	0.95	1.03	44.09
Вредносно усогласување на тековни средства	57,285	0	66,532	0.00	/	1.50
Останати оперативни расходи	1,836,719	1,624,700	2,036,865	1.11	1.25	45.89
Вкупно оперативни расходи	4,306,856	3,936,850	4,438,899	1.03	1.13	100.00
Добивка од оперативно работење	2,654,457	3,006,150	3,887,917	1.46	1.29	0.00

Приходи од финансирање	3,022,065	802,000	699,350	0.23	0.87	0.00
Расходи од финансирање	884,968	1,060,000	3,106,232	3.51	2.93	0.00
Добивка пред оданочување	4,791,554	2,748,150	1,481,035	0.31	0.54	0.00
Данок на добивка	195,894	0	7,358	0.04	0.00	0.00
Нето добивка / загуба	4,595,660	2,748,150	1,473,676	0.32	0.54	0.00

Во првиот дел од Билансот на успех се содржани оперативните приходи, кои изнесуваат 8.326.816.042 денари, и оперативните или општите трошоци, кои изнесуваат 4.438.899.107 денари. Нивната разлика ја дава оперативната добивка или добивка од работењето, која за тековната година изнесува 3.887.916.935 денари. Оперативната добивка во 2021 година е поголема од претходната 2020 година за 29%.

Во вториот дел ставките во најголема мера се од екстерна природа и на нив претпријатието речиси и не може да влијае. Како показател за успешноста на работењето во анализите претставува оперативната добивка, за разлика од нето добивката над која што најголемо влијание имаат курсните разлики. Добивката пред оданочување за 2021 година изнесува 1.481.034.925 денари, и истата е помала од претходната. Нето добивката во 2021 година изнесува 1.473.676.472 денари.

3. СПЕЦИФИЦИРАНИ ПРИХОДИ

Приходите се признаваат доколку е веројатно дека идните економски користи ќе бидат прилив за Претпријатието и доколку овие користи може веродостојно да се измерат. Приходите на Претпријатието се економски користи кои настануваат во текот на разгледуваниот период, кои произлегуваат од редовните активности на истото. Приходите на Претпријатието произлегуваат од надоместоците утврдени со Законот за јавни патишта. Приходите од камати се признаваат за временскиот период за кој истите се одесуваат.


во илјади денари

3. СПЕЦИФИРАНИ ПРИХОДИ	ОСТВ. претходна година	ПЛАН. тековна година	ОСТВ. тековна година	Спор. анал. тек. / оств. претх. (%)	Спор. анал. оств. / план. (%)	Структ. анал. тек. год. (%)
Приходи од дејноста						
Приходи регистрација	1,644,360	1,700,000	1,759,819	1.07	1.04	19.50
Приходи патарина	2,080,883	2,200,000	2,844,804	1.37	1.29	31.52
Приходи од вонреден превоз	20,099	20,000	21,179	1.05	1.06	0.23
Приход од рекламни табли, инсталации, пристапен пат, прекоп и друго	2,395	3,000	4,493	1.88	1.50	0.05
Приходи од акциза	3,078,415	3,000,000	3,564,333	1.16	1.19	39.49
Останати приходи од работењето	135,162	20,000	132,188	0.98	6.61	1.46
Вкупни оперативни приходи	6,961,313	6,943,000	8,326,816	1.20	1.20	92.25
Останати приходи						
Позитивни курсни разлики	3,004,322	780,000	694,840	0.23	0.89	7.70
Приходи од камати	17,743	22,000	4,511	0.25	0.21	0.05
Вкупно останати приходи	3,022,065	802,000	699,350	0.23	0.87	7.75
Вкупно приходи	9,983,378	7,745,000	9,026,166	0.90	1.17	100.00

Во 2021 година ЈП за државни патишта оствари приходи во вкупен износ од 9.026.166.496 денари.

Графички приказ бр.1: Остварени приходи во однос на план. приходи за 2021

година

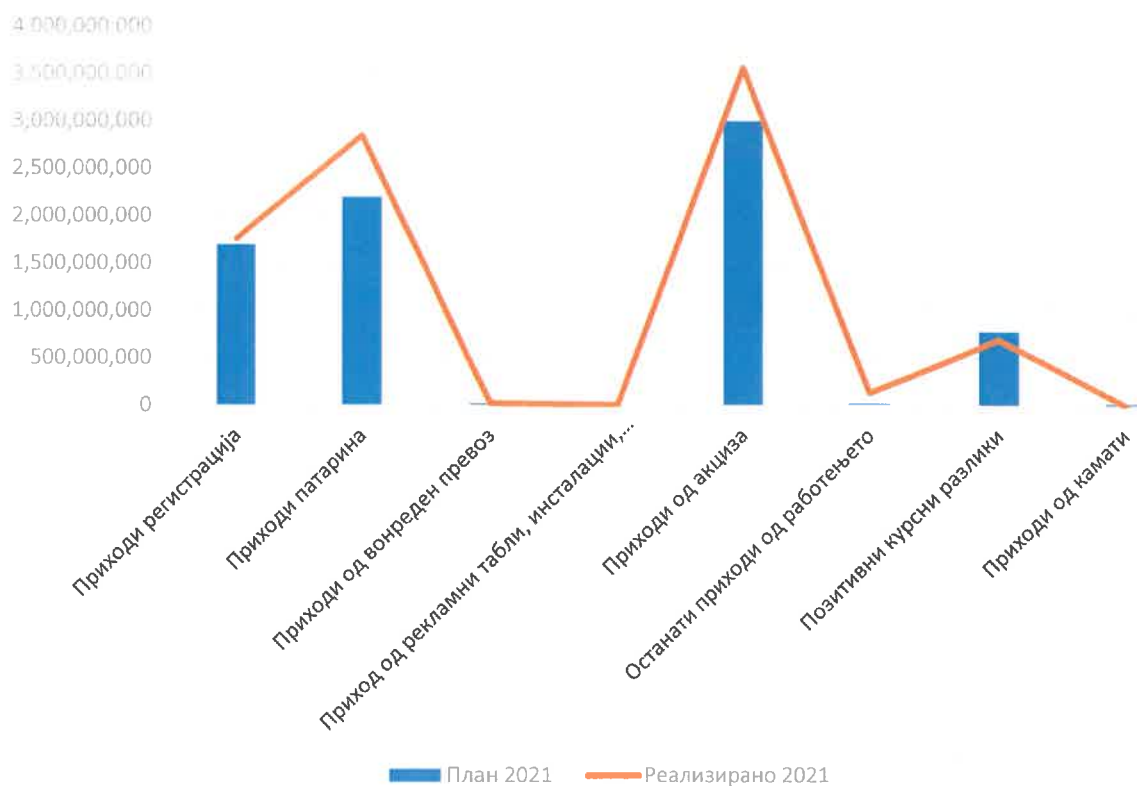

Графички приказ бр.2: Приходите остварени во 2021 година споредбено со 2020 година



Оперативните приходи за 2021 година изнесуваат 8.326.816.042 денари, и истите се во рамките на планираното. Оперативните приходи во претходната 2020 година изнесуваат 6.961.313.196 денари и истите во 2021 година бележат зголемување од 20%. Најголемо зголемување согласно структурната анализа и споредбената анализа во дадена во табелата бр.3 претпријатието бележи кај приходите од патарина.

Согласно Законот за јавни патишта, тука во оперативните приходи спаѓаат: надоместокот за употреба на јавен пат, негов дел или објект на патот (патарина), надоместокот за употреба на јавните патишта за моторни и приклучки возила (патна такса) што се плаќа при регистрација на возилата, и други приходи кои произлегуваат од работењето.

Висината на надоместокот за употреба на јавните патишта за моторни и приклучни возила (патна такса) што се плаќа при регистрација на возилата, еднаш годишно, се определува во зависност од влијанието на возилото врз оштетувањето на патот. Во 2021 година од овој надоместок, оставрен е приход во износ од 1.759.818.905 денари. Остварениот износ е во рамките на планираното и истиот е поголем за 7% во однос на претходната година. Од приходот од надоместокот за употреба на јавните патишта за моторни и приклучни возила – патна такса, е намален за исплатите на имателите на моторни и приклучни возила со кои се врши меѓународен сообраќај. Согласно Одлуката за висината и начинот на плаќање на надоместокот за употреба на јавните патишта за моторните и приклучните возила (патна такса), се утврдува правото за враќање на дел од уплатениот износ сразмерно на времето што моторните и приклучните возила го поминале надвор од Република Северна Македонија.


Висината на надоместокот за употреба на јавен пат, негов дел или објект на патот (патарина) е определена во зависност од должината на делницата на која се наплаќа надоместокот и од категоријата на возилата. Во 2021 година овој приход изнесува 2.844.804.040 денари и истиот е за 29% поголем во споредба со претходната година.

Во други приходи од работењето влегуваат разни надоместоци што се плаќаат на магистралните и регионалните патишта, како што се надоместокот за поставување на натписи и рекламни табли во заштитниот појас на државен пат, приклучување на пристапен пат на државен пат, поставување на инсталации во тропот на патот и патниот појас на државен пат, изградба и користење на комерцијални објекти на кој е дозволен пристап на јавен пат надвор од населено место, за прекумерно користење на државен пат, за вонреден превоз и за штета на државен пат и на објектите на патот.

Делот од акцизата од дериватите од нафта, изнесува 3.564.332.674 денари. Согласно Законот за јавните патишта овие средства се трансферираат од Буџетот на Република Северна Македонија на сметка на Јавното претпријатие најмалку четири пати годишно, во интервали од најмалку три календарски месеци.

Останатите приходи за 2021 година изнесуваат 699.350.454 денари. Во останати приходи влегуваат позитивните курсни разлики и приходите од камати. Приходите од камати се признаваат за временскиот период за кој истите се однесуваат. Овие приходи се поголеми од претходната година и истите во најголема мера се од екстерна природа, и поради тоа претпријатието тешко може да ги испланира и да влијае на нивната реализација.

Графички приказ бр.3: Учеството на поединечните приходи во вкупно остварените приходи за 2021 година

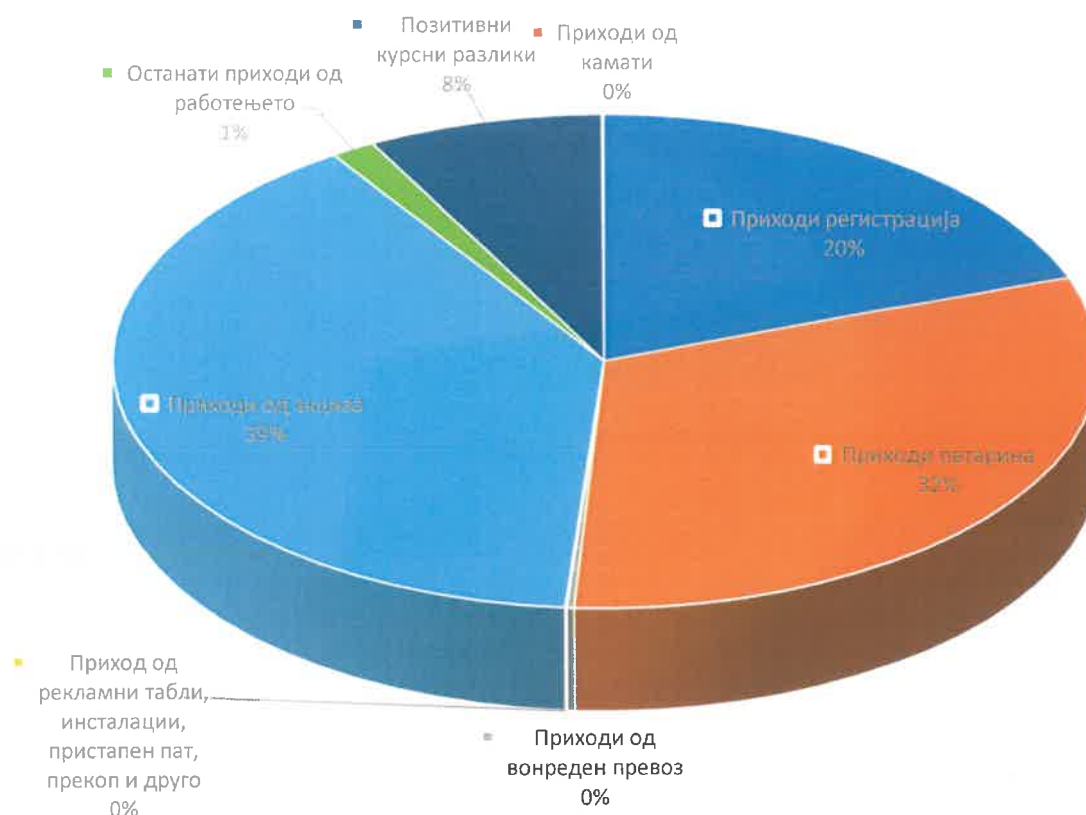

4. СПЕЦИФИЦИРАНИ РАСХОДИ

Расходите се признаваат во билансот на успех кога се јавува намалување на идните економски користи поврзано со намалување на дадено средство или зголемување на дадена обврска кое може веродостојно да се измери. Расходите се признаваат врз основа на нивната директна поврзаност помеѓу направените трошоци и заработувањето на конкретните приходи.

4. СПЕЦИФИРАНИ РАСХОДИ	ОСТВ. Прет. година	ПЛАН. Тек. година	ОСТВ. Тек. година	Спор. анал. тек. / претх. год (%)	Спор. анал. оств. / план. (%)	Струк т. анал. тек. год. (%)
Расходи од дејноста						
Трошоци за потрошен материјал, ситен инвентар и гориво	20,667	17,150	9,623	0.47	0.56	0.13


Трошоци за енергија	81,957	75,000	94,767	1.16	1.26	1.26
Плата, надоместоци за плата и останати трошоци за вработените	244,184	320,000	273,890	1.12	0.86	3.63
Амортизација	2,066,046	1,900,000	1,957,223	0.95	1.03	25.94
Трошоци за одржување на објекти и патишта	1,048,235	950,000	1,214,504	1.16	1.28	16.10
Комунални и други услуги	241,634	142,000	282,599	1.17	1.99	3.75
Провизија за здруженија за технички преглед	72,902	63,000	77,826	1.07	1.24	1.03
Трансфери до ЕЛС	300,000	300,000	298,208	0.99	0.99	3.95
Банкарски трошоци	22,965	22,700	29,088	1.27	1.28	0.39
Други трошоци од работењето	208,267	147,000	201,171	0.97	1.37	2.67
Вкупно оперативни расходи	4,306,856	3,936,850	4,438,899	1.03	1.13	58.83
Останати раходи						
Камата по кредити	290,568	300,000	283,220	0.97	0.94	3.75
Негативни курски разлика	594,400	760,000	2,823,013	4.75	3.71	37.42
Вкупно останати расходи	884,968	1,060,000	3,106,232	3.51	2.93	41.17
Вкупно расходи	5,191,824	4,996,850	7,545,132	1.45	1.51	100.00

Во 2021 година ЈП за државни патишта оствари расходи во вкупен износ од 7.545.132.571 денари. Зголемувањето на вкупните расходи во 2021 година во однос на претходната година се должи на негативните курсни разлики.

Графички приказ бр.4: Остварени расходи во однос на планирани расходи за 2021 година



Графички приказ бр.5: Остварени расходи за 2021 година во однос на истите расходите за 2020 година

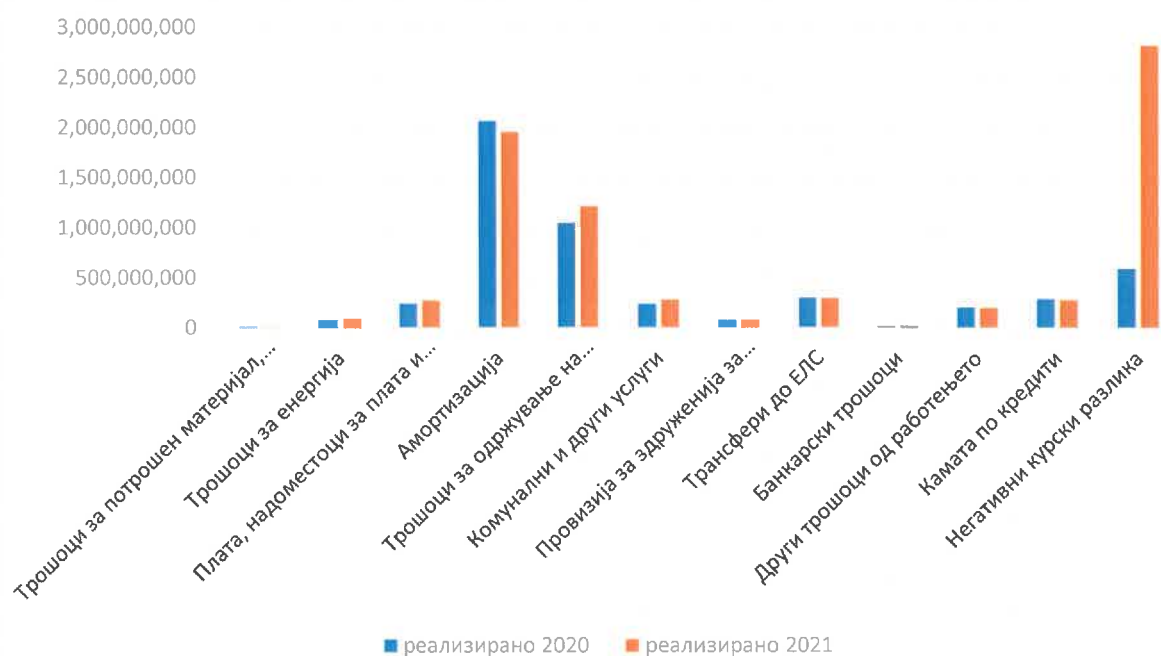


Оперативните расходи за 2021 година изнесуваат 4.438.899.107 денари. Оперативните расходи во претходната година изнесуваат 4.306.856.168 денари и истите во 2021 година бележат зголемување за 3%.

Согласно структурираната анализа и процентуалното зголемување, зголемување е забележано кај трошоците за енергија и комуналните трошоци. Тие се резултат на осветлување и сигнализација на патиштата, клучките и објектите на претпријатието, зголемен надомест за вода и одводнување, прочистување на отпадни и атмосферски води, трошоци за интернет и сл. Согласно структурираната анализа и процентуалното зголемување, поголемо зголемување на оперативните трошоци се забележува кај трошоците за одржување на објекти и патишта. Тоа се должи на зголемени исплати за одржување на државните патишта кон Македонија пат. Исто така, зголемување во однос на претходната година се забележува и во ставката плата и останати трошоци за вработени. Тоа се должи на зголемената ангажираност на вработените (инкасантите) на наплатните станици, заради зголеменена фреквенција на возила во споредба со 2020 година, која поради пандемијата беше значително намалена.

Останатите расходи за 2021 година изнесуваат 3.106.232.464 денари. Во останати расходи влегуваат негативните курсни разлики и каматите по кредити. Вкупно останатите расходи бележат зголемување во однос на претходната година поради поголеми негативни курсни разлики. Имено, Претпријатието ја води својата сметководствена евиденција и известува во денари. Трансакциите во странска валута се евидентираат по важечкиот курс на странската валута на денот на трансакцијата. Извршена е пресметка на сите обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата. Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи или расходи од финансирање. Најголем број од трансакциите на Претпријатието се во ЕУР и УСД. Средниот курс на Еврото на 31.12.2021 година изнесува 61,6270 МКД, додека во 2020 изнесува 61,6940 МКД, а средниот курс на Доларот бележи зголемување во однос на

курсот на крајот од претходната година и тоа 54,3736 МКД во 2021 и 50,2353 МКД во 2020 година.

Графички приказ бр.6: Учество на поединечните расходи во вкупните остварените расходи за 2021 година

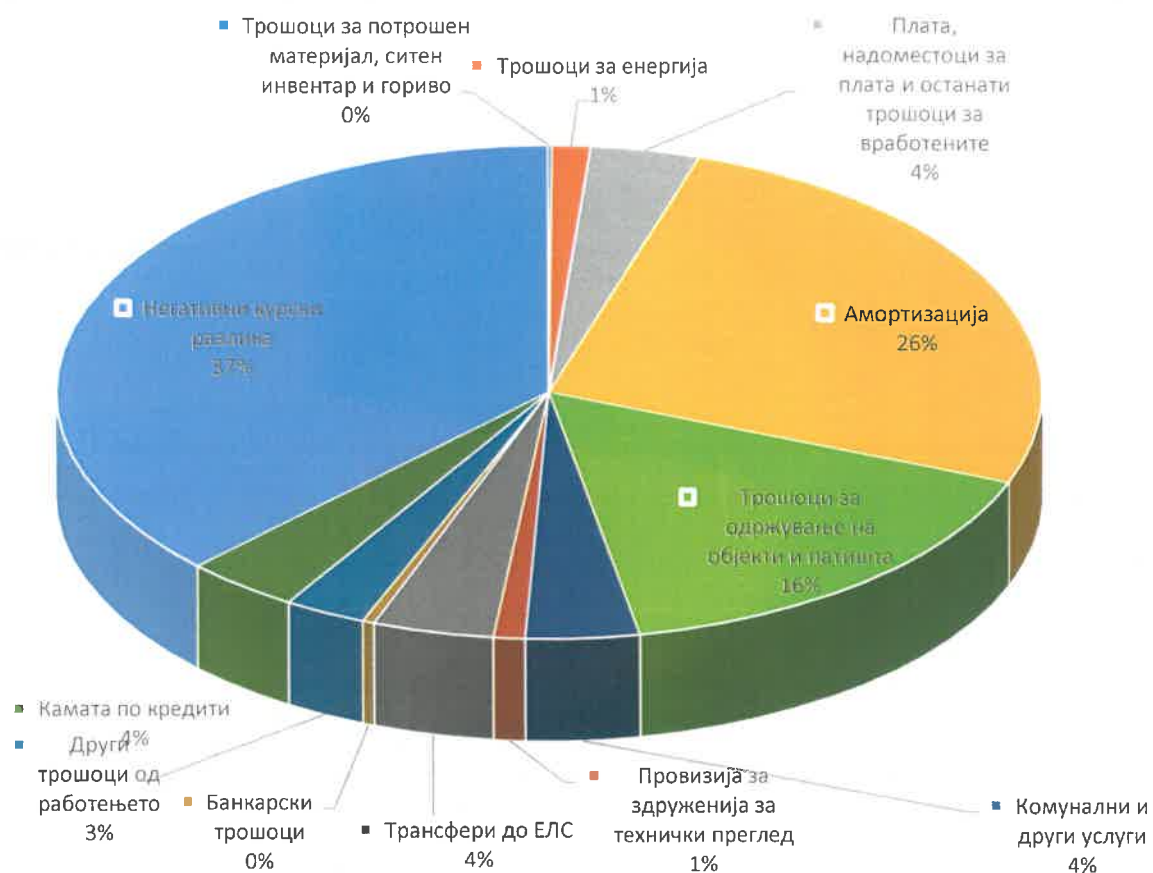

5. СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ФИКСНИ СРЕДСТВА И АМОРТИЗАЦИЈА

Во овој дел од финансиското известување се претставени состојбата на поединечните материјалните и нематеријалните средства на претпријатието, споредбата на нивната состојба со претходната година, како и амортизацијата на секое поединечно средство со амортизацијата од претходната година.

	Градежни објекти	Патишта	Опрема	Аванси за наб. на матер. средства	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2021	18,652,749	124,662,026,511	261,552,240	2,140,876,942	40,869,148,199	167,952,256,641

Зголемување	-	2,164,368,372	28,638,677	653,382,553	6,068,256,346	8,914,645,948
Намалување	-	203,973	- 9,111,508	930,218,520	- 22,162,228	- 961,696,229
Салдо на 31 Декември 2021	18,652,749	126,826,190,910	281,079,409	1,864,040,975	46,915,242,317	175,905,206,360
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2021	9,309,560	61,239,438,010	212,494,442	-	-	61,461,242,012
Амортизација	185,052	1,937,225,281	11,605,497			1,949,015,830
Намалување	-	203,973	- 8,905,789			- 9,109,762
Салдо на 31 Декември 2021	9,494,612	63,176,459,318	215,194,150		-	63,401,148,080
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2021	9,158,137	63,649,731,592	65,885,259	1,864,040,975	46,915,242,317	112,504,058,280
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2021	9,343,189	63,422,588,501	49,057,798	2,140,876,942	40,869,148,199	106,491,014,629
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2020	18,652,749	121,416,966,650	248,661,197	2,633,128,630	35,614,172,789	159,931,582,015
Зголемување	-	3,245,059,861	13,047,289	334,641,705	6,041,770,894	9,634,519,749
Намалување	-	-	- 156,246	826,893,393	- 786,795,484	- 1,613,845,123
Салдо на 31 Декември 2020	18,652,749	124,662,026,511	261,552,240	2,140,876,942	40,869,148,199	167,952,256,641
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2020	9,124,508	59,195,688,519	199,146,463		-	59,403,959,490
Амортизација	185,052	2,043,749,491	13,445,484		-	2,057,380,027
Намалување	-	-	- 97,505		-	- 97,505
Салдо на 31 Декември 2020	9,309,560	61,239,438,010	212,494,442		-	61,461,242,012
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2020	9,343,189	63,422,588,501	49,057,798	2,140,876,942	40,869,148,199	106,491,014,629
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2020	9,528,241	62,221,278,131	49,514,734	2,633,128,630	35,614,172,789	100,527,622,525

	Патенти и лиценци	Гудвил	Софтвер	Останати средства	Средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2021	1,633,918		42,918,845	916,158	-	45,468,921
Зголемување			603,243	-		603,243
Намалување						-
Салдо на 31 Декември 2021	1,633,918		43,522,088	916,158		46,072,164
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2021	1,633,918		34,439,403	632,674		36,705,995
Амортизација			7,923,941	283,488		8,207,429
Намалување						
Салдо на 31 Декември 2021	1,633,918	-	42,363,344	916,162	-	44,913,424
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2021	-	-	1,158,744	4	-	1,158,740
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2021	-	-	8,479,442	283,484	-	8,762,926
Набавна вредност						
Салдо на 1 Јануари 2020	1,633,918		42,164,408	916,158		44,714,484
Зголемување			754,437			754,437
Намалување						
Салдо на 31 Декември 2020	1,633,918	-	42,918,845	916,158	-	45,468,921
Исправка на вредноста						
Салдо на 1 Јануари 2020	1,633,918		26,057,326	349,186.00		28,040,430
Амортизација			8,382,077	283,488		8,665,565
Намалување						-
Салдо на 31 Декември 2020	1,633,918	-	34,439,403	632,674	-	36,705,995
Нето сметководствена вредност на 31 Декември 2020	-	-	8,479,442	283,484	-	8,762,926
Нето сметководствена вредност на 1 Јануари 2020	-	-	16,107,082	566,972	-	16,674,054

6. ПРЕГЛЕД НА КРЕДИТИ

Во овој дел од извештајот прикажани се долгорочните кредити на јавното претпријатие, износот на основицата на секој кредит, каматната стапка, времетраењето на кредитот, вкупно исплатениот износ и износот што преостанува да се исплати.

	6. Преглед на кредити	Износ на основица	Каматна стапка	Износ на 6- месечен ануитет	Вкупно исплатено до 31.12.2021	Преостанат долг	Времетрае ње (од - до, Вк. Години)
	Долгорочни кредити						
1	Патишта II ЕИБ - Луксембург	€ 60,000,000	3.62	1,752,266	51,238,672	8,761,328	15.11.2006- 15.05.2024
2	ТТФСЕ II - Светска банка	€ 14,670,375	Либор	610,240	11,619,173	3,051,202	15.12.2012- 15.06.2024
3	Регионални и локални патишта Светска банка	€ 69,124,920	Либор	2,390,417	28,419,260	31,143,994	15.09.2013- 15.03.2028
4	*Проект за рехабилитација на магистрални и регионални патишта - Светска банка	€ 50,437,699	Либор	1,483,462	4,448,605	45,989,094	15.10.2020- 15.04.2037
5	*Проект за подобрување и развој на патишта - Светска банка	€ 73,000,000	Либор	1,825,000	0	32,347,299	15.11.2023- 15.05.2043
6	Регионални и локални патишта ЕБОР	€ 50,000,000	Либор+ 1	2,718,960	41,843,120	8,156,880	15.12.2012- 15.06.2023
7	Коридор X - патарини ЕБОР	€ 15,880,000	Либор+ 1	996,000	6,915,997	8,964,003	20.10.2015- 20.04.2026
8	*Програма за национални патишта ЕБОР	€ 181,000,000	Либор+ 1	7,240,000	15,138,880	75,635,330	20.02.2018- 20.02.2030
9	Патна делница Штип- Радовиш ЕБОР	€ 64,000,000	Либор+ 1	3,007,709	4,328,313	57,146,470	15.03.2020- 15.09.2030
10	*Патна делница Кр. Паланка- Деве Баир ЕБОР	€ 10,000,000	Либор+ 1	416,667	0	5,100,000	15.04.2022- 15.10.2033

11	Коридор VIII - патарини ЕБОР	€ 13,000,000	Либор+ 1	541,667	0	5,130,000	10.06.2023- 10.12.2034
	Вкупно долгорочни кредити ЕУР	€ 601,112,994		€22,982,388	€163,952,020	€ 281,425,600	
12	*Кичево- Охрид	\$505,044,967	2	16,834,832	49,812,605	\$332,785,442	21.07.2019- 21.01.2034
13	Миладиновц и-Штип	\$213,699,632	2	7,123,321	35,616,605	\$178,083,027	21.07.2019- 21.01.2034
	Вкупно долгорочни кредити УСД	\$718,744,599		\$23,958,153	85,429,210	\$530,868,469	0

Забелешка - Кредитите означени со (*) се во фаза на имплементација и се уште се во фаза на повлекување на средствата, а кај некои од нив започнаа е и отплатата на повлечениот дел од кредитите

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ ВО КАПИТАЛОТ

Промените во капиталот заклучно со 31 декември 2012 година се состојат од ревалоризациони резерви кои се пресметуваа за недвижностите, постројките и опремата заклучно со 31 декември 2012 година и остварена добивка. На 01.01.2013 година со трансформацијата на „Агенцијата“ во „Јавно претпријатие за државни патишта“ се изврши корекција на капиталот, односно основната главнина со состојба на 31 декември 2018 година изнесува 5.000.000 денари и се состои од паричен влог. Средствата се земени од салдото на сметката на Агенцијата за државни патишта во рамките на трезорската сметка и се дел од салдото на денот на отворањето на сметката на ЈП за државни патишта. Овој капитал е упишан во Централниот регистар на РМ.

во илијади денари

7. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНЕТЕ ВО КАПИТАЛОТ	Држа вен капи тал	Ревалор изацион а резерва	Реинвест ирана добивка	Акумули рана добивка (загуба)	Добивка од тековна година	Вкупно капитал
Состојба на 1 Јануари 2020	5,000	9,796,453	2,499,258	40,128,314	2,885,001	55,314,026
Добивка/загу ба за тековната година					4,595,660	4,595,660
Резерви (реинвестиран а добивка)			2,885,001	2,499,258	(2,885,001)	2,499,258
Враќање на реинвестиран а во акумулирана			(2,499,258)	-		(2,499,258)
Состојба на 31 Декември 2020	5,000	9,796,453	2,885,001	42,627,572	4,595,660	59,909,686
Состојба на 01 Јануари 2021	5,000	9,796,453	2,885,001	42,627,572	4,595,660	59,909,686
Добивка/загу ба за тековната година				-	1,473,676	1,473,676
Резерви (реинвестиран а добивка)			4,595,660	2,885,001	(4,595,660)	2,885,001
Враќање на реинвестиран а во акумулирана			(2,885,001)			(2,885,001)
Корекции						-
Состојба на 31 Декември 2021	5,000	9,796,453	4,595,660	45,512,573	1,473,676	61,383,362

Од дадената табела може да се види дека вкупниот капитал во 2021 година изнесува 61.383.362.145 денари, и истиот е зголемен за 1.473.676.472 денари во однос

на претходната година, односно зголемен е за износот на добивката за тековната година.

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ

Извештајот за паричните текови ни ја дава целосната претстава за тековите на готовите пари во претпријатието, односно на едно место ни прикажува по кои основи претпријатието остварило готовински приливи во текот на 2021 година, а по кои основи се направени готовински одливи во истата година.

Извештајот за паричен тек е изготвен врз основа на директниот метод за пресметка на нето зголемувањето/намалувањето на паричните средства.

во илјади денари

8. ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ	2021	2020	промена 2021/2020
Парични примања од надоместоци	8,120,849	6,807,718	1.19
Парични примања од останати оперативни активности	26,785	33,359	0.80
Исплати на добавувачи за трошоци за основна дејност	-1,423,077	-	1.12
Исплати за плати и надоместоци на плати	-273,705	-244,090	1.12
Исплати за останати оперативни расходи	-760,845	-707,837	1.07
Платен данок од добивка	-40,498	0	
Примени камати	4,511	17,743	0.25
Парични средства од оперативни активности	5,654,019	4,638,878	1.22
Дадени/наплатени заеми на други	14,045	14,179	0.99
Набавки на нематеријални средства	-603	-754	0.80
Набавки на недвижности, постројки и опрема	-	-	
Дадени/оправдани аванси за основни средства, нето	11,848,974	4,053,071	2.92
	276,836	492,252	0.56
Парични средства од инвестиции	-	-	
	11,558,697	3,547,394	3.26

Платени камати на кредити	-283,220	-290,568	0.97
Примени (отплатени) долгорочни кредити, нето	10,817,075	1,869,670	5.79
Отплатени кредити	-3,626,814	-3,513,158	1.03
Парични средства од финансиски активности	6,907,041	1,934,056	(3.57)
Нето зголемување / намалување на паричните текови	1,002,364	-842,572	(1.19)
Парични средства на почетокот на периодот	1,191,199	2,033,771	0.59
Парични средства на крајот на периодот	2,193,563	1,191,199	1.84

Во 2021 година од паричниот тек може да се види дека претпријатието има зголемување на паричните текови во износ од 1.002.364.544 денари. Претпријатието од оперативни активности прикажува готовински приливи и истите изнесуваат 5.654.019.407 денари, и истите се поголеми од претходната година. Додека, готовински одливи претпријатието најмногу покажува во инвестициските (вложувачки) активности.

9. ПРЕГЛЕД НА ГОДИШНИ ПОДАТОЦИ

Во овој дел од извештајот, во табела ќе бидат прикажани ставките од билансите и извештаите кои се битни за претпријатието и нивната споредба во однос на намалувањето/зголемувањето со претходната година.

во илјади денари

9. ПРЕГЛЕД НА ГОДИШНИ ПОДАТОЦИ	Реализација 2020	Реализација 2021	Промена 2021/2020
Тековна актива	1,378,005	2,468,251	1.79
Тековни обврски	9,770,376	9,429,030	0.97
Вкупно приходи од дејноста	6,961,313	8,326,816	1.20
Вкупно приходи	9,983,378	9,026,166	0.90

Вкупно расходи од дејноста	4,306,856	4,438,899	1.03
Вкупно расходи	5,191,824	7,545,132	1.45
Трошоци за плата	244,184	273,890	1.12
Вкупно трошоци за кредити	290,568	283,220	0.97
Резерви	12,681,454	14,392,113	1.13
Капитал (влог, акум. добивка)	42,632,572	45,517,573	1.07
Добивка / Загуба	4,595,660	1,473,676	0.32
Вкупно материјални средства	106,491,015	112,504,058	1.06
Вкупно нематеријални средства	8,763	1,159	0.13
Долгорочни финансиски средства	35,055	21,010	0.60
Вкупно средства	107,912,837	114,994,478	1.07

VI. ИНВЕСТИЦИИ

Инвестициите се преод на заштедите во капитални фондови. Во суштина, инвестициите се разликата меѓу вкупниот доход и потрошувачката во еден одреден временски период, кои се трансформираат во фиксни и обртни капитални добра. Инвестициите се вбројуваат меѓу најзначајните фактори на економскиот развој. Инвестициите т.е. капиталот се создава од домашните заштеди (акумулацијата) и позајмен капитал од странство, во форма на кредити и странски директни

инвестиции. ЈПДП, капиталните средсва ги обезбедува од домашни заштеди и странски кредити.

Во табелата што следи се прикажани инвестиции од сопствени средства и инвестициите со странски кредити остварени во 2021 година и нивната споредба со претходната година.

Годишна Програма	Реализација 2020 година	Програма 2021	Реализација 2021 година	Споредба 2021/2020	Оств. /план. 2021	Струк. Анал. реал. 2021
ИНВЕСТИЦИИ	6,921,164,038	16,010,500,000	7,482,513,916	1.08	0.47	1.00
Инвестиции од сопствени средства	2,696,539,786	3,472,000,000	2,770,444,779	1.03	0.80	0.37
Градба и рехабилитација на државни патишта	1,011,077,596	1,075,000,000	985,845,059	0.98	0.92	0.13
Свлечишта и рехабилитација на мостови и тунели	251,543,084	235,000,000	284,280,877	1.13	1.21	0.04
Осветлување и Сигнализација и опрема на патишта	45,264,062	10,000,000	18,035,152	0.40	1.80	0.00
Сопствено учество во инвестиции од странски кредити	197,984,260	322,000,000	186,297,372	0.94	0.58	0.02
Инвестиционо одржување	463,140,897	726,000,000	517,348,718	1.12	0.71	0.07
Буџет. С-ва за наб.на механизација за одрж. За Мак.Пат	0	180,000,000	180,000,000		1.00	0.02
Експропријација	301,514,879	300,000,000	209,679,036	0.70	0.70	0.03
Проектирање	153,094,967	237,578,200	78,054,947	0.51	0.33	0.01

Надзор над градежни работи	258,684,061	380,421,800	303,606,456	1.17	0.80	0.04
Опрема и Софтвер	14,235,980	6,000,000	7,297,162	0.51	1.22	0.00
Инвестиции од странски кредити	4,224,624,252	12,538,500,000	4,712,069,137	1.12	0.38	0.63
Инвестиции со кредит од Светска банка	415,671,322	754,000,000	418,414,665	1.01	0.55	0.06
Подобрување на магистралаи и регионални патишта	22,362,297	0	0	0.00	/	0.00
Унапредување и развој на патиштата	393,309,025	754,000,000	418,414,665	1.06	0.55	0.06
Инвестиции со кредит од ЕБОР	2,376,266,200	8,784,500,000	3,209,833,607	1.35	0.37	0.43
Проект за електронски систем за наплата на патарина	98,780,646	123,000,000	60,535,135	0.61	0.49	0.01
Проект за градба на национални патишта	1,320,908,104	4,369,500,000	1,380,164,122	1.04	0.32	0.18
Штип - Радовиш, изградба на експресен пат	925,343,798	1,342,000,000	1,538,721,203	1.66	1.15	0.21
Крива Паланка - Деве Баир	31,233,652	400,000,000	93,715,391	3.00	0.23	0.01
Проект за патарина на Коридор 8	0	600,000,000	136,697,756	/	0.23	0.02
Букојчани - Кичево	0	900,000,000	0	/	0.00	0.00
Скопје - Блаце	0	1,050,000,000	0	/	0.00	0.00
Инвестиции со кредит од Ексим Банка	1,432,686,730	3,000,000,000	1,083,820,865	0.76	0.36	0.14

Кичево - Охрид, изградба на автопат	1,432,686,730	3,000,000,000	1,083,820,865	0.76	0.36	0.14
---	---------------	---------------	---------------	------	------	------

1. ИНВЕСТИЦИИ СО СОПСТВЕНИ СРЕДСТВА

1.1. Градба, рехабилитација и реконструкција на државни патишта, свлечишта, мостови и тунели, осветлување и сигнализација на патиштата

- Сончев град, во должина од 4,4км. Градежните работи комплетно се завршени. ЈП за државни патишта има аплицирано до Министерство за транспорт и врски за измена и дополна на инфраструктурен и основен проект. По одобрување на потребната документација од Министерство за транспорт и врски ЈП за државни патишта ќе аплицира да изврши технички преглед и да се стави во употреба патот.
- Доизградба на регионален пат крак 1 од Р-418 (фаза 2), на потег фабрика „Вевчанка – Здравствен дом Вевчани, општина Вевчани во должина од 1 км . Патот е завршен во декември 2020 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.
- Изградба на регионален пат Старо Коњарево - Ново Коњарево (општина Ново Село - струмичко), во должина од 3,4 км.. Патот е завршен во јуни 2020 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.
- Реконструкција на државен пат Р2133, делница Матејче – Липково, во должина од 3,3км . Патот е завршен во април 2021 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.
- Реконструкција на државен пат Р2133, делница Ропалце – Матејче, во должина од 2,78км . Градежните работи се започнати во мај 2021 година и се очекува да завршат во јули 2022 година.
- Изградба на Автопат А4, делница ГП “Блаце” - Скопје (клучка “Стенковец”) Подделница 1 - проширување на постоен пат А4 од ГП “Блаце” до с. Блаце до ниво на автопат и изградба на дел од автопат со клучка за поврзување со локален пат

до с. “Блаце” – Градежните работи се започнати во 2020 година и се очекува да завршат во 2022 година.

- Рехабилитација на магистрален пат А2, делница Куманово – Страцин (фаза 2) - Градежните работи се започнати во 2020 година и се завршени во ноември 2021 година.

➤ Рамковна спогодба 2019 година за поправка и рехабилитација на државни патишта кои ги опфаќаат следните делници:

- Рехабилитација на државен пат А3, транзит низ Охрид во должина од 1,88 км. Градежните работи се започнати во 2019 година и се завршени во јули 2021 година.
- Рехабилитација на државен пат Р29273 делница, Ботун (врска А2) – Белчишта – Брежани во должина од 10,40км. Градежните работи се започнати во 2020 година и се завршени во 2021 година. Изградба на армирано бетонски потпорен ѕид на државен пат Р2133 делница, Матејче – Липково. Градежните работи се започнати во 2020 година и се завршени во 2021 година.
- Изградба на мост на државен пат Р2136 на река Пчиња кај Коњаре. Мостот е завршен октомври 2020 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.
- Изградба на регионален пат Р2246 делница, Извор (спој со А2) – Гарски мост во должина од 19,00км. Градежните работи се започнати во 2021 година и се очекува да завршат во 2023 година.
- Рехабилитација и санација на државен пат Р1203, делница Тетово – Џепчиште во должина од 4 км. Градежните работи се започнати во 2021 година и се очекува да завршат во мај 2022 година.
- Реализација на договорите за Одржување на електроенергетски објекти, осветлување и светлосна сигнализација (Дел 1 и 2), Одржување на UPS систем за тунели Демир Капија 1 и 2, Одржување на агрегати, , одржување, надградба и броење на сообраќај, одржување на GPS уреди за бројачи на возила, сервисирање

и тековно одржување на фискални печатари, одржување и надградба на постоечки електронски систем за наплата на патарина, одржување на лифтови во времетраење од две години, одржување на систем за ПП заштита и дојава на пожар и алармен систем, одржување на клима уреди и системи за климатизација, одржување на опрема за видео надзор, одржување на автоматски стоп рампи, санација на штети на оптички кабел на автопат А4, Штип – Миладиновци и поставување на видео надзор на седум клучки. Потпишани се договори со Изведувачи.

- Реализацијата на договорите за Потрошен материјал за принтери и фотокопири, Лиценци за систем за бекап на сервери и клиентски компјутери, Превентивно и адаптивно одржување на систем за дигитална архива и дигитализација на документација, Надградба на ЕРП софтвер, Дигитални сертификати, Компјутери и компјутерска опрема, Лиценци за антивирус софтвер и софтвер за канцелариско работење, Одржување и сервисирање на фотокопири и принтери, Одржување на систем за евиденција на работно време, Одржување на компјутери и компјутерска опрема, Одржување на IP телефонија во времетраење од три години, Одржување на ЕРП софтвер во времетраење од две години, WEB хостинг за систем за патна такса во времетраење од две години и Оптичко комуникациско поврзување, интернет пакет услуги и услуги за фиксна телефонија, вклучувајќи и кол центар во времетраење од две години. Потпишани се договори со Изведувачи.
- Градежно санациони работи мост бр.1 на р.Лакавица на Р1103. Лакавица – Процент на реализација 98
- Градежно санациони работи мост бр.3 на р.Лакавица на Р1103. Лакавица – Градежните работи се целосно завршени
- Санација на мост на река Пчиња (Доброшане). Градежните работи се целосно завршени
- Градежно санациони работи мост бр.4 на Р1103. Лакавица. Процент на реализација 35%.
- Санација на мост на река Кумановка на државен пат Р1204. Процент на реализација 45 %

1.2. Инвестициско одржување

Согласно Договорот за одржување склучен со ЈП Македонијат, во позицијата 4.1. Надградување и поправка на коловози во 2020 реализирани се работи на следните патни правци:

- 1 P2238 Гарски мост-Лазарополе
- 2 P1104 Куманово-гр. Србија-сопот
- 3 P2245 Крива Паланка(врска со А2) – Огут
- 4 P1202 Транзит Дебар
- 5 P2138 кл. Сончев град - Средно водно
- 6 P29275 Шипковица – Бозовце
- 7 P2231 Лакавица – Србиново
- 8 P1304 Транзит низ Винаца
- 9 P1402 Банско - Колешино - Смоларе - Старо Коњарево
- 10 P2431 Радовиш – Плачковица
- 11 P2345 Трсино-Бигла
- 12 А4 Струмица- Дабиле
- 13 P1102 Велес транзит P1102 и P1312
- 14 P2336 Стари град – Теово
- 15 P29171 Обиколница Д.Капија
- 16 P1103 Кавадарци – Дреново
- 17 P1103 Неготино – Глишиќ
- 18 P2231 спој со А2 – Осломеј
- 19 P1101 Кажани - Кл.Ротино
- 20 P2335 Кривогаштани – Житоше
- 21 P1101 Макази - Царев двор
- 22 P2332 спој P1307 – Галичица
- 23 P1306 спој со P1305 – Крушево
- 24 P2336 Гостиражни (Долнени)-Црнилиште-Петле (Богомила)
- 25 P1307 Царев двор - гп Стење
- 26 А1 Плетвар -Прилеп

1.3. Инфраструктурни проекти

Во фаза на изработка се следниве Проекти:

- Изработка на Инфраструктурен и Основен проект за државен пат А2, делница Букојчани – Кичево (варијанта со тунел);
- Изработка на проектна документација за Струмица – Валандово – Спој со А1;
- Изработка на проектна документација за реконструкција и рехабилитација на државниот пат Р1109. Завршена е проектната документација во декември 2021 година;
- Изработка на проектна документација за рехабилитација на државни патишта финансирани од ЕБОР (фаза 1). Завршена е проектната документација во јануар 2021 година;
- Изработка на проектна документација за рехабилитација на државни патишта финансирани од ЕБОР (фаза 2).
- Изработка на проектна документација за рехабилитација на автопатски делници: Хиподром - Миладиновци, Миладиновци - Петровец и Петровец-Хиподром
- Изработка на проектна документација за реконструкција на делницата Струмица – Дабиле. Завршена е проектната документација во април 2021 година;
- Изработка на проектна документација за експресен пат делница Битола – Меџитлија, со обиколница на Битола;
- Изработка на проектна документација за државен пат А3, Обиколница на Ресен;
- Изработка на проектна документација за реконструкција со проширување на регионален пат Р1109 делница Понов Мост – влез во Богданци;
- Докомплетирање на постоечка проектна документација и изработка на Инфраструктурен проект за реконструкција со проширување на регионален пат Р2236, делница Свети Николе - Неокази;

- Изработка и комплетирање на проектна документација за поврзување на идниот Автопат А4, делница Миладиновци – Свети Николе – Штип (клучка Средно Коњаре) со регионалниот пат Р2136;
- Изработка на проектна документација за поставување сообраќајна сигнализација и опрема на државен пат АЗ, делница Буково – Охрид.
- Изработка на проектна документација за рехабилитација со подобрување на автопат А1, Г.П. Табановце - клучка Табановце. Завршена е проектната документација во ноември 2021 година;
- Измена и дополна на за инфраструктура за изградба на регионален пат Р2138, врска со регионален пат Р2134, со населба Сончев Град. Потпишан е Договор во јули 2020 година;
- Изработка на проектна документација за изградба на обиколница Тетово преку клучка Требош до Непроштено. Склучен договор јули 2021 година.

1.4. Експропријација

Во 2021 година исплати се вршени по основ на спогодби за експропријација, судски порамнувања, судски решенија и решенија за времени застапници во постапките за експропријација за следните проекти:

- Изградба на Автопат А2 Кичево – Охрид во должина од 56,7 км. Автопатот А2, делница Кичево-Охрид е поделен на 5 подделници. Постапката за експропријација на земјиште за главната траса, за вкупно 17-седумнаесет одлагалишта, 5-пет клучки, Денивелиран патен јазол Требениште, на Патен јазол Подмоље, Патен јазол Аеродром Св.Апостол Павле, и за 13-тринаесет косини е спроведена... Во 2020 година е започната постапка за експропријација за потребите за изградба на Наплатна станица Арбиново и истата е во тек. Во текот на 2021 година од страна на Министерството за транспорт и врски се одобрени Инфраструктурни проекти за 59-новопроектирани косини, од кои за 31-триесет и една косина се започнати постапки за експропријација. Во текот на 2021 година се започнати постапки за експропријација и за две Девијации на локални патишта, од кои една постапка за

експропријација е целосно завршена. Паралелно со постапката за експропријација се започнати постапки за трајна пренамена на шума и шумско земјиште во градежно и постапки за трајна пренамена на земјоделско земјиште во градежно пред Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во тек се вонпарнични постапки за утврдување на надомест за експроприран имот пред Основен суд Кичево и Охрид и Апелационен суд Гостивар и Битола.

- Изградба на Автопат Миладиновци-Свети Николе-Штип во должина од 47 км;

- Заклучно со 2021 година започнати се постапки за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште што се водат пред Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Од можни 6 (шест) постапки 2 (две) се целосно решени додека преостануваат уште 4 (четири) постапки. Во склоп на овие постапки се постапува и за одземање на право на користење со РМ-Собрание на Град Скопје (постапката е на самиот крај донесени се акти), РСМ-Министерство за одбрана и РСМ-СИЗ за стопанисување со пасишта.

- Во текот на 2021 година започната е постапка за експропријација за Изградба на Автопат А4, делница Миладиновци-Свети Николе-Штип за одводнување и пристапни патишта (од км.26+396,47 до км.41+625,00), делница Свети Николе-Штип во КО Преот, КО Свети Николе град и КО свети Николе вон град и Ко Сопот.

- Заклучно со 2021 година постапката за експропријација во КО Свети Николе град и КО Свети Николе вон град е завршена 90% додека во КО Криви Дол 50%

- Изградба на А1 Прилеп-Градско од мост на река Раец преку ДПЈ Дреново до ДПЈ Градско во должина од 25,7 км; Заклучно со 2021 година постапката за експропријација е завршена 100%

- Изградба на А2 делница Ранковце-Крива Паланка на ниво на експресен пат поделен во 2 лота со 10 одлагалишта, лот 1 од км 0+000 до км 10+308 и лот 2 од км 10+308 до км25+850; Постапката за експропријација на земјиштето за експресниот пат и 10 те одлагалишта е спроведена 99%.

- Заклучно со 2021 година интензивно се водеа вонпарнични постапки за утврдување на надомест за експроприран имот пред Основен суд Крива Паланка и Апелационен суд Скопје, така што до крајот на 2021 година од околу 80-- тековни

постапки, правосилно завршени и исплатени беа околу 65 судски постапки. Завршени се преку 20 управни постапки пред управа за имотно правни работи, подрачно одделение Крива Паланка и Агенција за катастар на недвижности Крива Паланка, кои се однесуваат на запишување на катастарските парцели предмет на експропријација на име на Р.С.М.

- Изградба на експресен пат А3 Штип-Кочани, прва секција од км 0,00 до км 14+300 и втора секција од км 14+300 до км 28+057,44.

- Заклучно со 2021 година за втората секција од км.14+300 до км.28+057,44 постапката за експропријација речиси е завршена останата е уште една катастарска парцела КП 1155 во КО Тркање и после направени нови процени доуреден е предлогот за експропријација на истата.

- Во текот на 2021 година се водеа вонпарнички постапки за утврдување надомест за експроприран имот пред Основен суд Кочани и Апелационен суд Штип и до крајот на 2021 година од околу 60 тековни постапки правосилно завршени беа околу 40.

- Постапката за експропријација за дислокација на електрични столбови на АД Мепсо е завршена заклучно со 2021 година и катастарските парцели се спроведени во АКН.

- Изградба и реконструкција на делница Старо Коњарево – Ново Коњарево како дел од државен пат Р1402 (Р-605); Постапката за експропријација на земјиштето е започната во текот на 2017 година и заклучно со декември 2020 година експропријацијата е завршена 99%. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.

- Изградба на државен пат А4, делница Штип- Радовиш од км 7+463,31 до км 37+200,00; Постапката за експропријација на земјиштето е започната во текот на 2017 година и до крајот на 2019 година експропријацијата на земјиштето за овој дел е спроведена 100%. Во тек се вонпарнички постапки за определување на надомест за експроприран имот. Во тек на месец април 2018 година, исто така е започната постапката за експропријација на земјиштето од км 5+066.00 до км 7+413.49, и

експропријацијата во овој дел е завршена со 100% до крајот на годината. Во текот на 2019 година, отпочната е постапка за експропријација за подделницата од км -3+213.51 до км 5+066.40-и заклучно со декември 2020 е завршена 98.5%. Во тек е и постапката за пренамена на земјоделско земјиште во градежно која се води пред Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство за подделницата од км -3+213.51 до км 5+066.40. Во тек се вонпарнични постапки за определување на надомест за експроприран имот. Во текот на 2021год., отпочната е постапка за експропријација за “Државен пат А4 Штип-Радовиш” (проширување на изградени косини), со тоа што експропријацијата е релаизирана на 99% од вкупниот број катастарски парцели кои се опфатени со елаборатот за експропријација. Во моментот е во тек пренамена на катастарски парцели шуми и истотака е во тек пренамена на земјоделско земјиште која се води прен МЗШВ.

- Изградба на државен пат Р2246, делница Гарски мост-Ехловец (Извор) од км 8+223,22 до км 16+000,22;

- Заклучно со 2021 година продолжена е постапката за експропријација за КО Гари, склучена е една спогодба додека останати се уште четири предлози, а започната е постапка за добивање на согласност за трајна пренамена на шуми во градежно земјиште.

- Изградба на обиколен пат околу село Вевчани во правец кон село Октиси.

- Заклучно со 2021 година продолжена е постапката за експропријација за КО Вевчани, се постапува по жалба на Апелационен суд Битола за Енерго Вевчани и продолжена е постапката за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште што се води пред МЗШВ. Изградба на нов мост бр.4 на река Пчиња на регионален пат Р2136, на делница Ржаничино-Долно Коњаре на км 7+165,00 КО Долно Коњаре, Општина Петровец. Постапката за експропријација е отпочната на крајот на месец декември 2018 година. Во 2020 година е спроведена постапка за експропријација и истата е завршена 100%. Во текот на 2020 година спроведена е постапка за трајна пренамена на земјоделското земјиште во градежно и преземени се активности за подготовка на документацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.

- Реконструкција и рехабилитација на магистралниот пат А2, делница Крива Паланка - граничен премин Деве Баир; Експропријацијата е започната во месец мај

2018 година. Постапката за експропријација на земјиштето е спроведена 99%. Заклучно со декември 2021 година, завршени се постапките за определување на надомест за експроприран имот пред Основниот суд Крива Паланка. Завршена е постапката за пренамена на шумите и истата е спроведена во АКН.

- Наплатни станици на Коридор 10. Во текот на месец Октомври 2018 година, отпочната е постапка за експропријација за пет (5) наплатни станици, и тоа за: Отовица, Петровец, Гевгелија, Сопот и Демир Капија. Постапката за експропријација за овие пет наплатни станици е завршена. Во текот на 2020 година се преземени активности за постапките за пренамена на земјоделското земјиште во градежно и активности за комплетирање на потребната документација за постапката за добивање на одобрение за употреба. Целосно е комплетирана документацијата за НС Отовица, Петровец, Гевгелија и Сопот.
- Изградба на нов мост на река Луда Мара К.О. Ваташа- Кавадраци,
- Заклучно со 2021 година постапката за експропријација е завршена 100%.
- Државен пат Р29272 делница Опае-Баленовце-Станчиќ, проширување на косини. При крајот на 2018 година, е отпочната постапка за трајна експропријација која што во текот на 2020 година е целосно завршена, спроведени се сите активности за комплетирање на докуменатацијата за добивање на одобрение за употреба и истото е добиено во месец октомври. - Во тек се вонпарнични постапки за определување на надоместото за експропроиран имот.
- Државен пат Р2133, Делница Село Ропалце – Село Матејче Делница 2 од 0+945.72км до 1+952.84км, Општина Липково, постапката за експропријација е 99% завршена, останата 1 катастарска парцела со не решен статус поради објект- за истото се превземени навремени дејствиа за решавање. Во тек е пренамена на земјоделско земјиште и вонпарнични постапки за определување на надоместот за експропријација.
- Изградба на мост на река Бабуна
- Во текот на 2021 година постапката за експропријација е завршена 95% и се постапува во постапки каде сеуште не е завршена оставинска постапка, додека сеуште не се изложени катастарски парцели во АКН и за истите добиени се потврди

за одбивање поради што нема доставено ЕМБГ и адресни податоци за сопствениците а ДП не е овластен подносител од лицата.


- Автопат А1, делница Демир Капија-Смоквица - косини. Постапката за експропријација е отпочната во јуни 2020 година, заклучно со 2021 година е спроведена 60%.

- Градско-Прилеп, делница од излез на Прилеп (бензинска станица Лукоил) - мост на р.Ленишка, и спој со пат за село Беловодица до мост кај каменолом Маврово,

- Заклучно со 2021 година постапката за експропријација е завршена 95% останати се два предмети, по едниот се одлучува по жалба додека за вториот е запрена постапката со Заклучок од УИПР ПО Прилеп поради недоставена Банкарска гаранција (Автосалон Пежо) КП 1165 во КО Прилеп.

- Автопат А4, делница ГП Блаце–Скопје (клучка Стенковец), Подделница 1 – проширување на постојан пат А4 од ГП Блаце до село Блаце до ниво на автопат и изградба на дел од автопат со клучка за поврзување со локален пат до с.Блаце – општина Чучер Сандево – Постапката за експропријација е почната во Декември 2019 година, должина на трасата е 2 км, каде што постапката за трајна експропријација е завршена, исто така завшено е и пренамената на земјоделско земјиште на градежно не изградено и пренамена на сите катастарски парцели со катастарска култура шума. Во тек се вонпарнични постапки за определување на надоместото за експроприиран имот.

Графички приказ: Учество на поединечите во вкупните инвестиции од сопствени средства

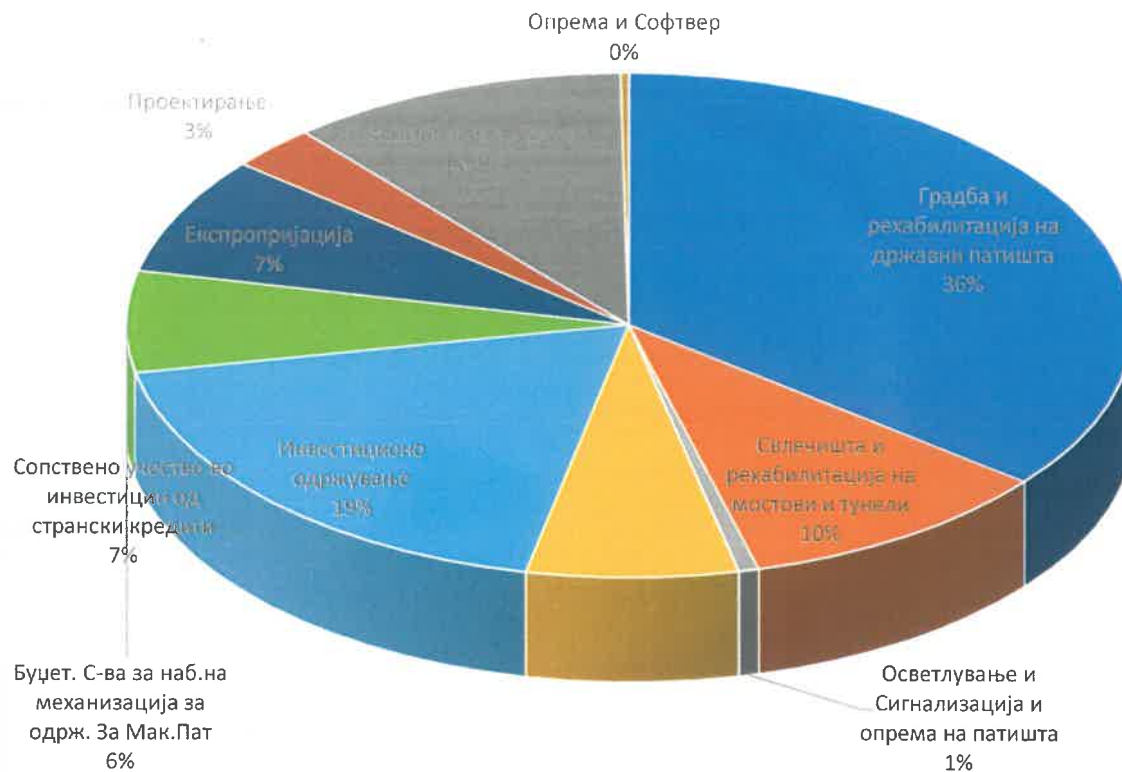

2. Инвестиции со странски кредити

2.1 Проекти финансирани со заем од Светска банка

Проект финансиран со средства од Светска Банка е и Изградбата на нов експресен пат – делница: Ранковце - Крива Паланка, со должина од 23 км. Вкупната инвестиција на изградба на експресен пат делница Ранковце - Крива Паланка ќе биде во износ од 62,5 милиони евра. Градежните работи започнаа на 23.05.2018 година и до крајот на 2021 прогресот на градежните работи изнесува околу 55%.

Проблеми:

- Недостатоци во проектната документација
- Стабилизација на косини во усеци

2.2 Проекти финансирани од Европска банка за обнова и развој

Договорот за Заем од Европска Банка за обнова и развој за финансирање на “Изградба и инсталација на електронски систем за наплата на патарини во Република Македонија” склучен е на износ од 15.880.000 ЕУР. Со овој договор се опфатени модернизација на 3 постоечки наплатни станици и изградба на 4 нови наплатни станици долж Коридорот 10. Проектирањето за сите наплатни станици е завршено во тек на месец септември 2016 год. За првата Наплатна Станица Романовце во 2017 година комплетно се завршени градежните работи. Наплатните станици Сопот и Отовица се комплетно завршени во текот на 2018 година. Во 2019 година пуштени се во употреба наплатните станици Петровец, Градско и Гевгелија. Наплатната станица Демир Капија е комплетирана во текот на 2020 година.

Договорот за Заем од Европска Банка за обнова и развој за финансирање на Проектот за магистрални патишта склучен е на износ од 181.000.000 ЕУР.

Преку овој договор се финансира изградбата на експресен пат А1, Градско – Прилеп, делница Фариш – Дреново (10,197 км). Градежните работи се започнати во 2021 година и се очекува да завршат во мај 2023 година. Кон крајот на 2016 година е избран најповолен понудувач за изградба на експресен пат Штип – Крупиште. Изградба на нов експресен пат на делница Штип – Кочани, во должина од 28 км, 1 фаза е Штип – Крупиште и 2 фаза Крупиште – Кочани. Делницата Штип – Крупиште е пуштена во употреба во 2020 година.

На втората делница од Крупиште до Кочани до крајот на 2021 година прогресот на градежните работи изнесуваше 65%. Краен рок за завршување на делницата е до крајот на 2022 година.

- Лот 2 Рехабилитација и Реконструкција на регионален пат Р1205, делница Пробиштип – Крупиште со должина од 18km градежни работи се завршени во 2021 година.

Договорот за Заем од Европска Банка за обнова и развој за финансирање на Штип - Радовиш склучен е на износ од 64.000.000 ЕУР. Во текот на 2017 година водена е тендерска постапка за избор на најповолен понудувач за изградба на фаза 1 од делницата Штип-Радовиш (во должина од 23,56 км.) која ќе се гради по нова траса. Градежните работи се завршени во 2021 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.

Фаза 2: Реконструкција на две подделници, од Три Чешми до Штип - Југ и од Бучим до Радовиш вкупна должина од 16,87 км.

Градежните работи се завршени во 2021 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.

Договорот за Заем од Европска Банка за обнова и развој за финансирање на Крива Паланка – Деве Баир склучен е на износ од 10.000.000 ЕУР средства од ЕБОР и 2,5 милиони евра неповратна помош од Европска Унија. Во текот на 2019 година е избран изведувач на работите. Рокот за комплетирање на работите е 2023 година.

Рехабилитација со проширување на автопат А1, делница Петровец – Катланово (лев и десен коловоз) - Градежните работи се започнати во 2020 година, а рокот за завршување е јули 2021 година. Поради слабиот прогрес на работите Договорот е раскинат. Во фаза на изработка е нов тендер за докмплетирање на работите.

Рехабилитација на регионален пат Р1202, делница Маврови Анови – Жировница - Градежните работи се започнати во 2020 година. Рокот на завршување на работите е до јули 2022, процентот на реализација е 60 %. Рехабилитација на регионален пат Р1303, делница Кичево – Македонски Брод - Градежните работи се започнати во 2020 година и се завршени 2021 година.

Рехабилитација на регионален пат Р1206, делница Карпалак – Желино, Градежните работи се започнати во 2020 година и се завршени 2021 година.

Рехабилитација на регионален пат Р1210, делница Узем – Тораница. Градежните работи се започнати во 2020 година и се завршени 2021 година.

Рехабилитација на регионален пат Р1210, делница Македонска Каменица – Саса - Градежните работи се започнати во 2020 година и се завршени 2021 година.

Рехабилитација на државен пат А1, делница Фариш – Прилеп - Градежните работи се започнати во 2021 година и се очекува да завршат во 2022 година.

2.3 Проекти финансирани од Кинеската Ексим Банка

Договорот за Заем со Ексим Банка - Кина за изградба на автопатот Миладиновци – Штип склучен е на износ од 278.374.072 УСД. Патот е завршен во јуни 2020 година. Преземени се активности за подготовка на докуменатацијата потребна за добивање на Одобрение за употреба.

Договорот за изградба на патна делница Кичево – Охрид број 08-9012/1 од 12.11.2013 година е склучен помеѓу Јавното претпријатие за државни патишта како инвеститор и изведувачот Sinohydro Corporation Limited, со рок за завршување на работите до 29.01.2018 година. Вредноста на договорот е 598.074.670,03 евра, од кои 90% се обезбедени со заем од Ексим банка и се исплаќа во УСД и 10% од инвеститорот во МКД. Во текот на мај 2014 година отпочната е изградбата на автопатот Кичево – Охрид како дел од Коридор 8, со должина од 56,7 км.

Пробиени се околу 93% од трасата (пристапни патишта и дел е полн профил на траса). Се работи на земјани работи (ископ и насип, изработка на клинови кај вијадуктите и пропустите, и др.), 145 пропуси се завршени, остануваат уште 14 пропуси за изведба, од вкупно 37 потпорни сидови, 27 потпорни сидови се завршени, а на 10 се работи, од вкупно 28 вијадукти, 12 вијадукти и на 2 моста се завршени долниот строј и коловозната плоча, а 16 се во фаза на изведба, има 26 натпатници и потпатници и се работи на клучки Арбиново и Издеглавје. Асфалтирано е со прв и втор слој од асфалт на 242.252,79 м² и извршена е рехабилитација на постоечкиот магистрален пат 83.800 м² или 25.15 км со ширина на коловоз од 10.25 м и 4.0 км со ширина на коловоз од 7.75м.

Тунелот е пробиеен, примарната конструкција и секундарната конструкција се завршени, вкупно 4011м'. Каналите за електрика и полимерните канали за опасни материи се комплетно завршени. На влезот на левата тунелска цевка завршени се сите три таложници според проектот и се работи на изградба на шахтите за прием на дренажната вода и опасните течности од коловозот од колекторскиот систем и изградба на сепаратори. Во моментот се изведуваат работи на: испитување на хидрантска мрежа на км17+200-км20+280, бетонирање под дренажна цевка од км19+960-км20+240, изработка на попречни врски на колекторскиот систем за дренажна вода и течност од коловоз.

Вкупниот прогрес на градежните работи во тунел изнесува 95 %.

Потпишан е Анекс бр. 1 кон Договорот за продолжување на рокот до 30.06.2021 година, Анекс бр.2 кон договорот за искористување на преостанатите средства од Основен договор по неопходен редослед на изведување на работите и оформување на функционални целини до обезбедување дополнителни средства и Анекс бр. 3 кон Договорот за дополнителни работи кои се нужни и неопходни за целосно завршување на проектот.

На почеток на месец септември 2019 година потпишан е Договор за Докомплетирање на проектна документација за Автопат Кичево - Охрид. Рок за проектирање: 12 месеци до септември 2020 година.

Доставен е допис од EXIM Bank за продолжување на рокот за повлекување на средства од кредитот по Основниот договор за Изградба на Автопат А2, делница Кичево - Охрид, кој рок истече на 14.02.2019 година и истиот се продолжува со краен рок на повлекување на средствата до 31.12.2021 година.

Исто така од EXIM Bank одобрени се дополнителни средства (во износ од 186.786.869,96 евра) согласно Анекс бр.3 за Изградба на Автопат А2, делница Кичево – Охрид кои се неопходни за завршување на изградбата на Автопат А2, делница Кичево – Охрид.

Потпишан е Анекс бр. 4 кон Договорот за изградба на автопат, делница Кичево-Охрид на 12.02.2020 год.

Потпишан е Анекс бр. 5 кон Договорот за изградба на автопат, делница Кичево-Охрид на 21.12.2021 год.

Проблеми:

Нестабилност на косините: Потребна е дополнителна експропријација која произлегува од ублажување на косините на усеците.

Дислокација на надземни и подземни инфраструктурни објекти (далеководи, телефонски кабли, водоводни инсталации и сл.)


Дислокација на индивидуални станбени и стопански објекти кои се сечат со трасата на Автопатот.

Одобрување на ново одлагалиште – Ново село, потреба од изработка на проект за проширување и надградување на постоечките одлагалишта заради очекуван зголемен ископ од усеците и засеците при ублажување на нестабилните косини.

Неусогласености помеѓу проектната документација и состојбата на терен – со докомплетирање на проектната документација оваа состојба е надмината.

Вкупно реализирано 356.337.811, евра (заклучно со 56-та ситуација), што изнесува 59,58% во однос на 598.074.670,03 евра.

Графички приказ: Учество на поединечите во вкупните инвестиции од средства од кредити

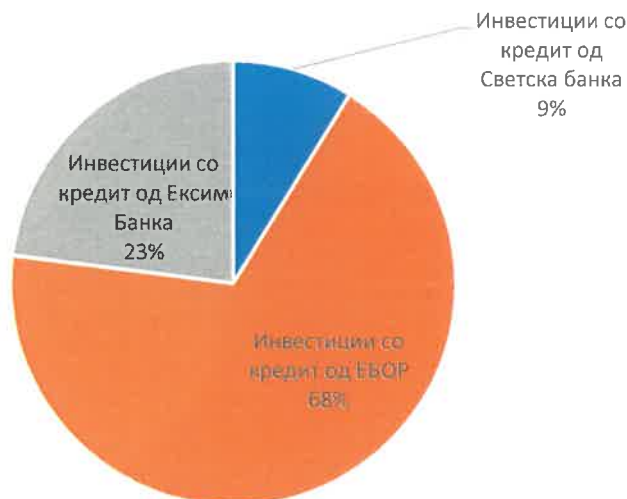

Графички приказ: Учество на поединечите во вкупните инвестиции по проекти од средства од кредити



VII. ЈАВНИ НАБАВКИ

Јавните набавки на ЈПДП во текот на 2021 година се вршеа согласно усвоениот План за јавни набавки, кој поради новонастанати потреби, во текот на годината беше изменет и дополнет пет пати.

Во текот на 2021 година ЈПДП спроведе постапки за следните јавни набавки и за кои има и склучени договори:

Ред. Бр.	Предмет на договорот за јавна набавка/рамковната спогодба	Вредност на договор со ДДВ
1	Дигитални сертификати	404.020,20
2	Web хостинг за систем за патна такса во времетраење од две години	342.200,00

3	Одржување и сервисирање на фотокопири и принтери	708.000,00
4	Заштитни средства и заштитна опрема за вработените	584.100,00
5	Миене на возила во времетраење од три години	354.000,00
6	Технички преглед и регистрација на моторни возила	74.567,74
7	Одржување на систем за евиденција на работно време	354.000,00
8	Лиценци за антивирус софтвер и софтвер за канцелариско работење	395.996,20
9	Средства за хигиена	874.970,00
10	Санција на свлечиште на Р1201, делница Џепиште - Требиште	9.447.245,20
11	Изработка на проектна документација за Санација на трупот на патот на Р1303, делница М.Брод - Прилеп (Превој) Барбарос	2.360.000,00
12	Изработка на проектна документација за Санација на одрон на Р1302, делница Хамзали - Берово	2.336.400,00
13	Канцелариски материјали	589.043,02,00
14	Надзор на изградба на експресен пат А2, делница Длабочица - Страцин (Чатал)	35.356.340,00
15	Надзор за докомплетирање на градежни работи за изградба автопат А2 делница, Кичево - Охрид	507.393.837,28
16	Дезинфекција, дезинсекција, дератизација	707.410,41
17	Одржување хигиена на објекти на ЈПДП во времетраење од две години	9.912.000,00
18	Одржување, надградба и броење на сообраќај	15.930.000,00
19	Одржување на автоматски стоп рампи	1.180.000,00
20	Рехабилитација и санација на државен пат Р1203, делница Тетово - Џепчиште	37.038.312,00

21	Надзор над Изградба на регионален пат P2246 делница, Извор (спој со A2) – Гарски Мост	46.012.212,00
22	Изработка на геодетски елаборати	5.900.000,00
23	Изработка на проектна документација за изградба на обиколница на Тетово преку клучка Требош до Непроштено	23.541.000,00
24	Потрошен материјал за принтери и фотокопири	1.224.751,50
25	Надзор на градежни работи на државни патишта финансирани од ЕБОР, Тендер 5	58.746.300,00
26	Компјутери и компјутерска опрема	5.960.068,38
27	Одржување на електроенергетски објекти, осветлување и светлосна сигнализација	49.560.000,00
28	Изработка на проектна документација за Санација на одрон/ косина на P1201, делница Бошков мост- Мелнички мост (кај Косоврасти)	3.504.600,00
29	Одржување на GPS уреди за бројачи на возила	1.180.000,00
30	Одржување на компјутери и компјутерска опрема	2.360.000,00
31	Надзор над Санација на мост бр.4 на P1103 Лакавица - Неготино	2.354.100,00
32	Санација на мост бр.4 на P1103 Лакавица - Неготино	58.999.103,20
33	Санација на мост на P2334 во село Зрновци	9.433.451,00
34	Санација на мост на река Кумановка државниот пат P1204, делница Куманово-Свети Николе	70.485.815,56
35	Одржување, поправка и сервис на возила	2.950.000,00
36	Лиценци за систем за бекап на сервери и клиентски компјутери	282.020,00
37	Хартија за фотокопир и хартија за плотер	1.059.394,56
38	Изработка на проектна документација за санација на трупот на патот и мостот над река Шевница на државен пат P1101 км 85+903, делница Прилеп – Битола	3.528.200,00

39	Надзор на реконструкција, поставување на фотоволтаици и поставување на електронски систем за наплата на патарина на Наплатните станици на коридор 8 (Миладиновци, Глумово, Желино, Тетово и Гостивар) и поставување на фотоволтаици на Наплатните станици на коридор 10 (Романовце, Петровец, Сопот, Отовица, Градско, Демир Капија и Гевгелија)	11.742.180,00
40	Комунални услуги во времетраење од две години	16.520.000,00
41	Одржување на лифтови во времетраење од две години	354.000,00
42	Превентивно и адаптивно одржување на систем за Дигитална архива и дигитализација на документација	25.960.000,00
43	Изградба на регионален пат Р2246 делница, Извор (спој со А2) – Гарски Мост	1.460.072.406,64
44	Колективно осигурување на вработените, каско осигурување на возила, осигурување од автоодговорност и осигурување на имот (недвижности и опрема)	810.000,00
45	Одржување на клима уреди и системи за климатизација	1.659.268,80
46	Одржување на UPS систем за тунели Демир Капија 1 и 2 и наплатни станици	6.490.000,00
47	Мобилна телефонија во времетраење од две години	5.900.000,00
48	Одржување и надградба на постоечкиот електронски систем за наплата на патарина	2.360.000,00
49	Санација на свлечиште на Р1306, делница Крушево - Сладуево	25.952.043,14
50	Кафе и други материјали за приготвување на топли напитки	553.121,00

51	Консултативни стручни анализи и мислења при проектирање, изградба и одржување на државните патишта во РСМ, стручни консултации при подготвителни работи за изработка на техничка документација, стручни консултации при изработка на техничка документација, ревизија на изработената техничка документација, давање на консултативни стручни мислења и анализи при градењето, надградбата - рехабилитацијата на коловозните конструкции на патиштата и објектите на нив и по потреба да врши контролни геомеханички, асфалтни и бетонски испитувања во времетраење од една година	19.972.680,00
52	Фискални печатари	733.773,60
53	Привремени вработувања	2.360.000,00
54	Изработка на проектна документација за Санација на мост бр.15 на Р1102, делница Велес - Градско	2.360.000,00
55	Надзор на изградба на експресен пат А3, делница Крупиште - Кочани	23.481.067,80
56	Поставување на опрема за лифтови	110.684,00
57	Изработка на проектна документација за Санација на одрон на магистралниот пат А3, делница Исти Бања - акумулација Калиманци	2.442.600,00
58	Одржување згради и објекти	11.800.000,00
59	Сервисирање и тековно одржување на фискални печатари	2.124.000,00
60	Изработка на проектна документација за Санација на мост над река Врдар (кај село Здуње) на државен пат А2, делница Гостивар - Стража	2.360.000,00
61	Санација на свлечишта и потпорни сидови на Р1201, Струга - Дебар на км 19+500 и км 24+000	37.617.881,51
62	Надзор над поставување на заштитна звучна ограда на одредени автопатски делници по должина на коридорите 8 и 10 (покрај градот Куманово и покрај населено место Сарај)	4.715.280,00
63	Надзор на градежни работи на државни патишта финансирани од ЕБОР, Тендер 4	52.992.620,00

64	Превентивно и адаптивно одржување на систем за РАМС во времетраење од две години	64.900.000,00
65	Надградба на ЕРП софтвер	1.416.000,00
66	Гориво за службени возила и гориво за агрегати	2.950.000,00
67	Одржување на ПП апарати и испитување на громобранска инсталација и заштитно заземјување	2.584.200,00

Врз основа на спроведените постапки за јавни набавки во 2021 година склучени се 83 договори.

ДИРЕКТОР

Ejup Rustemi

